



APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte Municipal	80.00%			
Q. 691,829.00		Q. 553,463.20	Q. 110,692.64	Q. 442,770.56
23 00 001 000 028 331 21-0101-0001				
TOTALES		Q. 553,463.20	Q. 110,692.64	Q. 442,770.56

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Acuerdo de Alcaldía de aprobación de avance, Copia de bitácora.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana

Director Municipal de Planificación





DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Factura

ABNER ELÍAS, AMADO ORELLANA
Nit Emisor: 61450189
CONSTRUCTORA EBEN-EZER
LOTIFICACION MINERVA LOTE 2 MANZANA I, Guastatoya, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
E7C067B2-C753-403F-90DC-922E01F0FB99
Serie: E7C067B2 Número de DTE: 3344121919
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 18-dic-2024 15:52:48
Fecha y hora de certificación: 18-dic-2024 15:52:48
Moneda: GTQ


#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	AVANCE FÍSICO DEL 80% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A AVENIDA, LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA 23-2024, MONTO DE ESTIMACION Q.553,463.20, (-) AMORTIZACION Q.110,692.64, (=) LIQUIDO A RECIBIR Q.442,770.56.	553,463.20	0.00	0.00	553,463.20	IVA	59,299.62857
TOTALES:					0.00	0.00	553,463.20	IVA	59,299.62857

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"



CONSTRUCTORA EBEN-EZER

Barrio Minerva, Guastatoya, El Progreso
E-mail: abneramado@gmail.com
Tel. 3025-3763

Guastatoya, El Progreso, 17 de DICIEMBRE de 2024

Señores
Municipalidad de Guastatoya, E Progreso
Departamento de El Progreso

De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes esperando que el desarrollo de sus actividades sea de la mejor manera.

El motivo de la presente es para solicitar pago de la primera estimación del 80.00% de la oferta para el evento **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. según contrato administrativo número 23-2024 de fecha veintisiete de noviembre del año 2024, para cual adjunto el cuadro de estimación del 80.00% de dicho proyecto.

No teniendo más que manifestarles, me suscribo quedando atento y a sus respetables órdenes.

Atentamente,

CONSTRUCTORA EBEN-EZER
LOTIFICACION MINERVA LOTE 2 MANZANA 1
GUASTATOYA, EL PROGRESO
ABNER ELIAS AMADO ORELLANA
PROPIETARIO

ABNER ELIAS AMADO ORELLANA
PROPIETARIO
CONSTRUCTORA EBEN-EZER

PRIMERA ESTIMACION 80%
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2a AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO


No	COMPONENTES DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION			ACUMULADO A LA FECHA			% POR RENGLO
			CANTIDAD	COSTO	TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	COSTO ACUMULADO		
1.00	LIMPIEZA, TRAZO Y CHAPEO	M2	912.00	Q 9.85	Q 8,983.20	Q 912.00	Q 8,983.20	Q	1.30%
2.00	RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2	912.00	Q 103.00	Q 93,936.00	Q 912.00	Q 93,936.00	Q	13.58%
3.00	CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA T = 0.15 m	M2	912.00	Q 78.95	Q 72,002.40	Q 912.00	Q 72,002.40	Q	10.41%
4.00	BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.15M	M2	912.00	Q 114.45	Q 104,378.40	Q 912.00	Q 104,378.40	Q	15.09%
5.00	BORDILLO	M	32.00	Q 212.25	Q 6,792.00	Q -	Q -	Q	0.00%
6.00	REPOSICION DE BROCALES EN POZOS EXISTENTES	UNIDAD	1.00	Q 4,997.50	Q 4,997.50	Q 1.00	Q 4,997.50	Q	0.72%
7.00	FUNDICION DE PAVIMENTO DE 0.15 M	M2	912.00	Q 412.75	Q 376,428.00	Q 652.10	Q 269,154.28	Q	38.90%
8.00	SEÑALIZACION	UNIDAD	1.00	Q 24,311.50	Q 24,311.50	Q -	Q -	Q	0.00%
TOTALES DEL PROYECTO					Q 691,829.00		Q 653,451.78	Q	80.00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					Q 691,829.00				

Guastatoya 17 de Diciembre 2024

CONSTRUCTORA EBEN-EZER
LOTIFICACION MINERVA LOTE 2 MANZANA 1
GUASTATOYA, EL PROGRESO
ABNER ELIAS AMADO ORELLANA
PROPIETARIO
CONSTRUCTORA EBEN-EZER

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	Q 110,690.36
LIQUIDO A RECIBIR	Q 442,761.42


JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO CIVIL
CON ENFASIS EN CONSTRUCCIONES
ING. RESIDENTE CONSTRUCTORA EBEN-EZER




CONSTRUCTORA EBEN-EZER

Barrio Minerva, Guastatoya, El Progreso
E-mail: abneramado@gmail.com
Tel. 3025-3763

MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

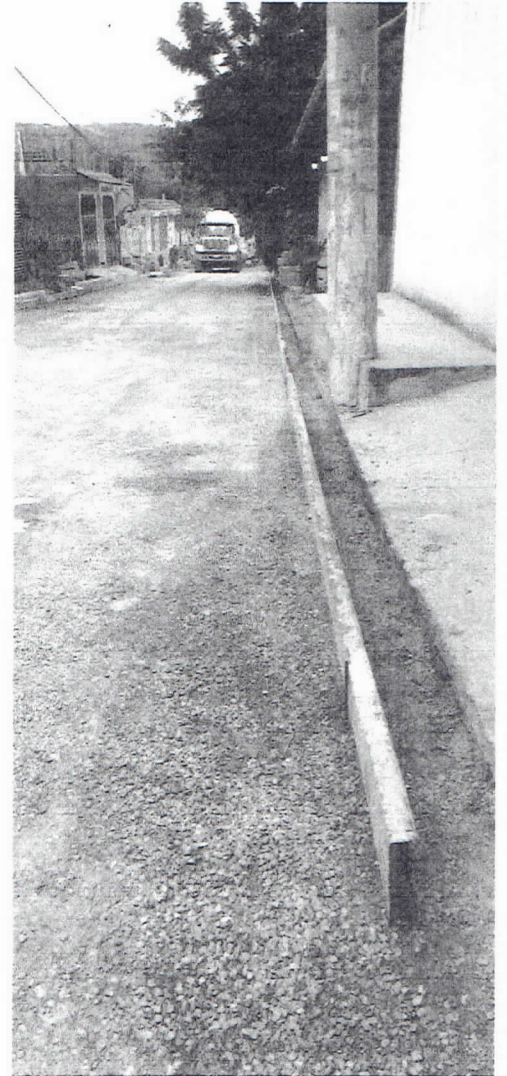





CONSTRUCTORA EBEN-EZER

Barrio Minerva, Guastatoya, El Progreso
E-mail: abneramado@gmail.com
Tel. 3025-3763

MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

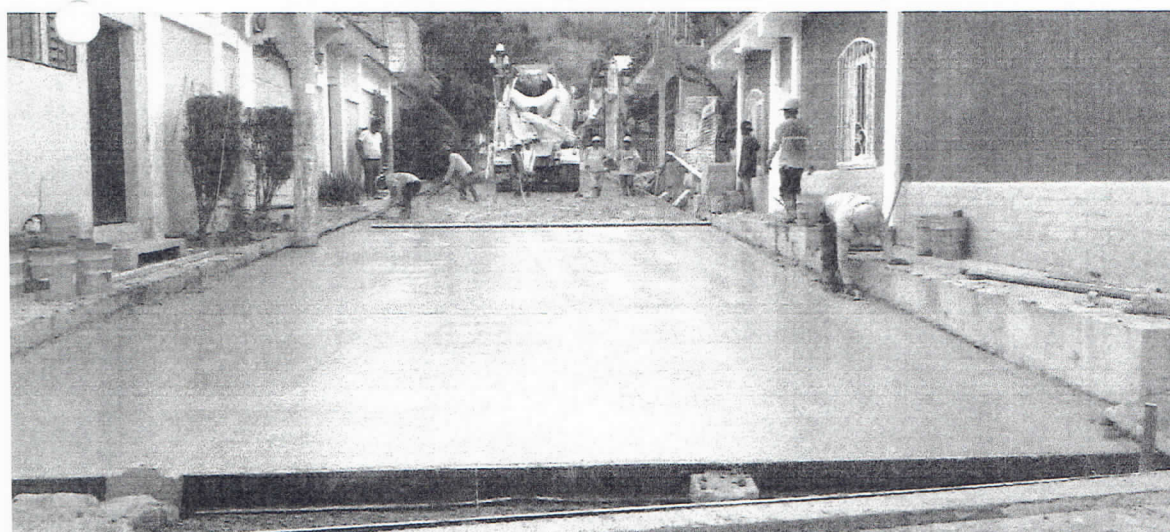



CONSTRUCTORA EBEN-EZER


Barrio Minerva, Guastatoya, El Progreso

E-mail: abneramado@gmail.com

Tel. 3025-3763

MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO










CONSTRUCTORA EBEN-EZER


Barrio Minerva, Guastatoya, El Progreso
E-mail: abneramado@gmail.com
Tel. 3025-3763

MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

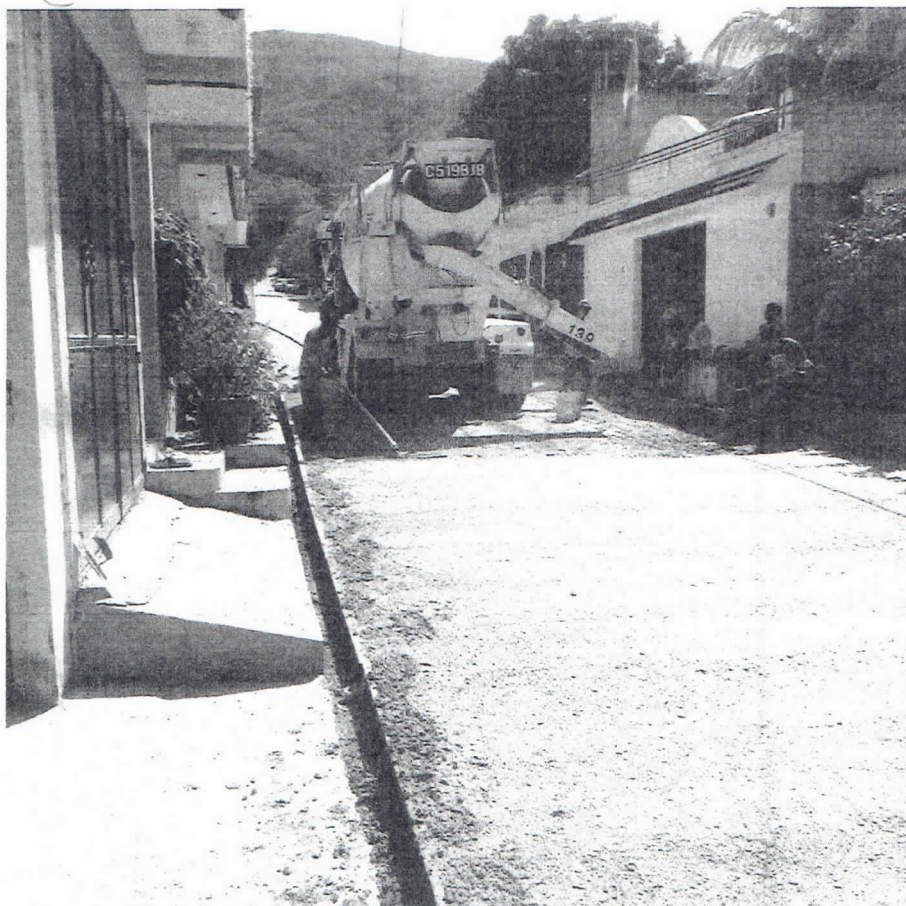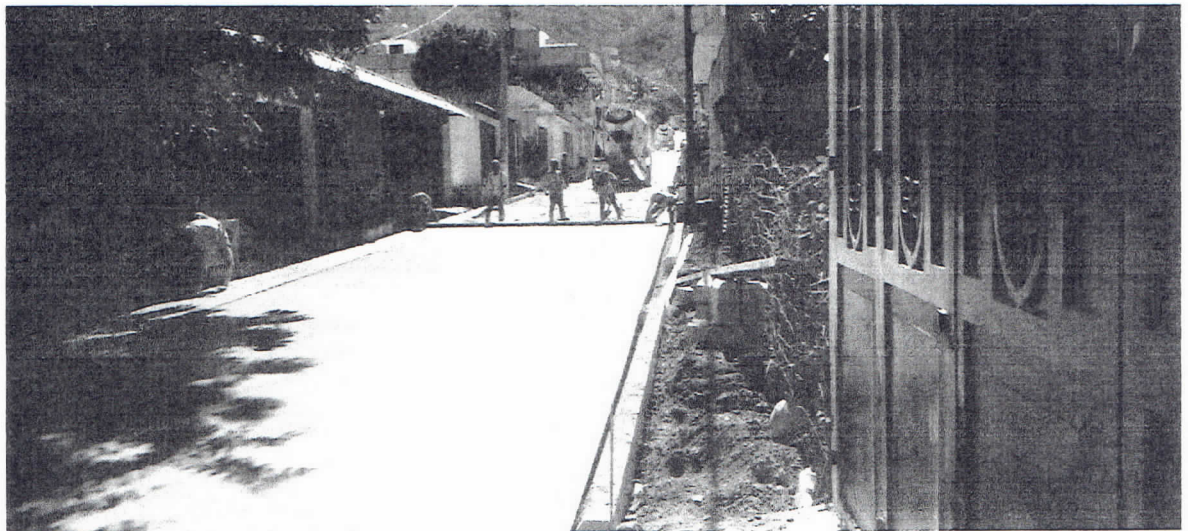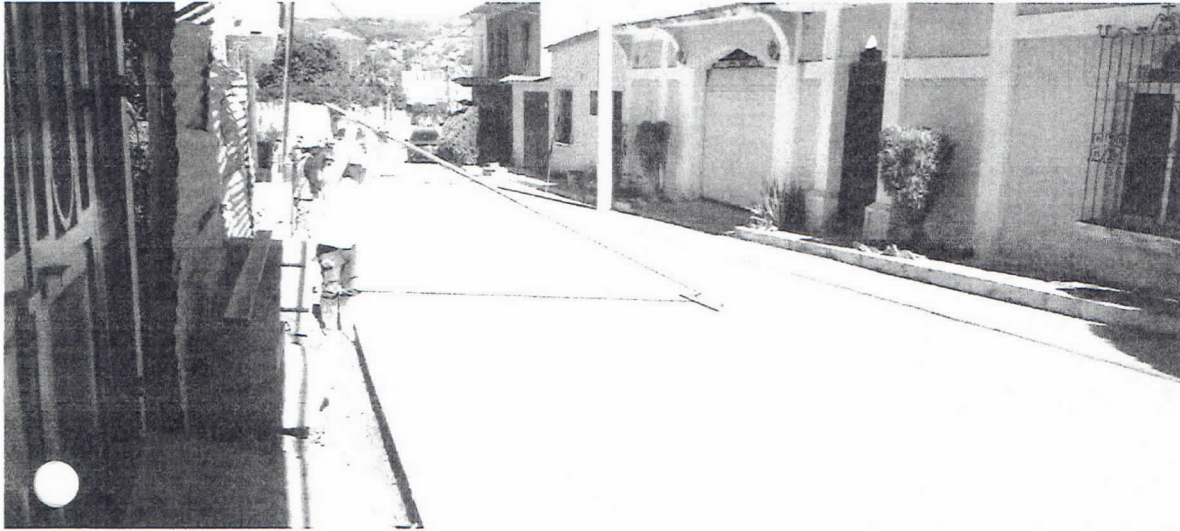

**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A AVENIDA LOTIFICACION
MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**

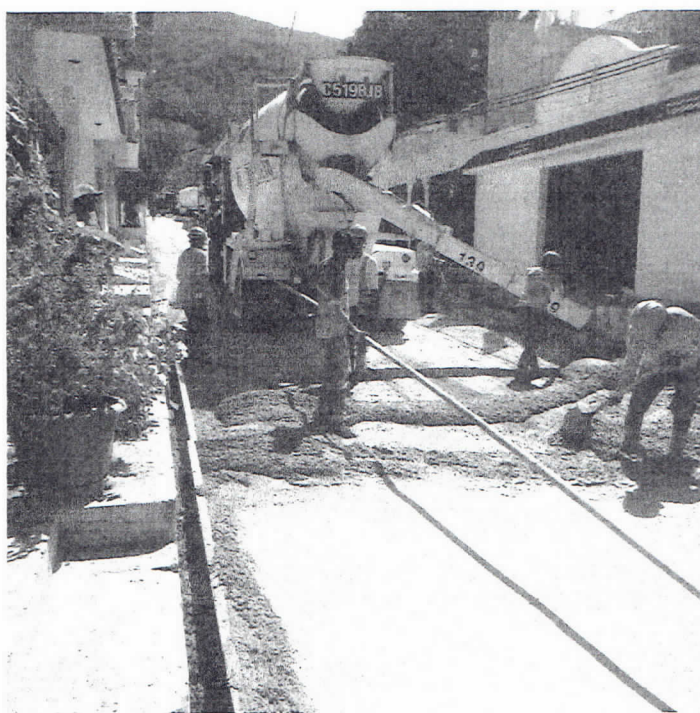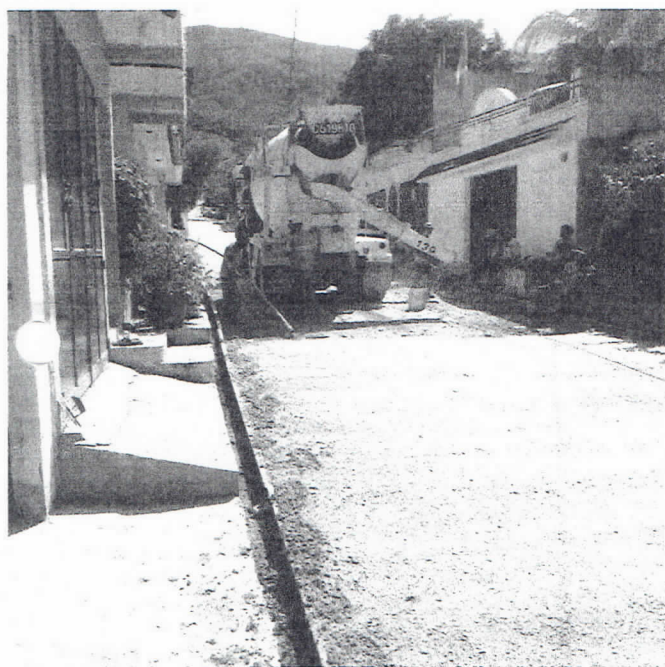




CONSTRUCTORA EBEN-EZER

Barrio Minerva, Guastatoya, El Progreso

E-mail: abneramado@gmail.com

Tel. 3025-3763

MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

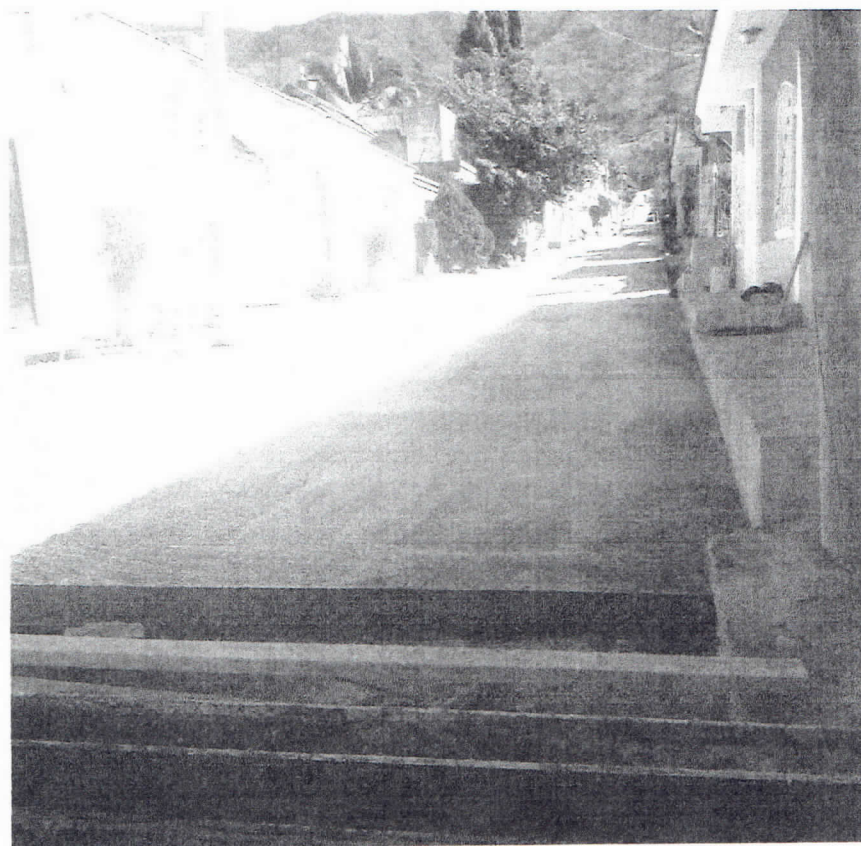

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 18 de Diciembre de 2024

**SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO**

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2a AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, con número de contrato **23-2024** de fecha 27 de Noviembre de 2024, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA EBEN-EZER**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Diciembre de 2024 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **80.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9.366

**ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO**

D.M.P.				SUPERVISION DE OBRAS				Dirección Municipal de Planificación																																																																																																																																																																																																											
Comunidad.				Contrato Municipal.																																																																																																																																																																																																															
Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso				23-2024																																																																																																																																																																																																															
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO																																																																																																																																																																																																																			
Nombre del proyecto.						Ubicación del proyecto.																																																																																																																																																																																																													
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2a AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO						Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso																																																																																																																																																																																																													
Contratista.						Ubicación del proyecto.																																																																																																																																																																																																													
CONSTRUCTORA EBEN-EZER						Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso																																																																																																																																																																																																													
Monto Contratado.						Avance Físico.																																																																																																																																																																																																													
Q 691,829.00						80.00%																																																																																																																																																																																																													
Informe de Supervisión No. 1						Fecha. 18 de Diciembre de 2024																																																																																																																																																																																																													
2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><th>No.</th><th>Descripcion del Renglón</th><th>Cantidad</th><th>Unidad</th><th>Precio Unitario</th><th>Total</th><th>Total a la Fecha</th><th>Avance Físico %</th></tr><tr><td>1</td><td>LIMPIEZA, TRAZO Y CHAPEO</td><td>912.00</td><td>M2</td><td>Q 9.85</td><td>Q 8,983.20</td><td>Q 8,983.20</td><td>100%</td></tr><tr><td>2</td><td>RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE</td><td>912.00</td><td>M2</td><td>Q 103.00</td><td>Q 93,936.00</td><td>Q 93,936.00</td><td>100%</td></tr><tr><td>3</td><td>CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA T = 0.15 m</td><td>912.00</td><td>M2</td><td>Q 78.95</td><td>Q 72,002.40</td><td>Q 72,002.40</td><td>100%</td></tr><tr><td>4</td><td>BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.15M</td><td>912.00</td><td>M2</td><td>Q 114.45</td><td>Q 104,378.40</td><td>Q 104,378.40</td><td>100%</td></tr><tr><td>5</td><td>BORDILLO</td><td>-</td><td>M</td><td>Q 212.25</td><td>Q -</td><td>Q -</td><td>0%</td></tr><tr><td>6</td><td>REPOSICION DE BROCALES EN POZOS EXISTENTES</td><td>1.00</td><td>UNIDAD</td><td>Q 4,997.50</td><td>Q 4,997.50</td><td>Q 4,997.50</td><td>100%</td></tr><tr><td>7</td><td>FUNDICION DE PAVIMENTO DE 0.15 M</td><td>652.10</td><td>M2</td><td>Q 412.75</td><td>Q 269,154.28</td><td>Q 269,154.28</td><td>72%</td></tr><tr><td>8</td><td>SEÑALIZACION</td><td>-</td><td>UNIDAD</td><td>Q 24,311.50</td><td>Q -</td><td>Q -</td><td>0%</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>Q 553,451.78</td><td>Q 553,451.78</td><td>80.00%</td></tr></table>												No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %	1	LIMPIEZA, TRAZO Y CHAPEO	912.00	M2	Q 9.85	Q 8,983.20	Q 8,983.20	100%	2	RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE	912.00	M2	Q 103.00	Q 93,936.00	Q 93,936.00	100%	3	CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA T = 0.15 m	912.00	M2	Q 78.95	Q 72,002.40	Q 72,002.40	100%	4	BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.15M	912.00	M2	Q 114.45	Q 104,378.40	Q 104,378.40	100%	5	BORDILLO	-	M	Q 212.25	Q -	Q -	0%	6	REPOSICION DE BROCALES EN POZOS EXISTENTES	1.00	UNIDAD	Q 4,997.50	Q 4,997.50	Q 4,997.50	100%	7	FUNDICION DE PAVIMENTO DE 0.15 M	652.10	M2	Q 412.75	Q 269,154.28	Q 269,154.28	72%	8	SEÑALIZACION	-	UNIDAD	Q 24,311.50	Q -	Q -	0%	9								10								11								12								13								14								15								16								17								18								19								20								21								22								23													Q 553,451.78	Q 553,451.78	80.00%
No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %																																																																																																																																																																																																												
1	LIMPIEZA, TRAZO Y CHAPEO	912.00	M2	Q 9.85	Q 8,983.20	Q 8,983.20	100%																																																																																																																																																																																																												
2	RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE	912.00	M2	Q 103.00	Q 93,936.00	Q 93,936.00	100%																																																																																																																																																																																																												
3	CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA T = 0.15 m	912.00	M2	Q 78.95	Q 72,002.40	Q 72,002.40	100%																																																																																																																																																																																																												
4	BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.15M	912.00	M2	Q 114.45	Q 104,378.40	Q 104,378.40	100%																																																																																																																																																																																																												
5	BORDILLO	-	M	Q 212.25	Q -	Q -	0%																																																																																																																																																																																																												
6	REPOSICION DE BROCALES EN POZOS EXISTENTES	1.00	UNIDAD	Q 4,997.50	Q 4,997.50	Q 4,997.50	100%																																																																																																																																																																																																												
7	FUNDICION DE PAVIMENTO DE 0.15 M	652.10	M2	Q 412.75	Q 269,154.28	Q 269,154.28	72%																																																																																																																																																																																																												
8	SEÑALIZACION	-	UNIDAD	Q 24,311.50	Q -	Q -	0%																																																																																																																																																																																																												
9																																																																																																																																																																																																																			
10																																																																																																																																																																																																																			
11																																																																																																																																																																																																																			
12																																																																																																																																																																																																																			
13																																																																																																																																																																																																																			
14																																																																																																																																																																																																																			
15																																																																																																																																																																																																																			
16																																																																																																																																																																																																																			
17																																																																																																																																																																																																																			
18																																																																																																																																																																																																																			
19																																																																																																																																																																																																																			
20																																																																																																																																																																																																																			
21																																																																																																																																																																																																																			
22																																																																																																																																																																																																																			
23																																																																																																																																																																																																																			
					Q 553,451.78	Q 553,451.78	80.00%																																																																																																																																																																																																												
Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del 80.00% por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente																																																																																																																																																																																																																			
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.																																																																																																																																																																																																																			
Este proyecto consiste en el mejoramiento de la 2a calle de lotificacion minerva con pavimento, ya que la actual se encuentra en mal estado, por lo que necesita ser reparada.																																																																																																																																																																																																																			
4. RECOMENDACIONES.																																																																																																																																																																																																																			
Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun																																																																																																																																																																																																																			
SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.																																																																																																																																																																																																																			
José F. Alexander Aguilar Mejía Ingeniero Civil Colegiado No. 9,368 ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES JOSE ELIAS HERRERA GUERRA ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA																																																																																																																																																																																																																			

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO




Nombre del proyecto.

MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2a AVENIDA
LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Ubicación del proyecto.

Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.

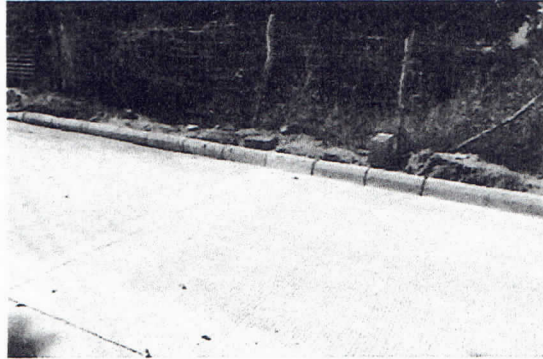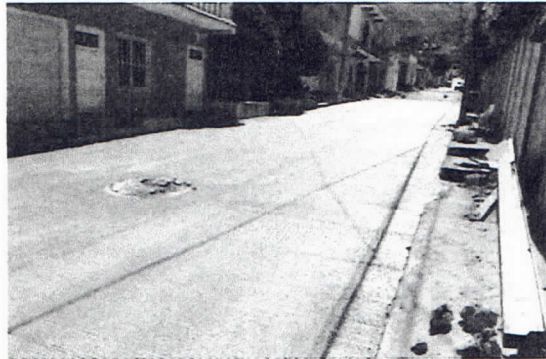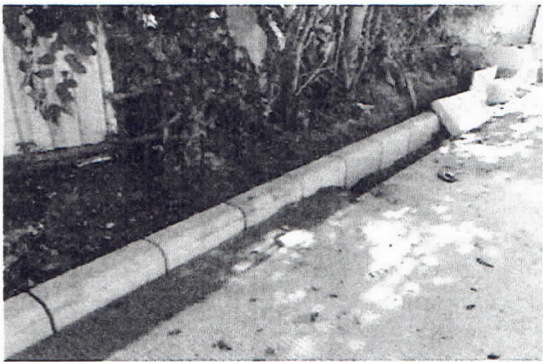

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

Jose F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9.366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 1

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2a AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Municipio: GUASTATOYA

Comunidad: CABECERA MUNICIPAL

Fecha de Inicio: 27/11/2024

Fecha de Finalización: 26/04/2025

Contrato No.: 23-2024

Modificaciones:

Constructora: CONSTRUCTORA EBEN-EZER

Representante legal: ABNER ELIAS AMADO ORELLANA

Departamento: EL PROGRESO

Fecha de Contrato: 27/11/2024

Fecha de Supervision: 18/12/2024

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Valor del Proyecto: Q.691,829.00

Valor Original: Q.691,829.00

Telefono:

RESUMEN DE RENGLONES														
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL					CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	LIMPIEZA, TRAZO Y CHAPEO	912.00	M2	Q 9.85	Q 8,983.20					912.00	Q 8,983.20	912.00	Q 8,983.20	1.30%
2	RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE	912.00	M2	Q 103.00	Q 93,936.00					912.00	Q 93,936.00	912.00	Q 93,936.00	13.58%
3	CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA T = 0.15 m	912.00	M2	Q 78.95	Q 72,002.40					912.00	Q 72,002.40	912.00	Q 72,002.40	10.41%
4	BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.15M	912.00	M2	Q 114.45	Q 104,378.40					912.00	Q 104,378.40	912.00	Q 104,378.40	15.09%
5	BORDILLO	32.00	M	Q 212.25	Q 6,792.00					-	Q -	-	Q -	0.00%
6	REPOSICION DE BROCALES EN POZOS EXISTENTES	1.00	UNIDAD	Q 4,997.50	Q 4,997.50					1.00	Q 4,997.50	1.00	Q 4,997.50	0.72%
7	FUNDICION DE PAVIMENTO DE 0.15 M	912.00	M2	Q 412.75	Q 376,428.00					652.10	Q 269,154.28	652.10	Q 269,154.28	38.90%
8	SEÑALIZACION	1.00	UNIDAD	Q 24,311.50	Q 24,311.50					-	Q -	-	Q -	0.00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					Q 691,829.00					Q 553,451.78		Q 553,451.78	Q 553,451.78	80.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q	553,451.78
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q	110,690.36
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q	27,675.45
LIQUIDO A RECIBIR	Q	442,761.42

José F. Alexander Aguilar Mejía

Ingeniero Civil

Colegiado No. 8,365

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA

ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL
UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4353/12/2024	
No. CONTRATO	23-2024
FECHA CONTRATO	27/11/2024
MONTO CONTRACTUAL	691,829.00
NOG	24621250
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOEL AMADO ORELLANA
EMPRESA EJECUTORA	ABNER ELÍAS AMADO ORELLANA
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	ABNER ELIAS AMADO ORELLANA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 04/12/2024

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4353/12/2024

CONTRATO No. 23-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A
AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA,
EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	1
FECHA	17/12/2024
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza visita de campo para ver el avance del proyecto, observando la fundición del pavimento
CREADO POR	JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA





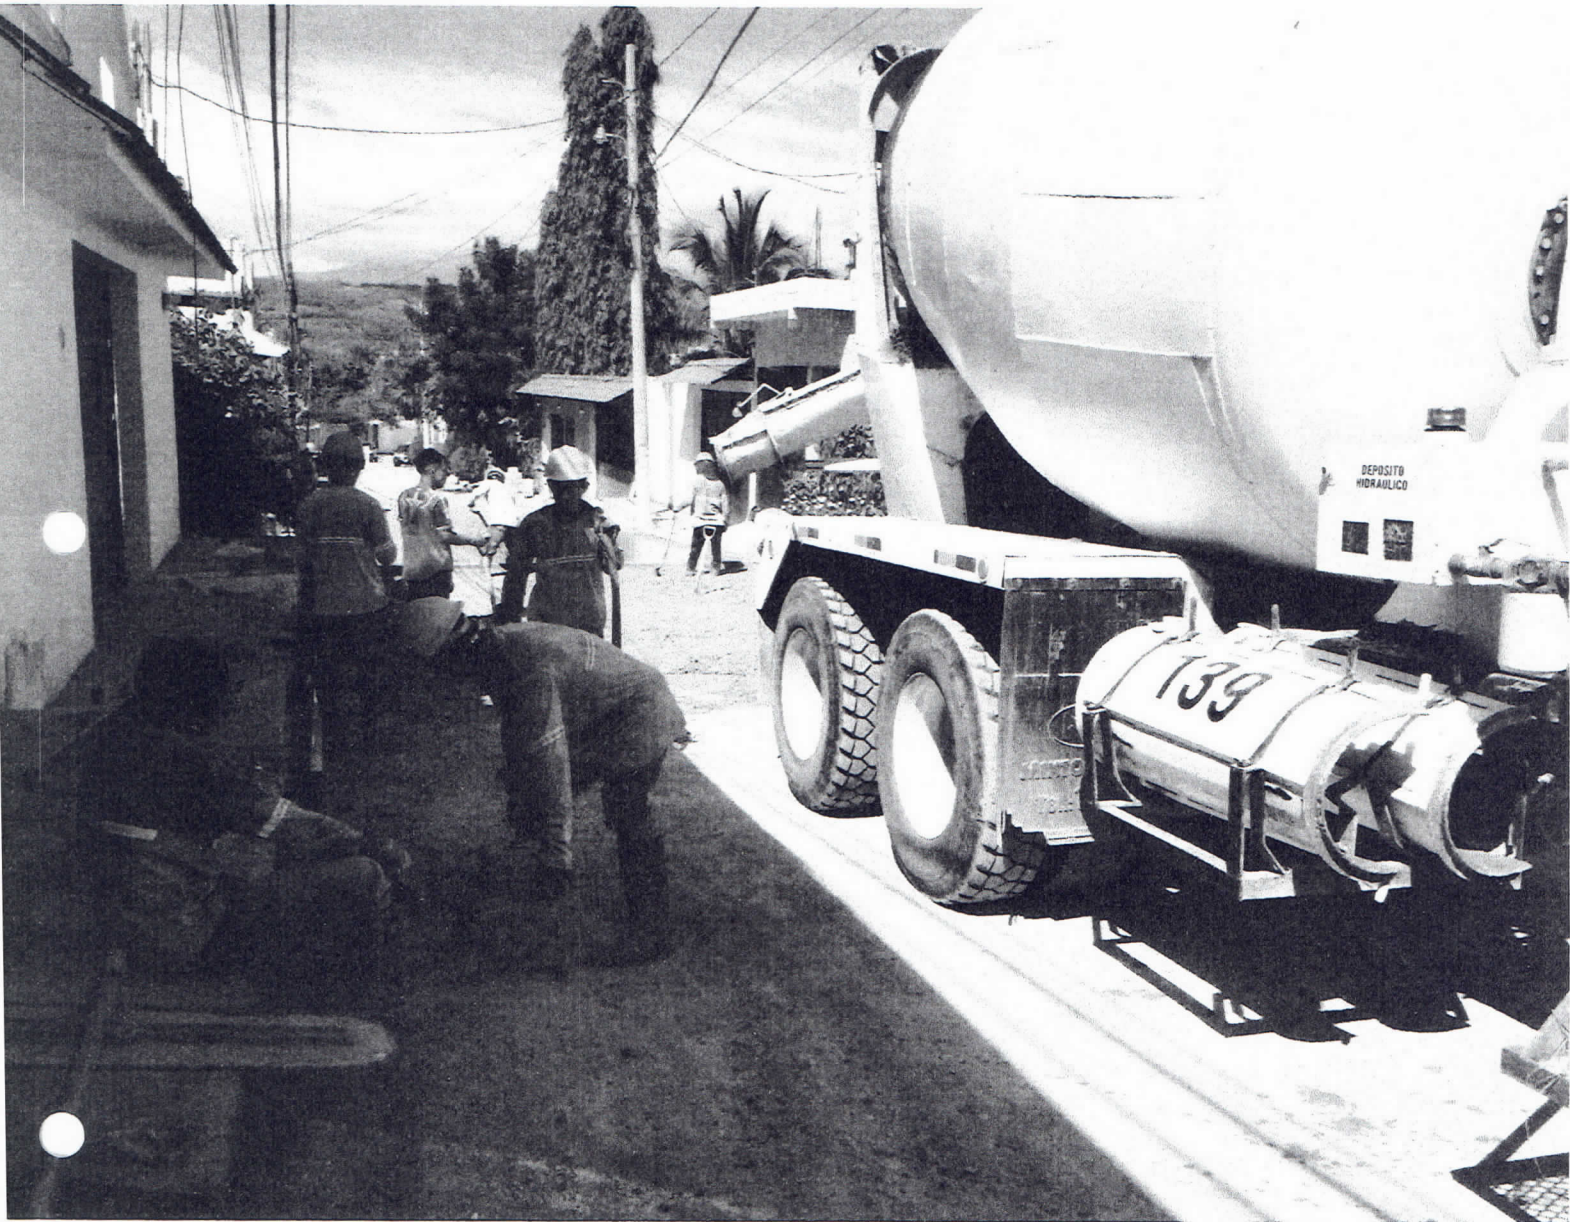







MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

CERTIFICA

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe EL ACUERDO MUNICIPAL No. 141-2024 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro del libro número 3,211 de la Alcaldía Municipal, Libro de Acuerdos, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

ACUERDO MUNICIPAL 141-2024

Guastatoya, 18 de Diciembre de 2024

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

La Autoridad Administrativa Superior

Se tiene a la vista la solicitud presentada por Abner Elias Amado Orellana propietario de la empresa **CONSTRUCTORA EBEN-EZER**, en la cual manifiesta que el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 23-2024, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro; y que el proyecto en referencia se encuentra en un avance físico del 80.00%, en consecuencia solicitan el pago de conformidad con la cláusula cuarta numeral 2) del contrato administrativo de obras.

Consecuentemente se encuentra el informe del Ingeniero Jose Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, en el cual hace constar la confirmación del avance del proyecto en referencia, por un total de 80.00% de avance físico, adjunta para el efecto la estimación.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: Estimaciones para pago. *"La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas."*

POR TANTO:

Con fundamento en los antecedentes y lo considerado, este Despacho Municipal.

RESUELVE:

- I) **APROBAR**, el pago por la cantidad de 80.00%, del proyecto **"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 23-2024, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro; suscrito por el Alcalde Municipal y Abner Elias Amado Orellana propietario de **CONSTRUCTORA EBEN-EZER**.
- II) **SE ORDENA**, al Director de la Administración Financiera Municipal, hacer el pago correspondiente al 80.00% del monto total del proyecto.
- III) **Cumplase.** -

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A DIECIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

SECRETARIA



LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUIN
SECRETARIA MUNICIPAL GUASTATOYA
¡Sirviendo!
