

5980-0535

MUN.

ALIDAD DE GUASTATOYA

9

BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2024

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

EXTENDIENTE No. 279

NOG: 24679356

CONTRATO No. 25-2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL,
BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte Municipal	90.00%			
Q. 231,000.00		Q. 207,900.00	Q. 41,580.00	Q. 166,320.00
32 00 001 000 011 331 21-0101-0001				
TOTALES		Q. 207,900.00	Q. 41,580.00	Q. 166,320.00

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Acuerdo de Alcaldía de aprobación de avance, Copia de bitácora.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación


DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

19803202



CUENTA UNICA DEL TESORO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T.
CUENTA No. 3-005-09207-3
GUATEMALA, C.A.

CHEQUE No. 77152

Q. 166,320.00

LUGAR Y FECHA:

VERGAS ARRIAZA, VINICIO ALEXANDER

PAGO A LA ORDEN DE:

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE

SUMA DE:

QUETZALES.

No. GT86 BRRL 0101 0000 0030 0509 2073

FIRMA

FIRMA


NO NEGOCIABLE

3:000000016630050920730007715200000348108

DESCRIPCION DEL PAGO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON ARBOLES COLONIA BRIZAS DEL FINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

77152

CUENTA No.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	NUMERO DE CHEQUE: 77152		
	CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 279		
	TRANSACCION No: 60345883		
	NIT BENEFICIARIO: 89464133		
	DE LMI. ORELLANA 2112025		
	21 de ENERO del 2025		
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME
			DIA MES AÑO



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

PROY

Aporte	Q. 231,	32 00 00				
--------	---------	----------	--	--	--	--

Se cuen
Supervi
bitácora
Lic. Ale
Director



Factura

VINICIO ALEXANDER, VARGAS ARRIAZA
Nit Emisor: 89464133
CONSTRUCTORA VARGAS
COLONIA NUEVA VIDA Guastatoya, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
93E018D0-43B0-413C-A263-A30CF281D899
Serie: 93E018D0 Número de DTE: 1135624508
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 21-ene-2025 12:18:02
Fecha y hora de certificación: 21-ene-2025 00:18:02
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	PRIMERA ESTIMACIÓN AL 90% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA EL PROGRESO. CONTRATO No. 25-2024. Monto de la presente Estimación: Q207,900.00 (-) Amortización del anticipo: Q41,580.00 Valor Liquido a Recibir Q 166,320.00	207,900.00	0.00	0.00	207,900.00	IVA	22,275.000000
TOTALES:					0.00	0.00	207,900.00	IVA	22,275.000000

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"



CONSTRUCTORA VARGAS
VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
COLONIA NUEVA VIDA, GUASTATOYA, EL
PROGRESO
8946413-3



Guastatoya El Progreso, 06 de enero de 2025

SEÑOR:
ALCALDE
JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.

Estimado Señor Alcalde, Reciba un atento saludo de mi parte esperando que sus actividades al frente de la administración municipal se desarrollen con éxito, el motivo de la presente es para SOLICITAR se realice el proceso de pago de la ESTIMACION No. 1 del proyecto **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"** que se ejecuta bajo el contrato número 25-2024 de 04 diciembre 2024, presentado a la fecha un avance físico del 90.00 %, y acumulado del 90.00 % por lo que agradeceré gire instrucciones a donde corresponda para que se efectúen las diligencias necesarias para que se haga efectivo el proceso de pago solicitado, esperando se dé el apoyo y la atención necesaria a mi solicitud.

Se adjunta su respectiva estimación.

Sin otro particular, me despido de ustedes;

F.)

Vinicio Alexander Vargas Arriaza
CONSTRUCTORA VARGAS



CONSTRUCTORA VARGAS
ESTIMACION DE TRABAJO NO.1

PROYECTO: "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"

Monto Original del Contrato: Q231,000.00

Renglón	RENGLONES DE TRABAJO/CANTIDADES	Unidad	cantidad Contratada	Precio	Costo total	Cantidad EJECUTADA CONTRATO ORIGINAL					%	
						Actual	Anterior	Acumulado	Actual	Anterior		Acumulado
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	420.00	Q 10.75	Q 4,515.00	420.00		420.00	Q 4,515.00	Q -	Q 4,515.00	1.95%
2	CORTE DE CAJUELA T=0.25M	M2	420.00	Q 66.75	Q 28,035.00	420.00		420.00	Q 28,035.00	Q -	Q 28,035.00	12.14%
3	BASE DE MATERIAL SELECTO COMPACTADO T=0.10M	M2	420.00	Q 91.25	Q 38,325.00	420.00		420.00	Q 38,325.00	Q -	Q 38,325.00	16.59%
4	BORDILLO PREFABRICADO DE 0.15*0.30M*0.50 F'C=280KG/CM2	M	140.00	Q 192.25	Q 26,915.00	75.00		75.00	Q 14,418.75	Q -	Q 14,418.75	6.24%
5	CARPETA DE ADOQUIN PARA TRAFICO PESADO F'C=280KG/CM2	M2	388.00	Q 313.50	Q 121,638.00	365.00		365.00	Q 114,427.50	Q -	Q 114,427.50	49.54%
6	LLAVES DE CONFINAMIENTO TRANSVERSAL DE 0.10 x 0.20M F'C=280KG/CM2	M	79.00	Q 125.00	Q 9,875.00	60.71		60.71	Q 7,588.75	Q -	Q 7,588.75	3.29%
7	LLAVES DE REMATE DE 0.20 X 0.20 F'C=280KG/CM2	M	5.00	Q 295.00	Q 1,475.00	2.00		2.00	Q 590.00	Q -	Q 590.00	0.26%
8	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD	1.00	Q 222.00	Q 222.00			0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
	Total cantidad contratada			Q 231,000.00	Cantidad ejecutada			Q 207,900.00	Q -	Q 207,900.00	90.00%	

Monto bruto de esta Estimación 1	Q 207,900.00
Amortización de Anticipos 20%	Q 41,580.00
Monto neto de esta Estimación	Q 166,320.00


Liquidado a Recibir	Q 166,320.00
---------------------	--------------



VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
CONSTRUCTORA VARGAS



Héctor A. Archila Marroquín
ARQUITECTO
Colegiado No. 4046
Vo. Bo. Supervisor de obra de la Empresa
Arq. Hector Arnulfo Archila Marroquin



CONSTRUCTORA VARGAS
Prop. VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
COLONIA NUEVA VIDA,
GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT: 8946413-3



CONSTRUCTORA VARGAS
VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
COLONIA NUEVA VIDA, GUASTATOYA, EL
PROGRESO
8946413-3



INFORME FOTOGRAFICO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA
BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL
PROGRESO."






CONSTRUCTORA VARGAS
VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
COLONIA NUEVA VIDA, GUASTATOYA, EL
PROGRESO
8946413-3



INFORME FOTOGRAFICO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA
BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL
PROGRESO."





CONSTRUCTORA VARGAS
VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
COLONIA NUEVA VIDA, GUASTATOYA, EL
PROGRESO
8946413-3



INFORME FOTOGRAFICO
PROYECTO: "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA
BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL
PROGRESO."



INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 07 de Enero de 2025

**SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO**

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, con número de contrato **25-2024** de fecha 04 de Diciembre de 2024, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA VARGAS**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Enero de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **90.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.


Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

**ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO**

D.M.P.				SUPERVISION DE OBRAS				Dirección Municipal de Planificación																																																																																																																																																																																																											
Comunidad.				Contrato Municipal.																																																																																																																																																																																																															
Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso				25-2024																																																																																																																																																																																																															
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO																																																																																																																																																																																																																			
Nombre del proyecto.						Ubicación del proyecto.																																																																																																																																																																																																													
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO						Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso																																																																																																																																																																																																													
Contratista.						Ubicación del proyecto.																																																																																																																																																																																																													
CONSTRUCTORA VARGAS						Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso																																																																																																																																																																																																													
Monto Contratado.						Avance Físico.																																																																																																																																																																																																													
Q 231,000.00						90.00%																																																																																																																																																																																																													
Informe de Supervisión No. 1						Fecha. 07 de Enero de 2025																																																																																																																																																																																																													
2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><th>No.</th><th>Descripcion del Renglón</th><th>Cantidad</th><th>Unidad</th><th>Precio Unitario</th><th>Total</th><th>Total a la Fecha</th><th>Avance Físico %</th></tr><tr><td>1</td><td>TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO</td><td>420.00</td><td>M2</td><td>Q 10.75</td><td>Q 4,515.00</td><td>Q 4,515.00</td><td>100%</td></tr><tr><td>2</td><td>CORTE DE CAJUELA T=0.25M</td><td>420.00</td><td>M2</td><td>Q 66.75</td><td>Q 28,035.00</td><td>Q 28,035.00</td><td>100%</td></tr><tr><td>3</td><td>BASE DE MATERIAL SELECTO COMPACTADO T=0.10M</td><td>420.00</td><td>M2</td><td>Q 91.25</td><td>Q 38,325.00</td><td>Q 38,325.00</td><td>100%</td></tr><tr><td>4</td><td>BORDILLO PREFABRICADO DE 0.15*0.30*0.50 F'C=280 KG/CM2</td><td>75.00</td><td>M</td><td>Q 192.25</td><td>Q 14,418.75</td><td>Q 14,418.75</td><td>54%</td></tr><tr><td>5</td><td>CARPETA DE ADOQUIN PARA TRAFICO PESADO F'C=280KG/CM2</td><td>365.00</td><td>M2</td><td>Q 313.50</td><td>Q 114,427.50</td><td>Q 114,427.50</td><td>94%</td></tr><tr><td>6</td><td>LLAVES DE CONFINAMIENTO TRANSVERSAL DE 0.10 x 0.20 M F'C=280 KG/CM2</td><td>60.71</td><td>M</td><td>Q 125.00</td><td>Q 7,588.75</td><td>Q 7,588.75</td><td>77%</td></tr><tr><td>7</td><td>LLAVES DE REMATE DE 0.20 x 0.20 M F'C=280 KG/CM2</td><td>2.00</td><td>M</td><td>Q 295.00</td><td>Q 590.00</td><td>Q 590.00</td><td>40%</td></tr><tr><td>8</td><td>LIMPIEZA FINAL</td><td>-</td><td>UNIDAD</td><td>Q 222.00</td><td>Q -</td><td>Q -</td><td>0%</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>Q 207,900.00</td><td>Q 207,900.00</td><td>90.00%</td></tr></table>												No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %	1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	420.00	M2	Q 10.75	Q 4,515.00	Q 4,515.00	100%	2	CORTE DE CAJUELA T=0.25M	420.00	M2	Q 66.75	Q 28,035.00	Q 28,035.00	100%	3	BASE DE MATERIAL SELECTO COMPACTADO T=0.10M	420.00	M2	Q 91.25	Q 38,325.00	Q 38,325.00	100%	4	BORDILLO PREFABRICADO DE 0.15*0.30*0.50 F'C=280 KG/CM2	75.00	M	Q 192.25	Q 14,418.75	Q 14,418.75	54%	5	CARPETA DE ADOQUIN PARA TRAFICO PESADO F'C=280KG/CM2	365.00	M2	Q 313.50	Q 114,427.50	Q 114,427.50	94%	6	LLAVES DE CONFINAMIENTO TRANSVERSAL DE 0.10 x 0.20 M F'C=280 KG/CM2	60.71	M	Q 125.00	Q 7,588.75	Q 7,588.75	77%	7	LLAVES DE REMATE DE 0.20 x 0.20 M F'C=280 KG/CM2	2.00	M	Q 295.00	Q 590.00	Q 590.00	40%	8	LIMPIEZA FINAL	-	UNIDAD	Q 222.00	Q -	Q -	0%	9								10								11								12								13								14								15								16								17								18								19								20								21								22								23													Q 207,900.00	Q 207,900.00	90.00%
No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %																																																																																																																																																																																																												
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	420.00	M2	Q 10.75	Q 4,515.00	Q 4,515.00	100%																																																																																																																																																																																																												
2	CORTE DE CAJUELA T=0.25M	420.00	M2	Q 66.75	Q 28,035.00	Q 28,035.00	100%																																																																																																																																																																																																												
3	BASE DE MATERIAL SELECTO COMPACTADO T=0.10M	420.00	M2	Q 91.25	Q 38,325.00	Q 38,325.00	100%																																																																																																																																																																																																												
4	BORDILLO PREFABRICADO DE 0.15*0.30*0.50 F'C=280 KG/CM2	75.00	M	Q 192.25	Q 14,418.75	Q 14,418.75	54%																																																																																																																																																																																																												
5	CARPETA DE ADOQUIN PARA TRAFICO PESADO F'C=280KG/CM2	365.00	M2	Q 313.50	Q 114,427.50	Q 114,427.50	94%																																																																																																																																																																																																												
6	LLAVES DE CONFINAMIENTO TRANSVERSAL DE 0.10 x 0.20 M F'C=280 KG/CM2	60.71	M	Q 125.00	Q 7,588.75	Q 7,588.75	77%																																																																																																																																																																																																												
7	LLAVES DE REMATE DE 0.20 x 0.20 M F'C=280 KG/CM2	2.00	M	Q 295.00	Q 590.00	Q 590.00	40%																																																																																																																																																																																																												
8	LIMPIEZA FINAL	-	UNIDAD	Q 222.00	Q -	Q -	0%																																																																																																																																																																																																												
9																																																																																																																																																																																																																			
10																																																																																																																																																																																																																			
11																																																																																																																																																																																																																			
12																																																																																																																																																																																																																			
13																																																																																																																																																																																																																			
14																																																																																																																																																																																																																			
15																																																																																																																																																																																																																			
16																																																																																																																																																																																																																			
17																																																																																																																																																																																																																			
18																																																																																																																																																																																																																			
19																																																																																																																																																																																																																			
20																																																																																																																																																																																																																			
21																																																																																																																																																																																																																			
22																																																																																																																																																																																																																			
23																																																																																																																																																																																																																			
					Q 207,900.00	Q 207,900.00	90.00%																																																																																																																																																																																																												
Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del 90.00% por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente																																																																																																																																																																																																																			
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.																																																																																																																																																																																																																			
Este proyecto consiste en el mejoramiento de la calle en colonia brisas del pinal con adoquin, ya que la actual se encuentra en mal estado, por lo que necesita ser reparada.																																																																																																																																																																																																																			
4. RECOMENDACIONES.																																																																																																																																																																																																																			
Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun																																																																																																																																																																																																																			
SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.																																																																																																																																																																																																																			
Jose F. Alexander Aguilar Mejia Ingeniero Civil Colegiado No. 9.366 ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES ALCALDE JOSE ELIAS HERRERA GUERRA ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!																																																																																																																																																																																																																			

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO		
Nombre del proyecto. MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Ubicación del proyecto. Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso	
2. INFORME FOTOGRAFICO.		
		
SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.		
 José F. Alexander Aguilar Mejía Ingeniero Civil Colegiado No. 9.366 ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES  ALCALDE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA (Sirviendo) JOSE ELIAS HERRERA GUERRA ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA		

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 1

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Municipio: GUASTATOYA

Comunidad: CABECERA MUNICIPAL

Fecha de Inicio: 16/12/2024

Fecha de Finalización: 23/01/2025

Contrato No.: 25-2024

Modificaciones:

Constructora: CONSTRUCTORA VARGAS

Representante legal: VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA

Departamento: EL PROGRESO

Fecha de Contrato: 04/12/2024

Fecha de Supervisión: 07/01/2025

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Valor del Proyecto: Q.231,000.00

Valor Original: Q.231,000.00

Telefono:

RESUMEN DE RENGLONES																
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE		
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL					CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL			
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	420.00	M2	Q	10.75	Q	4,515.00				420.00	Q	4,515.00	Q	4,515.00	1.95%
2	CORTE DE CAJUELA T=0.25M	420.00	M2	Q	66.75	Q	28,035.00				420.00	Q	28,035.00	Q	28,035.00	12.14%
3	BASE DE MATERIAL SELECTO COMPACTADO T=0.10M	420.00	M2	Q	91.25	Q	38,325.00				420.00	Q	38,325.00	Q	38,325.00	16.59%
4	BORDILLO PREFABRICADO DE 0.15*0.30*0.50 F'C=280 KG/CM2	140.00	M	Q	192.25	Q	26,915.00				75.00	Q	14,418.75	Q	14,418.75	6.24%
5	CARPETA DE ADOQUIN PARA TRAFICO PESADO F'C=280KG/CM2	388.00	M2	Q	313.50	Q	121,638.00				365.00	Q	114,427.50	Q	114,427.50	49.54%
6	LLAVES DE CONFINAMIENTO TRANSVERSAL DE 0.10 x 0.20 M F'C=280 KG/CM2	79.00	M	Q	125.00	Q	9,875.00				60.71	Q	7,588.75	Q	7,588.75	3.29%
7	LLAVES DE REMATE DE 0.20 x 0.20 M F'C=280 KG/CM2	5.00	M	Q	295.00	Q	1,475.00				2.00	Q	590.00	Q	590.00	0.26%
8	LIMPIEZA FINAL	1.00	UNIDAD	Q	222.00	Q	222.00				-	Q	-	Q	-	0.00%
		COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q	231,000.00				Q	207,900.00	Q	207,900.00	Q	90.00%


VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q	207,900.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q	41,580.00
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q	4,620.00
LIQUIDO A RECIBIR	Q	166,320.00

Jose F. Alexander Aguilar Mejia

Ingeniero Civil

Colegiado No. 9:366

ALCALDE




JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

GUASTATOYA

¡Sirviéndol

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL
UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4452/12/2024

No. CONTRATO	25-2024
FECHA CONTRATO	04/12/2024
MONTO CONTRACTUAL	231,000.00
NIG	24679356
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE CON ADQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HECTOR ARNULFO ARCHILA NARROQUIN
EMPRESA EJECUTORA	VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 19/12/2024

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4452/12/2024

CONTRATO No. 25-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA
BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA,
GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA




REGISTRO No. 1

FECHA 04/01/2025

TIPO AVANCE

DESCRIPCIÓN El día de hoy se realiza visita de campo, para observar el avance en el
proyecto de adoquinado, se observa la colocación de adoquín y la
continuación de colocación de base

CREADO POR JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA

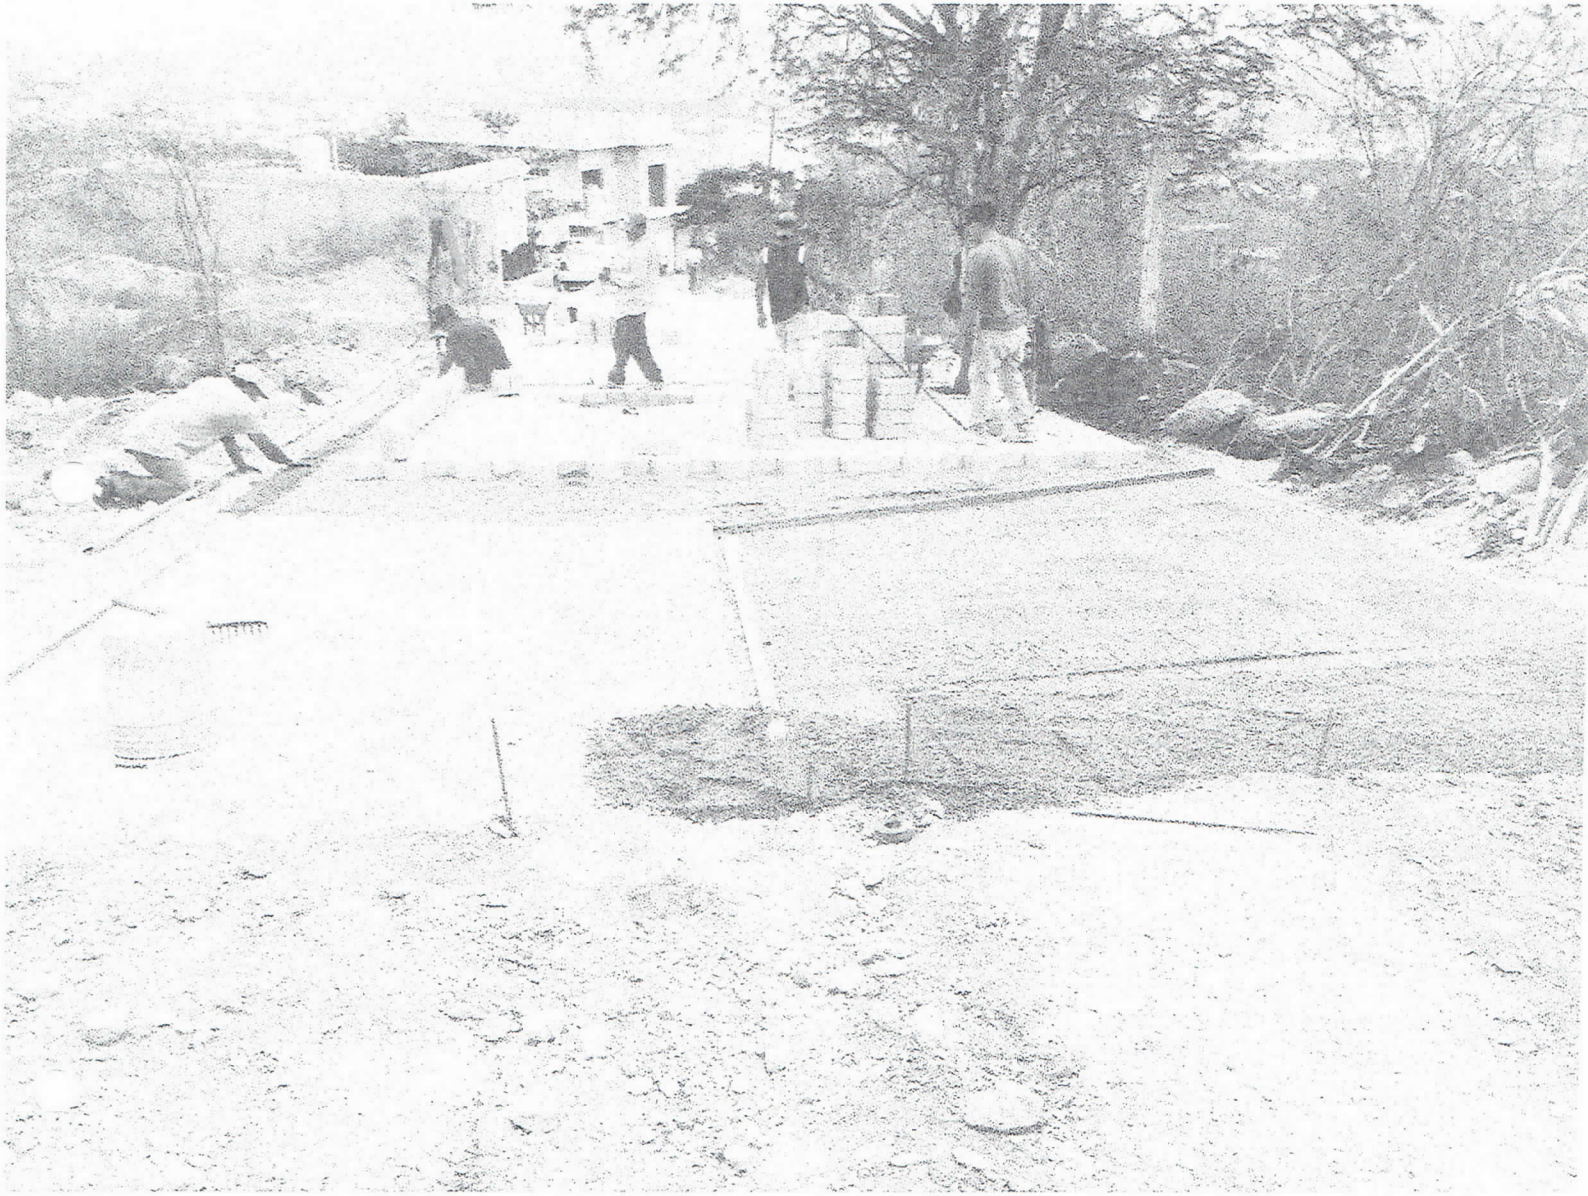













LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

CERTIFICA

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe EL ACUERDO MUNICIPAL No. 001-2025 de fecha nueve de enero de dos mil veinticinco del libro número 3,211 de la Alcaldía Municipal, Libro de Acuerdos, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

ACUERDO MUNICIPAL 001-2025

Guastatoya, 09 de Enero de 2,025

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

La Autoridad Administrativa Superior

Se tiene a la vista la solicitud presentada por Vinicio Alexander Vargas Arriaza propietario de la empresa **CONSTRUCTORA VARGAS**, en la cual manifiesta que el proyecto denominado “**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**”, el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 25-2024, de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro; y que el proyecto en referencia se encuentra en un avance físico del 90.00%, en consecuencia solicitan el pago de conformidad con la cláusula cuarta numeral 2) del contrato administrativo de obras.

Consecuentemente se encuentra el informe del Ingeniero Jose Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, en el cual hace constar la confirmación del avance del proyecto en referencia, por un total de 90.00% de avance físico, adjunta para el efecto la estimación.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: Estimaciones para pago. “*La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas.*”.


POR TANTO:

Con fundamento en los antecedentes y lo considerado, este Despacho Municipal.

RESUELVE:

- I) **APROBAR**, el pago por la cantidad de 90.00%, del proyecto “**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**”, el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 25-2024, de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro; suscrito por el Alcalde Municipal y Vinicio Alexander Vargas Arriaza propietario de **CONSTRUCTORA VARGAS**.
- II) **SE ORDENA**, al Director de la Administración Financiera Municipal, hacer el pago correspondiente al 90.00% del monto total del proyecto.
- III) Cúmplase. -

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A NUEVE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.


LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN
SECRETARIA MUNICIPAL
