

JUNTA RECEPTORA Y LIQUIDADORA DE OBRAS

LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS Nº 0235

ACTA DE RECEPCION NUMERO 18-2025
IDENTIFICACION DEL PROYECTO NOG 23630590

En el municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso siendo las diez horas en punto el día lunes nueve de junio del año dos mil veinticinco; reunidos en el área donde se ejecutó el proyecto; **“AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.”**; los miembros de la comisión receptora y liquidadora integrada por Melvin Mauricio Morales Rodas, Auxiliar de la Dirección Municipal de Planificación; Beverly Mishell Cruz Orellana, Secretaria de la Dirección Municipal de Planificación y Rudy Danilo Orellana Orellana, Encargado de Mantenimiento y Convoy Municipal; quienes fueron nombrados mediante el punto QUINTO del acta de sesiones ordinarias número 01-2025 de fecha uno de enero del año dos mil veinticinco, acompañados por el señor Fernando Augusto Hernández Godoy, propietario y representante legal de la empresa denominada **“CONSTRUFER.”**, el ingeniero José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, con el objeto de dejar constancia de lo siguiente: **PRIMERO:** De conformidad con el contrato administrativo número DIECISIETE guion dos mil VEINTICUATRO (17-2024), de fecha veinte de septiembre de dos mil veinticuatro, suscrito entre el señor Fernando Augusto Hernández Godoy, propietario de la empresa denominada: **“CONSTRUFER”**, para la ejecución del proyecto **“AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO”**. **SEGUNDO:** El señor Fernando Augusto Hernández Godoy, representante legal de la empresa **“CONSTRUFER”**, mediante nota de fecha cinco de junio de dos mil veinticinco, dirigida al señor Alcalde Municipal, en la cual solicita la recepción del proyecto ya que se encuentra totalmente finalizado; así mismo el informe del ingeniero José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, de fecha cinco de junio de dos mil veinticinco, mediante el cual hace notar que luego de haber supervisado físicamente lo ejecutado con relación a planos y demás documentos el proyecto en referencia se encuentra totalmente terminado en sus renglones de trabajo, por lo que manifiesta que la obra se ejecutó en un 100% de avance físico; según los renglones finales que se detallan: -----

Núm.	DESCRIPCION DEL REGLON	CANTIDAD	UNIDAD
1	ALCANTARILLADO SANITARIO		
1.1	Excavación para alcantarillado y acometidas domiciliars	156.00	M3
1.2	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado (Ø=15" ASTM F949)	145.00	M
1.3	Instalación de acometidas domiciliars	18.00	UNIDAD
1.4	Relleno de alcantarillado y acometidas domiciliars	230.00	M3
1.5	Pozos de visita de alcantarillado sanitario con profundidad entre 1.20 m y 2.50 m	2.00	UNIDAD
2	ALCANTARILLADO PLUVIAL		
2.1	Excavación para alcantarillado pluvial	118.00	M3
2.2	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado pluvial (Ø=30")	145.00	M
2.3	Relleno compactado	153.00	M
2.4	Caja Unión	1.00	UNIDAD
2.5	Caja reunidora + rejilla	1.00	UNIDAD
3	PAVIMENTO	-	-
3.1	Retiro de carpeta de adoquín existente	979.00	M2



JUNTA RECEPTORA Y LIQUIDADORA DE OBRAS

LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS Nº 0236

3.2	Corte de cajuela (t=0.25 m)	244.00	M3
3.3	Reacondicionamiento de subrasante	979.00	M2
3.4	Base de material granular (t=0.10 m)	97.00	M3
3.5	Adoquín de concreto	46.00	M2
3.6	Llaves de confinamiento de concreto	86.00	M
3.7	Bordillo prefabricado	240.00	M
3.8	Señalización horizontal y vertical	111.00	M
3.9	Limpieza general	1.00	UNIDAD
4	PAVIMENTO		
4.1	Fundición de Pavimento de 0.15 M	472.10	M2

TERCERO: Luego de la verificación se procede a la **RECEPCIÓN** del Proyecto antes detallado a entera satisfacción de lo ejecutado, razón por la cual por este acto la Comisión Receptora y Liquidadora se pronuncia favorablemente a lo ejecutado por la empresa **“CONSTRUFER”** siendo el representante legal el señor Fernando Augusto Hernández Godoy. **CUARTO:** Finalmente esta comisión, solicita que a nivel administrativo se requiera al Director Financiero de la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal, un informe financiero del presente proyecto para poder proceder posteriormente con el acta de liquidación respectiva. **QUINTO:** De acuerdo a lo anterior se deja constancia plena que el día de hoy se **RECEPCIONA** el proyecto correspondiente y que no tenemos ningún tipo de impedimento para realizar dicha diligencia. **CIERRE:** No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente, treinta minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha, la que previa lectura se acepta, ratifica y se firma para constancia legal, damos fe quienes en ella intervenimos. -----


Melvin Mauricio Morales Rodas
Auxiliar de la Dirección Municipal de Planificación
Miembro Titular de la Comisión de Recepción

Beverly Mishell Cruz Orellana
Secretaria de la Dirección Municipal de Planificación
Miembro Titular de la Comisión de Recepción

Rudy Danilo Orellana Orellana
Encargado de Mantenimiento y Convoy Municipal
Miembro Titular de la Comisión de Recepción

CONSTRUFER
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODÓY
Propietario y Representante Legal de la Empresa
CONSTRUFER

COMISIÓN DE RECEPCIÓN
Y LIQUIDACIÓN



José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipal



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

5980-0535 MUNI ALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2024

EXPEDIENTE No. 271 NOG: 23630590 CONTRATO No. 17-2024

PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR
COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte CODEDE	100.00%			
Q. 1,255,350.00		Q. 84,328.13	Q. 16,865.62	Q. 67,462.51
12 02 003 000 002 331 31-0101-0004				
Aporte MUNICIPALIDAD	100.00%			
Q. 300.15		Q. 20.16	Q. 4.04	Q. 16.12
12 02 003 000 002 331 32-0101-0014				
Aporte COMUNIDAD	100.00%			
Q. 350.000		Q. 23.51	Q. 4.70	Q. 18.81
12 02 003 000 002 331 31-3101-0002				
TOTALES		Q. 84,371.80	Q. 16,874.36	Q. 67,497.44

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Acuerdo de aprobación de avance, Copia de bitácora, Certificados de calidad, Pruebas de laboratorio, Fianzas de Conservación de obras y Saldos deudores, Acta de Recepción de obras.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

[Handwritten signature]



Factura

FERNANDO AUGUSTO , HERNÁNDEZ GODOY
Nit Emisor: 9303111
CONSTRUFER
KILÓMETRO 73 RUTA AL ATLÁNTICO KILOMETRO 73 ALDEA CASAS
VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
C3870D79-57E2-46F4-BF6D-7B0D30488C30
Serie: C3870D79 Número de DTE: 1474447092
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 24-jul-2025 10:20:01
Fecha y hora de certificación: 24-jul-2025 10:20:01
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Pago del 100.00% de avance físico y financiero del proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. Según Contrato Administrativo No. 17-2024. Monto de estimación: Q.84,371.80, (-) Amortización: Q.16,874.36, Líquido a recibir: Q.67,497.44	84,371.80	0.00	0.00	84,371.80	IVA	9,039.835714
TOTALES:					0.00	0.00	84,371.80	IVA	9,039.835714

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

SERIE No. 646806
B

FECHA		AÑO
DIA	MES	2025
11	7	

[illegible]

LECTURA DE CONTADOR

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL

CUENTA

MUNICIPALIDAD DE

SUB-COMMITTEE STATOYA

TOTAL	Q.	Q67,462.51
--------------	-----------	-------------------

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR
LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE
FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL.

ORIGINAL-ENTERANTE

CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Liquidación

Mensaje de confirmación

10.jun..2025 10:45:13

Documentos asociados:

1	23630590@INFORME DE SUPERVISION 100 AVANCE FISICO DRENAJE PLUVIAL COLONIA HICHOS.pdf(3633 KB)
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón





Aldea Casas Viejas, Guastatoya El Progreso, 05 de junio del año 2025

Señor:
Alcalde
José Elías Herrera Guerra
Municipalidad de Guastatoya
Departamento de El Progreso
Presente.

Por este medio me dirijo a usted, deseándole muchos éxitos y bendiciones en tan distinguido cargo.

El motivo de la presente es para solicitar se nombre a la comisión respectiva de la oficina de planificación para evaluación física del Proyecto denominado: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO", según contrato Administrativo Número (17-2024), de fecha 20 de septiembre del año 2024, ubicado en Sector Colonia Hichos, Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso.


Dicha obra tiene un **avance físico del 100.00%**, es por ello que se solicita realizar los trámites correspondientes para el desembolso del porcentaje antes mencionado.

Al oficio se adjuntan los siguientes documentos:

- ✓ Cuadro de estimación
- ✓ Registro fotográfico

Agradeciendo la atención prestada, y en espera de una respuesta positiva, me es grato el suscribirme.

Atentamente,

F. 
Fernando Augusto Hernández Godoy
Propietario
CONSTRUFER


CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
PROPIETARIO


CONSTRUFER
ESTIMACIÓN DE TRABAJO No. 3
PROYECTO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"
MONTO DEL CONTRATO: Q. 1,258,000.15
MONTO MODIFICADO: Q. 1,258,020.88

RENDIMIENTOS DE TRABAJO/CANTIDADES												
No. RENDIMIENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRATADA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS (ACTUALES Y ACUMULADAS)			% EJECUTADO DEL RENDIMIENTO	% TC RENDIMIENTO		
						ESTE PERIODO	PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO				
MONTO MODIFICADO: Q. 1,258,020.85												
ALCANTARILLADO SANITARIO												
1.0												
1.1	Excavación para alcantarillado y acometidas domiciliarias	158.00	m3	Q241.08	Q 37,608.48	0.00	158.00	Q	Q	37,608.48	100.00%	2.98%
1.2	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado (Ø=15" ASTM F949)	145.00	m	Q1,117.55	Q 162,044.75	0.00	145.00	Q	Q	162,044.75	100.00%	12.90%
1.3	Instalación de acometidas domiciliarias	18.00	Unidad	Q3,422.61	Q 61,608.88	0.00	18.00	Q	Q	61,608.88	100.00%	4.90%
1.4	Relevo de alcantarillado y acometidas domiciliarias	230.00	m3	Q165.61	Q 38,090.30	0.00	230.00	Q	Q	38,090.30	100.00%	3.03%
1.5	Pozos de visita de alcantarillado sanitario con profundidad entre 1.20 m y 2.50	2.00	Unidad	Q28,678.25	Q 53,358.50	0.00	2.00	Q	Q	53,358.50	100.00%	4.25%
ALCANTARILLADO PLUVIAL												
2.0												
2.1	Excavación para alcantarillado pluvial	118.00	m3	Q245.00	Q 29,018.20	0.00	118.00	Q	Q	29,018.20	100.00%	2.31%
2.2	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado pluvial (Ø=30")	145.00	m	Q1,350.68	Q 195,845.70	0.00	145.00	Q	Q	195,845.70	100.00%	15.59%
2.3	Relevo compactado	153.00	m	Q176.18	Q 26,955.54	0.00	153.00	Q	Q	26,955.54	100.00%	2.15%
2.4	Caja Unión	1.00	Unidad	Q12,593.40	Q 12,593.40	0.00	1.00	Q	Q	12,593.40	100.00%	1.00%
2.5	Caja reunidora + rejilla	1.00	Unidad	Q82,388.35	Q 82,388.35	0.00	1.00	Q	Q	82,388.35	100.00%	6.58%
ADOQUINADO												
3.0												
3.1	Relevo de carpeta de adoquín existente	979.00	m2	Q80.20	Q 78,516.80	0.00	979.00	Q	Q	78,516.80	100.00%	6.25%
3.2	Corte de cajuela (l=0.25 m)	244.00	m3	Q158.91	Q 38,786.04	0.00	244.00	Q	Q	38,786.04	100.00%	3.05%
3.3	Recondicionamiento de subrasante	979.00	m2	Q46.55	Q 44,693.45	0.00	979.00	Q	Q	44,693.45	100.00%	3.55%
3.4	Base de material granular (l=0.10 m)	97.00	m3	Q302.75	Q 29,388.75	0.00	97.00	Q	Q	29,388.75	100.00%	2.34%
3.5	Adoquín de concreto	48.00	m2	Q250.63	Q 11,624.38	0.00	48.00	Q	Q	11,624.38	100.00%	0.92%
3.6	Llaves de confinamiento de concreto	86.00	m	Q217.40	Q 18,696.40	0.00	86.00	Q	Q	18,696.40	100.00%	1.48%
3.7	Bordillo prefabricado	240.00	m	Q246.78	Q 59,227.20	0.00	240.00	Q	Q	59,227.20	100.00%	4.72%
3.8	Señalización horizontal y vertical	111.00	m	Q182.07	Q 21,318.77	0.00	111.00	Q	Q	21,318.77	100.00%	1.70%
3.9	Limpieza general	1.00	Unidad	Q3,827.87	Q 3,827.87	1.00	0.00	Q	Q	3,827.87	100.00%	0.30%
4.0												
4.1	Fundición de Pavimento de 0.15m	472.10	m2	Q532.00	Q 251,187.20	42.35	429.75	Q	Q	251,187.20	100.00%	20.00%
Total cantidad contratada					Q 1,258,020.85	Cantidad ejecutada			Q 1,258,020.85	TOTAL %		
									Q 1,258,020.85	100.00%		

MONTO BRUTO DE ESTIMACIÓN		Q	125,002.09
MONTO BRUTO DE ESTIMACIÓN 1		Q	590,320.07
MONTO BRUTO DE ESTIMACIÓN 2		Q	840,598.71
MONTO DE ESTIMACIONES		Q	1,258,020.88
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 25%		Q	31,450.44

LÍQUIDO A RECIBIR		Q	100,483.87
-------------------	--	---	------------


FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
PROPIETARIO
CONSTRUFER


JOEL ANADO ORELLANA
INGENIERO CIVIL
CONSTRUYENDO SU FAMILIA
SUPERVISOR DE LA EMPRESA


CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
PROPIETARIO



REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR
COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"
CONTRATO No.17-2024



CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
PROPIETARIO



REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR
COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"
CONTRATO No.17-2024




CONSTRUER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODÓY
TEL: 5000-5317



REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR
COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"
CONTRATO No.17-2024



CONSTRUER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODÓY
PROPIETARIO

[Handwritten signature]




REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR
COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"
CONTRATO No.17-2024



CONSTRUER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO A. HERNÁNDEZ GODÓY
PROPIETARIO

F. 
Fernando Augusto Hernández Godoy
Propietario
CONSTRUER

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 05 de Junio de 2025

**SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO**

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, con número de contrato **17-2024** de fecha 20 de Septiembre de 2024, ejecutado por la empresa **CONSTRUFER**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Junio de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **100.00 %**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegado No. 9,366

**ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO**

D.M.P.

SUPERVISION DE
OBRAS



Dirección Municipal de
Planificación

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR
COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL
PROGRESO

Ubicación del proyecto.
Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.

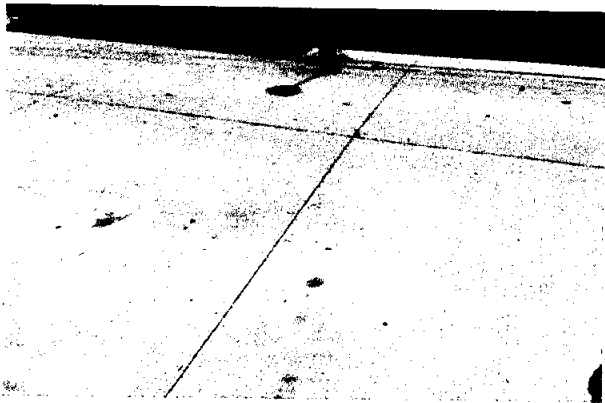


SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE



JOSE ELIAS HERRERA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 3

Nombre del Proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municipio: GUASTATOYA	
Comunidad: CABECERA MUNICIPAL	
Departamento: EL PROGRESO	
Fecha de Inicio: 16/10/2024	
Fecha de Finalización: 15/06/2025	
Contrato No.: 17-2024	
Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	
Modificaciones:	
Valor del Proyecto: Q.1,256,000.15	
Valor Original: Q.1,256,000.15	
Representante legal: FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY	
Construtora: CONSTRUFER	
Telefono:	

RESUMEN DE RENGIONES

No.	DESCRIPCION	CANTIDADES DE TRABAJO			ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGION MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS TERCERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	ALCANTARILLADO SANITARIO												
1.1	Excavación para alcantarillado y acometidas domiciliarias	156.00	m3	Q 241.08	Q 37,608.48			156.00		Q -	156.00	Q 37,608.48	2.99%
1.2	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado (Ø=15" ASTM F949)	145.00	m	Q 1,117.33	Q 162,044.75			145.00		Q -	145.00	Q 162,044.75	12.90%
1.3	Instalación de acometidas domiciliarias	18.00	Unidad	Q 3,422.61	Q 61,606.98			18.00		Q -	18.00	Q 61,606.98	4.91%
1.4	Relleno de alcantarillado y acometidas domiciliarias	230.00	m3	Q 185.61	Q 38,090.30			230.00		Q -	230.00	Q 38,090.30	3.03%
1.5	Poner de vista de alcantarillado sanitario con profundidad entre 1.20 m y 2.50 m	2.00	Unidad	Q 26,679.25	Q 53,358.50			2.00		Q -	2.00	Q 53,358.50	4.25%
2	ALCANTARILLADO PLUVIAL												
2.1	Excavación para alcantarillado pluvial	118.00	m3	Q 245.90	Q 29,016.20			118.00		Q -	118.00	Q 29,016.20	2.31%
2.2	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado pluvial (Ø=30")	145.00	m	Q 1,350.66	Q 195,845.70			145.00		Q -	145.00	Q 195,845.70	15.59%
2.3	Relleno compactado	153.00	m	Q 176.18	Q 26,955.54			153.00		Q -	153.00	Q 26,955.54	2.15%
2.4	Caja Union	1.00	Unidad	Q 12,593.40	Q 12,593.40			1.00		Q -	1.00	Q 12,593.40	1.00%
2.5	Caja reuidora y rejilla	1.00	Unidad	Q 82,386.35	Q 82,386.35			1.00		Q -	1.00	Q 82,386.35	6.86%
3	ADOQUINADO												
3.1	Retiro de carpeta de adoquín existente	979.00	m2	Q 80.20	Q 78,515.80			979.00		Q -	979.00	Q 78,515.80	6.25%
3.2	Corte de cuneta (1x0.25 m)	244.00	m3	Q 156.91	Q 38,286.04			244.00		Q -	244.00	Q 38,286.04	3.05%
3.3	Recondicionamiento de subrasante	979.00	m2	Q 45.55	Q 44,593.45			979.00		Q -	979.00	Q 44,593.45	3.55%
3.4	Base de material granular (1x0.10 m)	97.00	m3	Q 302.75	Q 29,366.75			97.00		Q -	97.00	Q 29,366.75	2.54%
3.5	Adoquín de concreto	979.00	m2	Q 250.33	Q 245,358.87			979.00		Q -	979.00	Q 245,358.87	0.92%
3.6	Llaves de confinamiento de concreto	166.00	m	Q 217.40	Q 36,088.40			166.00		Q -	166.00	Q 36,088.40	1.49%
3.7	Bordillo prefabricado	240.00	m	Q 246.78	Q 59,227.20			240.00		Q -	240.00	Q 59,227.20	4.72%
3.8	Sellado horizontal y vertical	111.00	m	Q 192.07	Q 21,319.77			111.00		Q -	111.00	Q 21,319.77	1.70%
3.9	Limpiera general	1.00	Unidad	Q 3,827.67	Q 3,827.67			1.00		Q -	1.00	Q 3,827.67	0.30%
4	PAVIMENTO												
4.1	Fundición de pavimento de 0.15m	472.10	m2	Q 532.00	Q 251,157.20			472.10		Q 22,530.20	472.10	Q 251,157.20	20.00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					Q 1,256,000.15				Q	376,737.73		Q 1,256,020.86	100.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 3	Q 376,737.73
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q 75,347.55
PERCENTAJE DE AMORTIZAR	Q -
LIQUIDO A RECIBIR	Q 301,390.18

José F. Alexander Aguilar Mejía
 Ingeniero Civil
 Colegiado No. 9,366

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
 ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA
 ¡Sirviendo!



BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3170/10/2024

CONTRATO No. 17-2024

NOMBRE: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL
PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	8
FECHA	02/04/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	El proyecto se encuentra en fase de terminación, colocscion de banquetas
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA









BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3170/10/2024

CONTRATO No. 17-2024


NOMBRE: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL
PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA




REGISTRO No. 9
FECHA 08/05/2025
TIPO AVANCE
DESCRIPCIÓN El proyecto se encuentra en fase de terminación
CREADO POR FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



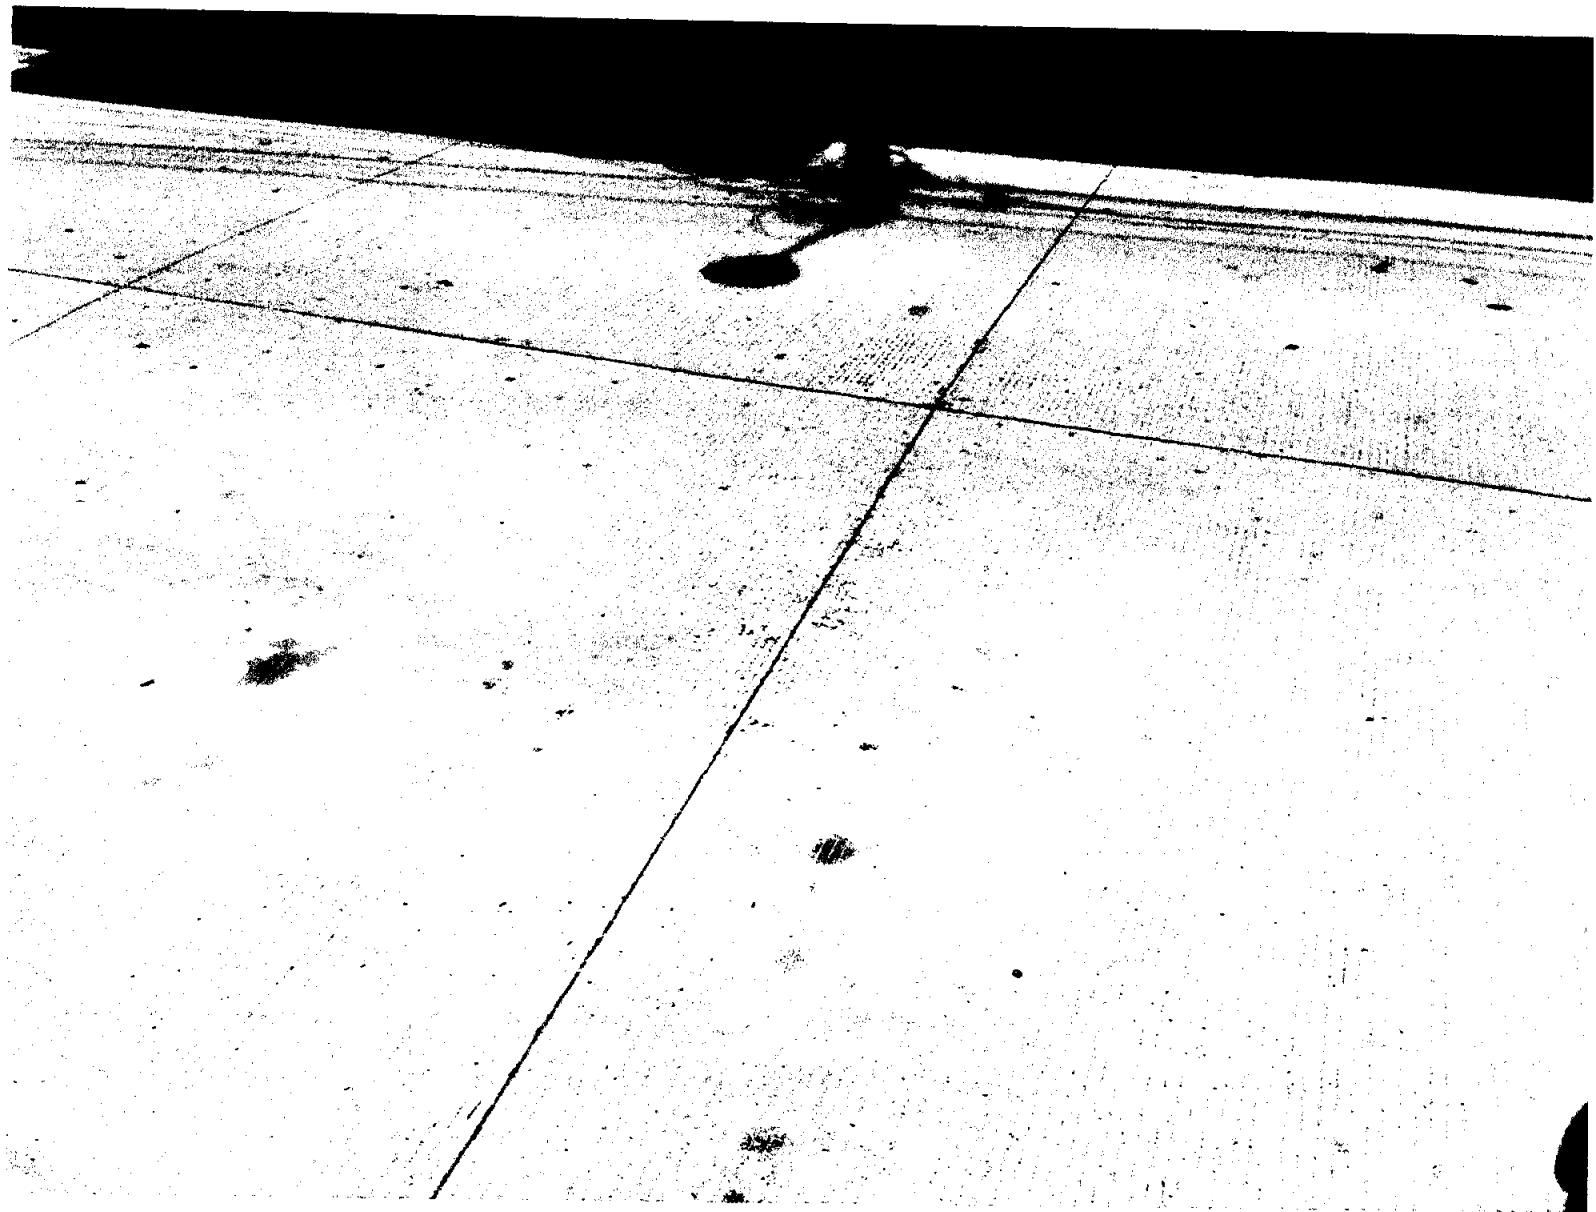



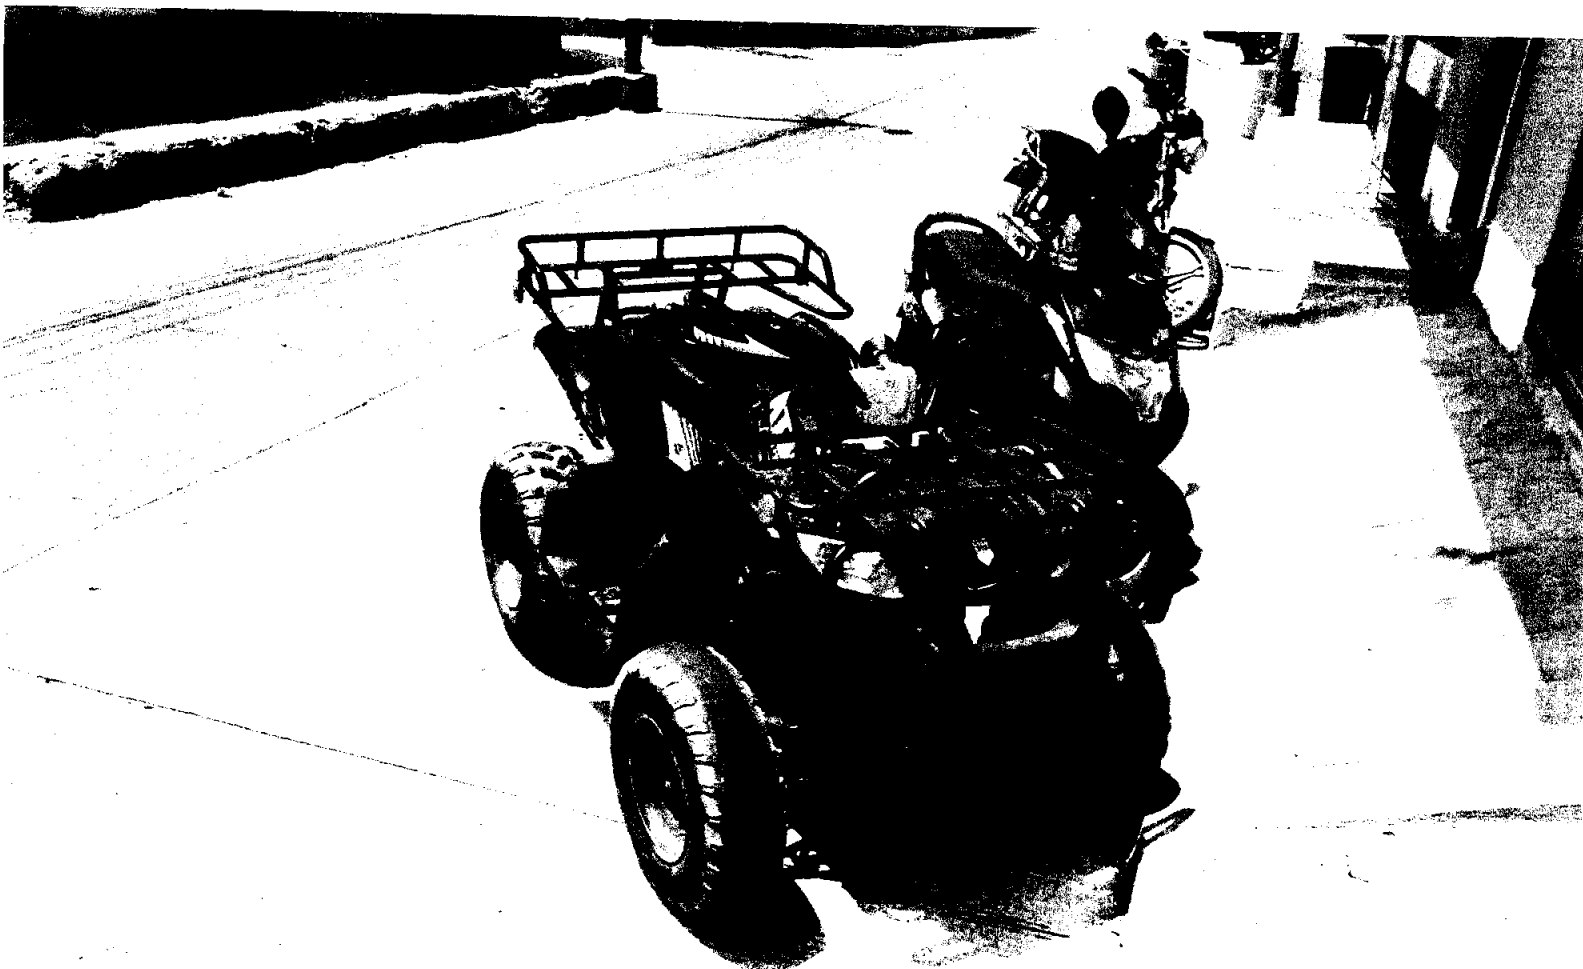



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

¡Sirviendo!

5980-0535

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **SÉPTIMO** del acta **42-2025** de fecha seis de junio de dos mil veinticinco del libro número 3,539 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

SÉPTIMO: La Secretaria Municipal informa al Concejo Municipal que, Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de Planificación, presenta oficio Ref.agmo/DMP/238-2025, de fecha 06 de junio de 2025, el cual en su parte conducente expone: "El motivo de la presente es para informarle que el proyecto **AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. Contrato administrativo número 17-2024 de fecha 20 de Septiembre de 2024, ejecutado por la empresa **CONSTRUFER**, presentó informe del 100% de avance físico y se solicita nombrar a la comisión de recepción y liquidación para levantar el Acta de Recepción. Por lo tanto, solicito que apruebe el pago del 100% de avance físico del proyecto antes mencionado y nombrar a la junta de recepción para su respectiva revisión". El Concejo Municipal. **CONSIDERANDO:** Que la municipalidad de Guastatoya, El Progreso y la empresa mercantil denominada: **CONSTRUFER**, suscribieron contrato administrativo número 17-2024, para la ejecución del proyecto: **AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. **CONSIDERANDO:** Que a la presente fecha el Director Municipal de Planificación, hace del conocimiento al Concejo Municipal sobre el avance físico del 100% del proyecto: **AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, siendo necesario emitir la disposición legal correspondiente. **CONSIDERANDO:** Que la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala en el Artículo 55 establece: "Inspección y recepción final...el supervisor *rendirá informe pormenorizado a la autoridad administrativa superior de la entidad correspondiente, la que dentro de los cinco (5) días siguientes nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros, con la que colaborarán el supervisor o su equivalente y el representante del contratista...*" **CONSIDERANDO:** Que la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala en el Artículo 59 establece: "*Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas.*" **CONSIDERANDO:** Que El Código Municipal y sus reformas Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala en el Artículo 35 literal a) establece: "*Atribuciones generales del Concejo Municipal. Son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales...*" **POR TANTO:** El Concejo Municipal fundamentado en lo considerado y con las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas y por **UNANIMIDAD DE VOTOS**. **ACUERDA:** I) Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente de mérito. II) Se ordena notificar a la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras a efecto de verificar el avance físico del proyecto: **AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, el cual se ejecuta con el contrato 17-2024. III) Luego de la recepción del acta de la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras que el Director de la Dirección de Administración Integrada Financiera Municipal proceda a realizar el pago equivalente al avance físico del 100.00% a favor de: **FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY**, propietario de la empresa mercantil denominada **CONSTRUFER**. IV) Notifíquese.

(Fs) Ilegibles José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Hernán Archila Morales, Erasmo Beltón Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Aimée Estrada Ortiz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A NUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO.

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN
SECRETARIA MUNICIPAL



¡Sirviendo!
