



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

- 5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
- BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2024

EXPEDIENTE No. 271 NOG: 23630590 CONTRATO No. 17-2024

PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR
COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte CODEDE	90.00%			
Q. 1,255,350.00		Q. 758,953.23	Q. 151,790.65	Q. 607,162.58
12 02 003 000 002 331 31-0101-0004				
Aporte MUNICIPALIDAD	90.00%			
Q. 300.15		Q. 181.46	Q. 36.29	Q. 145.17
12 02 003 000 002 331 32-0101-0014				
Aporte COMUNIDAD	90.00%			
Q. 350.000		Q. 211.60	Q. 42.32	Q. 169.28
12 02 003 000 002 331 31-0101-0002				
TOTALES		Q. 759,346.29	Q. 151,869.26	Q. 607,477.03

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Punto de concejo de aprobación de avance, Copia de bitácora.

/Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación



Factura

FERNANDO AUGUSTO , HERNÁNDEZ GODOY
Nit Emisor: 9303111
CONSTRUFER
KILÓMETRO 73 RUTA AL ATLÁNTICO KILOMETRO 73 ALDEA CASAS
VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
B111ADC6-31ED-4D8E-B055-3F693D7F4297
Serie: B111ADC6 Número de DTE: 837635470
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 13-jun-2025 14:50:58
Fecha y hora de certificación: 13-jun-2025 14:50:58
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Pago del 90% de avance fisico y financiero del proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. Según Contrato Administrativo No. 17-2024. Monto de estimación: Q.759,346.29, (-) Amortización: Q.151,869.26 = Líquido a recibir: Q.607,477.03	759,346.29	0.00	0.00	759,346.29	IVA	81,358.53107
TOTALES:					0.00	0.00	759,346.29	IVA	81,358.53107

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Ejecución

Mensaje de confirmación

10.jun..2025 10:17:41

Documentos asociados:

1	23630590@INFORME DE SUPERVISION 90 AVANCE FISICO DRENAJE PLUVIAL COLONIA HICHOS.pdf(2467 KB)
---	--

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD
DE GUASTATOYA,
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO



FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

SERIE
B No. 642511

DIA 9
FECHA MES 6 AÑO 2025

Seiscientos siete mil ciento sesenta y dos

POR: quetzales con 58/100 CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: Consejo Departamental de Desarrollo

DIRECCION: El Progreso

ARBI- TRIOS	ORNATO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Q. _____	
TASAS	VARIOS											
	LICENCIAS											
	ESTACIONAMIENTOS											
	CERTIFICACIONES											
	CEDULAS											
	MERCADOS											
	SERVICIOS VARIOS											
	SERVICIOS AGUA											
	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA											
	CONTRI- BUCIONES	CONCEPTO	Pago del 90.00% tercer desembolso del									
MULTAS	CONCEPTO	proyecto ampliacion sistema de alcantarillado									Q607,162.58	
OTROS	VARIOS	pluvial sector colonia Hichos, Barrio El										
		Porvenir, Guastatoya, El Progreso. SNIP										
		34365, convenio No. 079-2024, fuente 12										
LECTURA DE CONTADOR		ACTUAL		ANTERIOR								
OBSERVACIONES:												
FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL		CUENTA										
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA		SUB-CUENTA										

TOTAL Q. Q607,162.58

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR
LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE
FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL

ORIGINAL-ENTERANTE

FORMULARIO STANDARD S.A. REC-248-4000-JMT-18223-7-19-000-100002 DEB. No. 500.00 AL No. 800.00, SERIE B, ENVIÓ MUNICIPAL No. 4510 DE FECHA 10/02/2022
NÚMERO CORRELATIVO D-4-10-0222 DE FECHA 10/02/2022 No. DE CUENTA 19-3-1 OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10/02/2022 LIBRO 0575 FOLIO 7.

www.municipios-ga.com

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SRIES. No. BJ/5875 Ctas.: 920-12-3-1-4-87 DEL 26-06-97.

2045310 T-0340 1018911 87



Aldea Casas Viejas, Guastatoya El Progreso, 09 de mayo del año 2025

Señor:
Alcalde
José Elías Herrera Guerra
Municipalidad de Guastatoya
Departamento de El Progreso
Presente.

Por este medio me dirijo a usted, deseándole muchos éxitos y bendiciones en tan distinguido cargo.

El motivo de la presente es para solicitar se nombre a la comisión respectiva de la oficina de planificación para evaluación física del Proyecto denominado: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO", según contrato Administrativo Número (17-2024), de fecha 20 de septiembre del año 2,024, ubicado en Sector Colonia Hichos, Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso.


Dicha obra tiene un **avance físico del 90.00%**, es por ello que se solicita realizar los trámites correspondientes para el desembolso del porcentaje antes mencionado.

Al oficio se adjuntan los siguientes documentos:

- ✓ Cuadro de estimación
- ✓ Registro fotográfico

Agradeciendo la atención prestada, y en espera de una respuesta positiva, me es grato el suscribirme.

Atentamente,

F. 
Fernando Augusto Hernández Godoy
Propietario
CONSTRUFER

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
PROPIETARIO

CONSTRUFER
ESTIMACION DE TRABAJO No. 2
PROYECTO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"
MONTO DEL CONTRATO: Q. 1,258,020.88
MONTO MODIFICADO: Q. 1,258,020.88

No. REVOLON	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRATADA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS (ACTUALES Y ACUMULADAS)			ACUMULADO	% EJECUTADO DEL RENGLON	% TOTAL EJECUTADO
						PERIODO ANTERIOR	ESTE PERIODO	PERIODO ANTERIOR			
1.0	ALCANTARILLADO SANITARIO										
1.1	Excavación para alcantarillado y acometidas domiciliarias	156.00	m3	Q241.08	Q 37,608.48	156.00	Q 37,608.48	Q 37,608.48	Q 37,608.48	100.00%	2.89%
1.2	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado (Ø=15" ASTM F48)	145.00	m	Q1,117.55	Q 162,044.75	118.42	Q 31,942.48	Q 130,102.27	Q 162,044.75	100.00%	12.90%
1.3	Instalación de acometidas domiciliarias	18.00	Unidad	Q3,422.81	Q 61,606.88	18.00	Q 61,606.88	Q 61,606.88	Q 61,606.88	100.00%	4.90%
1.4	Relevo de alcantarillado y acometidas domiciliarias	230.00	m3	Q165.61	Q 38,090.30	230.00	Q 38,090.30	Q 38,090.30	Q 38,090.30	100.00%	3.03%
1.5	Pozos de visita de alcantarillado sanitario con profundidad entre 1.20 m y 2.50	2.00	Unidad	Q26,976.25	Q 53,358.50	2.00	Q 53,358.50	Q 53,358.50	Q 53,358.50	100.00%	4.25%
2.0	ALCANTARILLADO PLUVIAL										
2.1	Excavación para alcantarillado pluvial	118.00	m3	Q245.90	Q 28,918.20	118.00	Q 28,918.20	Q 28,918.20	Q 28,918.20	100.00%	2.31%
2.2	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado pluvial (Ø=10")	145.00	m	Q1,350.06	Q 195,845.70	145.00	Q 60,776.70	Q 135,069.00	Q 195,845.70	100.00%	15.59%
2.3	Relevo compactado	153.00	m	Q176.18	Q 26,955.54	153.00	Q 26,955.54	Q 26,955.54	Q 26,955.54	100.00%	2.15%
2.4	Caja Unión	1.00	Unidad	Q12,593.40	Q 12,593.40	1.00	Q 12,593.40	Q 12,593.40	Q 12,593.40	100.00%	1.00%
2.5	Caja ranadora * rejilla	1.00	Unidad	Q82,388.35	Q 82,388.35	1.00	Q 82,388.35	Q 82,388.35	Q 82,388.35	100.00%	6.56%
3.0	ADOQUINADO										
3.1	Relevo de carpeta de adoquín existente	979.00	m2	Q80.20	Q 78,515.80	979.00	Q 78,515.80	Q 78,515.80	Q 78,515.80	100.00%	6.25%
3.2	Corte de calleja (I=0.25 m)	244.00	m3	Q156.81	Q 38,286.04	244.00	Q 38,286.04	Q 38,286.04	Q 38,286.04	100.00%	3.03%
3.3	Recondicionamiento de subbase	979.00	m2	Q45.55	Q 44,583.45	979.00	Q 44,583.45	Q 44,583.45	Q 44,583.45	100.00%	3.55%
3.4	Bases de material granular (I=0.10 m)	97.00	m3	Q302.76	Q 29,388.75	97.00	Q 29,388.75	Q 29,388.75	Q 29,388.75	100.00%	2.34%
3.5	Adoquín de concreto	48.00	m2	Q250.53	Q 11,524.38	48.00	Q 11,524.38	Q 11,524.38	Q 11,524.38	100.00%	0.92%
3.6	Llaves de confinamiento de concreto	86.00	m	Q217.40	Q 18,686.40	86.00	Q 18,686.40	Q 18,686.40	Q 18,686.40	100.00%	1.49%
3.7	Bordillo prefabricado	240.00	m	Q248.78	Q 59,727.20	240.00	Q 59,727.20	Q 59,727.20	Q 59,727.20	100.00%	4.77%
3.8	Señalización horizontal y vertical	111.00	m	Q182.07	Q 20,213.77	111.00	Q 20,213.77	Q 20,213.77	Q 20,213.77	100.00%	1.62%
3.9	Limpeza general	1.00	Unidad	Q3,827.87	Q 3,827.87	1.00	Q 3,827.87	Q 3,827.87	Q 3,827.87	100.00%	0.30%
4.0	PAVIMENTO										
4.1	Fundición de Pavimento de 0.15m	472.10	m2	Q332.00	Q 157,157.20	472.10	Q 157,157.20	Q 157,157.20	Q 157,157.20	100.00%	12.59%
Total cantidad contratada					Q 1,258,020.88	Cantidad ejecutada			Q 1,130,418.77	TOTAL %	90.00%

MONTO BRUTO DE ESTA ESTIMACION	Q 1,130,418.77
MONTO BRUTO DE ESTIMACION 1	Q 600,320.07
MONTO DE ESTIMACIONES	Q 1,130,418.77
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 20%	Q 100,000.00
LÍQUIDO A RECIBIR	Q 430,098.71

ANEXO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODDY
PROPIETARIO
CONSTRUFER



CONSTRUFER

ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODDY
PROPIETARIO
CONSTRUFER



REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR
COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"
CONTRATO No.17-2024

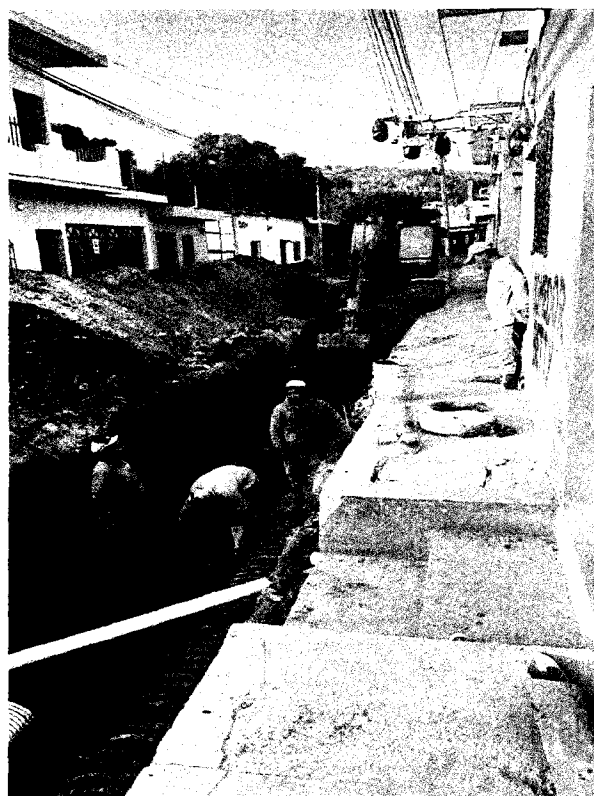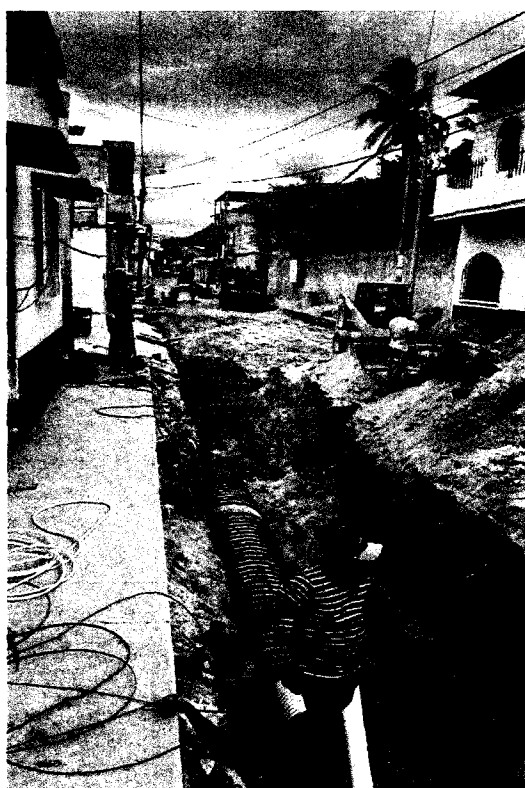





CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY

Propietario: Fernando Augusto Hernández Godoy, Km. 73, Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso. PROPIETARIO
Cel.: 5000-5317, Correo Electrónico: construfercho.1979@gmail.com



REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR
COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"
CONTRATO No.17-2024

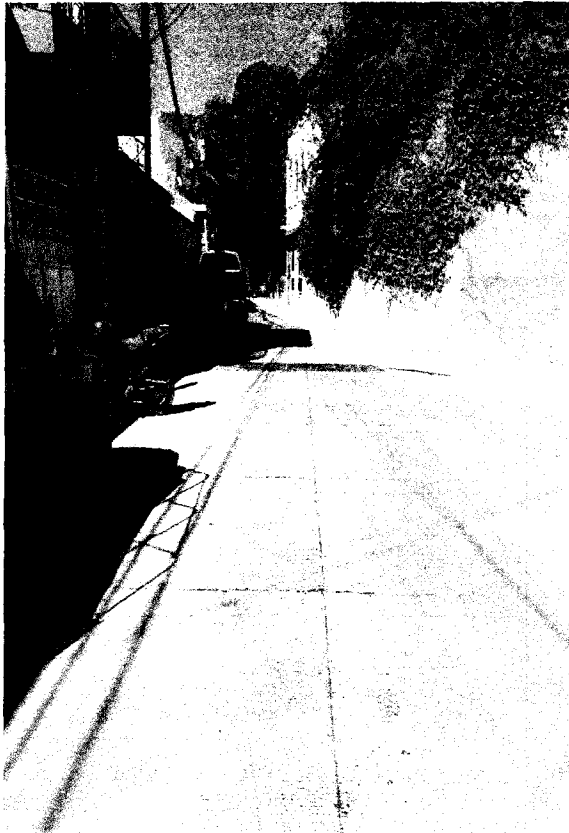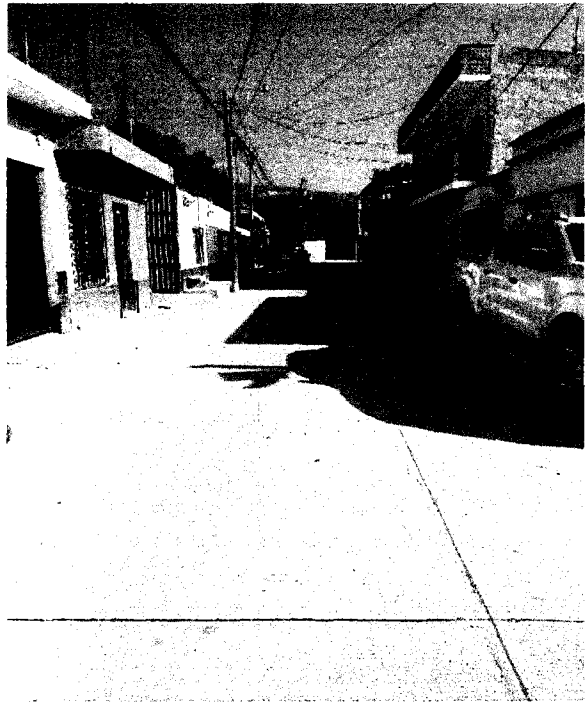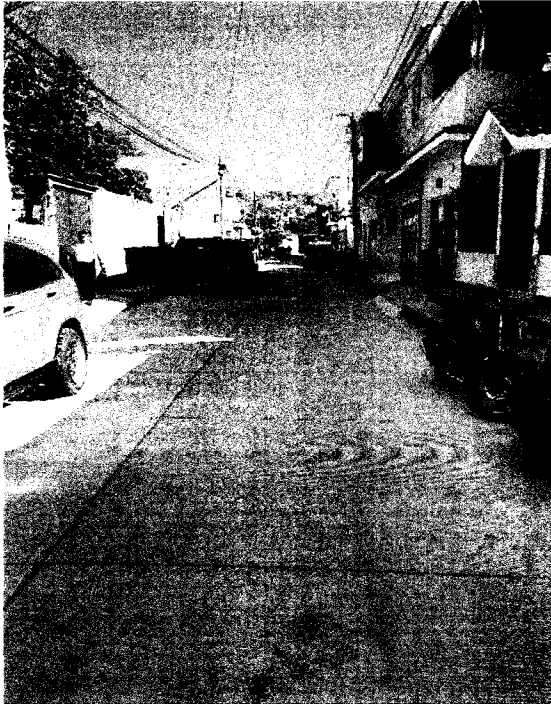



CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
— PROPIETARIO



REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR
COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"
CONTRATO No.17-2024

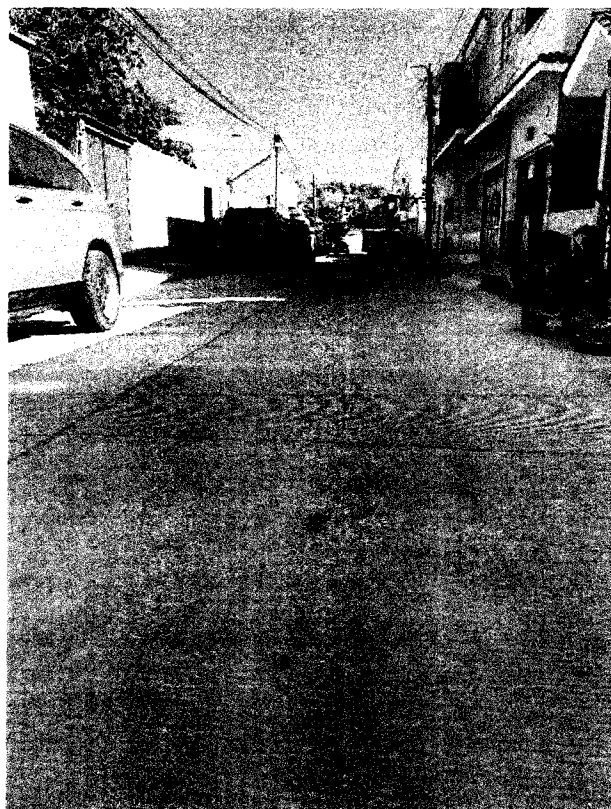



CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
PROPIETARIO



REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR
COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"
CONTRATO No.17-2024



F. 
Fernando Augusto Hernández Godoy
Propietario
CONSTRUFER

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 10 de Marzo de 2025

**SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO**

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, con número de contrato **17-2024** de fecha 20 de Septiembre de 2024, ejecutado por la empresa **CONSTRUFER**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Marzo de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **90.00 %**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.



Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

**ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO**

D.M.P.			SUPERVISION DE OBRAS			Dirección Municipal de Planificación		
Comunidad.			Contrato Municipal.					
Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso			17-2024					
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO								
Nombre del proyecto.			Ubicación del proyecto.					
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO			Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso					
CONSTRUFER			Ubicación del proyecto.					
Monto Contratado.			Avance Físico.					
Q 1,256,000.15			90.00%					
Informe de Supervisión No. 2			Fecha. 10 de Marzo de 2025					
2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO								
No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %	
1	ALCANTARILLADO SANITARIO							
1.1	Excavación para alcantarillado y acometidas domiciliars	-	m3	Q 241.08	Q -	Q 37,608.48	100%	
1.2	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado (Ø=15" ASTM F949)	28.58	m	Q 1,117.55	Q 31,939.58	Q 162,044.75	100%	
1.3	Instalación de acometidas domiciliars	-	Unidad	Q 3,422.61	Q -	Q 61,606.98	100%	
1.4	Relleno de alcantarillado y acometidas domiciliars	-	m3	Q 165.61	Q -	Q 38,090.30	100%	
1.5	Pozos de visita de alcantarillado sanitario con profundidad entre 1.20 m y 2.50 m	-	Unidad	Q 26,679.25	Q -	Q 53,358.50	100%	
2	ALCANTARILLADO PLUVIAL							
2.1	Excavación para alcantarillado pluvial	-	m3	Q 245.90	Q -	Q 29,016.20	100%	
2.2	Suministro e instalacion de tubería para alcantarillado pluvial (Ø=30")	45.00	m	Q 1,350.66	Q 60,779.70	Q 195,845.70	100%	
2.3	Relleno compactado	-	m	Q 176.18	Q -	Q 26,955.54	100%	
2.4	Caja Union	1.00	Unidad	Q 12,593.40	Q 12,593.40	Q 12,593.40	100%	
2.5	Caja reunidora + rejilla	1.00	Unidad	Q 82,386.35	Q 82,386.35	Q 82,386.35	100%	
3	ADOQUINADO							
3.1	Retiro de carpeta de adoquín existente	-	m2	Q 80.20	Q -	Q 78,515.80	100%	
3.2	Corte de cajuela (t=0.25 m)	244.00	m3	Q 156.91	Q 38,286.04	Q 38,286.04	100%	
3.3	Reacondicionamiento de subrasante	979.00	m2	Q 45.55	Q 44,593.45	Q 44,593.45	100%	
3.4	Base de material granular (t=0.10 m)	97.00	m3	Q 302.75	Q 29,366.75	Q 29,366.75	100%	
3.5	Adoquin de concreto	46.00	m2	Q 250.53	Q 11,524.38	Q 11,524.38	5%	
3.6	Llaves de confinamiento de concreto	-	m	Q 217.40	Q -	Q -	0%	
3.7	Bordillo prefabricado	-	m	Q 246.78	Q -	Q -	0%	
3.8	Señalización horizontal y vertical	-	m	Q 192.07	Q -	Q -	0%	
3.9	Limpieza general	-	Unidad	Q 3,827.67	Q -	Q -	0%	
4	PAVIMENTO							
4.1	Fundicion de pavimento de 0.15m	429.75	m2	Q 532.00	Q 228,627.00	Q 228,627.00	91%	
					Q 540,096.65	Q 1,130,419.62	90.00%	
Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del 90.00% por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente								
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.								
Este proyecto consiste en la ampliacion del sistema de drenaje pluvial en el area de la colonia hichos, en el barrio el porvenir, de la cabecera municipal de guastatoya, para poder eliminar el problema de las inundaciones en epoca de lluvia								
4. RECOMENDACIONES.								
Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun								
SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.								
Jose E. Alexander Aguilar Mejia Ingeniero Civil Colegiado No. 9,366 ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES ALCALD JOSE ELIAS HERRERA GUERRA ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA								

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO		
Nombre del proyecto. AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Ubicación del proyecto. Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso	
2. INFORME FOTOGRAFICO.		
		
SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.		ALCALDE
 Jose F. Alexander Aguilar Mejía Ingeniero Civil Colegiado No. 9.366 ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES		 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Nombre del Proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Departamento: EL PROGRESO

Municipio: GUASTATOYA

Comunidad: CABECERA MUNICIPAL

Fecha de Inicio: 16/10/2024

Fecha de Contrato: 20/09/2024

Fecha de Supervisión: 07/11/2024

Fecha de Finalización: 15/06/2025

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Contrato No.: 17-2024

Valor del Proyecto: Q.1,256,000.15

Valor Original: Q.1,256,000.15

Modificaciones:

Telefono:

Construtora: CONSTRUFER

Representante legal: FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY

RESUMEN DE RENGLOS																			
No.	DESCRIPCION	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO		ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO		ORDEN DE TRABAJO EXTRA		RENGLON MODIFICADO		CANTIDADES EJECUTADAS SEGUNDA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE	
		CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL				
1	ALCANTARILLADO SANITARIO																	TOTAL	
1.1	Excavación para alcantarillado y acometidas domiciliars	136.00	m³	Q. 241.08	Q. 32,608.48								136.00	-	Q. -	136.00	Q. 32,608.48	2.99%	
1.2	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado (Ø=15" ASTM 1549)	145.00	m	Q. 1,117.55	Q. 162,044.75								145.00	283.8	Q. 31,919.58	145.00	Q. 162,044.75	12.90%	
1.3	Instalación de acometidas domiciliars	18.00	Unidad	Q. 3,422.61	Q. 61,606.98								18.00	-	Q. -	18.00	Q. 61,606.98	4.91%	
1.4	Reboso de alcantarillado y acometidas domiciliars	230.00	m³	Q. 165.61	Q. 38,090.30								230.00	-	Q. -	230.00	Q. 38,090.30	3.03%	
1.5	Pozos de visita de alcantarillado sanitario con profundidad entre 1.20 m y 2.50 m	2.00	Unidad	Q. 26,679.25	Q. 53,358.50								2.00	-	Q. -	2.00	Q. 53,358.50	4.25%	
2	ALCANTARILLADO PLUVIAL																		
2.1	Excavación para alcantarillado pluvial	118.00	m³	Q. 245.90	Q. 29,016.20								118.00	-	Q. -	118.00	Q. 29,016.20	2.11%	
2.2	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado pluvial (Ø=30")	145.00	m	Q. 1,350.66	Q. 195,845.70								145.00	45.00	Q. 60,279.70	145.00	Q. 195,845.70	15.59%	
2.3	Reboso compartido	133.00	m	Q. 176.18	Q. 26,955.54								133.00	-	Q. -	133.00	Q. 26,955.54	2.15%	
2.4	Caja Unión	1.00	Unidad	Q. 12,593.40	Q. 12,593.40								1.00	1.00	Q. 12,593.40	1.00	Q. 12,593.40	1.00%	
2.5	Caja sonda + rejilla	1.00	Unidad	Q. 82,386.35	Q. 82,386.35								1.00	1.00	Q. 82,386.35	1.00	Q. 82,386.35	6.56%	
3	ADOQUINADO																		
3.1	Reboso de carpeta de adoquín existente	979.00	m²	Q. 80.20	Q. 78,515.80								979.00	-	Q. -	979.00	Q. 78,515.80	6.25%	
3.2	Corte de carpeta (1=0.25 m)	244.00	m³	Q. 156.91	Q. 38,286.04								244.00	244.00	Q. 38,286.04	244.00	Q. 38,286.04	3.05%	
3.3	Recondicionamiento de subyacente	979.00	m²	Q. 45.55	Q. 44,593.45								979.00	979.00	Q. 44,593.45	979.00	Q. 44,593.45	3.55%	
3.4	Base de material granular (1=0.10 m)	97.00	m³	Q. 302.75	Q. 29,366.75								97.00	97.00	Q. 29,366.75	97.00	Q. 29,366.75	2.34%	
3.5	Adoquín de concreto	979.00	m²	Q. 250.53	Q. 245,288.87	933.00							46.00	46.00	Q. 11,524.38	46.00	Q. 11,524.38	0.92%	
3.6	Llaves de confinamiento de concreto	166.00	m	Q. 217.40	Q. 36,088.40	80.00							86.00	-	Q. -	-	-	0.00%	
3.7	Bordillo prefabricado	240.00	m	Q. 246.78	Q. 59,227.20								240.00	-	Q. -	-	-	0.00%	
3.8	Señalización horizontal y vertical	111.00	m	Q. 192.07	Q. 21,319.77								111.00	-	Q. -	-	-	0.00%	
3.9	Limpieza general	1.00	Unidad	Q. 3,827.67	Q. 3,827.67								1.00	-	Q. -	-	-	0.00%	
4	PAVIMENTO																		
4.1	Fundición de pavimento de 0.15m	472.10	m²	Q. 532.00	Q. 251,157.20								472.10	472.10	Q. 251,157.20	472.10	Q. 251,157.20	18.10%	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO																Q. 1,256,000.15			
														Q. 540,096.65	Q. 1,130,419.82	90.00%			

VALOR DE ESTIMACION N.º 2	Q. 540,096.65
AMORTIZACION DEL ANTEPROYECTO	Q. 108,019.33
PENDIENTE DE AMORTIZACION	Q. 25,116.11
LUCRO A RECORRER	Q. 432,077.32

José F. Alexander Aguilar Mejía

Ingeniero Civil

Colegiado No. 8,366

JOSÉ F. ALEXANDER AGUILAR MEJÍA

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3170/10/2024

CONTRATO No. 17-2024

NOMBRE: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL
PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	9
FECHA	08/05/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	El proyecto se encuentra en fase de terminación
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA









BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3170/10/2024

CONTRATO No. 17-2024

NOMBRE: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL
PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	9
FECHA	08/05/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	El proyecto se encuentra en fase de terminación
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA









LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,


CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **QUINTO** del acta **37-2025** de fecha diecinueve de mayo de dos mil veinticinco del libro número 3,539 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

QUINTO: La Secretaria Municipal informa al Concejo Municipal que, Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de Planificación, presenta oficio Ref.agmo/DMP/200-2025, de fecha 19 de mayo de 2025, el cual en su parte conducente expone: "El motivo de la presente es para informarle que el proyecto **AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. Contrato administrativo número 17-2024 de fecha 20 de septiembre de 2024, ejecutado por la empresa **CONSTRUFER**, presentó informe del 90% de avance físico. solicito que apruebe el pago del 90% de avance físico del proyecto antes mencionado a la empresa **CONSTRUFER** siendo su propietario el señor **FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY**. " Consiguientemente y en cumplimiento al numeral 1) de la Cláusula Cuarta del contrato en referencia, presenta el informe de supervisión signado por el ingeniero **JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA**, Supervisor de Obras Municipales, por medio del cual informa de la estimación, del avance físico del referido proyecto, indicando que se encuentra en un avance físico del 90%, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación. **CONSIDERANDO:** Que el artículo 59 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, establece: "Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas." **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 35 literal a), del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas establece: Atribuciones Generales del Concejo Municipal "son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales...". **POR TANTO:** El Concejo Municipal, con fundamento en lo considerado y las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, **UNANIMIDAD DE VOTOS. ACUERDA:** I) Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente de mérito. II) **APROBAR**, el pago equivalente al avance físico del 90%, a favor de la empresa mercantil **CONSTRUFER**, propiedad del señor **FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY** de conformidad con el monto de estimación de avance físico, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación, presentados por el Supervisor de Obras Municipales del proyecto "**AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**", el que se ejecuta con el contrato 17-2024. III) Se le ordena al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, hacer las operaciones contables correspondientes y proceder al pago de conformidad con lo aprobado en el numeral romano II) del presente punto resolutivo. IV) Notifíquese.

(Fs) Illegibles José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loatza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Hernán Archila Morales, Erasmo Belletón Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Almée Estrada Ortiz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A VEINTE DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO.



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!
LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN
SECRETARIA MUNICIPAL



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL
UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3170/10/2024	
No. CONTRATO	17-2024
FECHA CONTRATO	28/09/2024
MONTO CONTRACTUAL	1,256,000.15
N06	23630598
NOMBRE DEL PROYECTO	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOEL AMADO ORELLANA
EMPRESA EJECUTORA	FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 01/10/2024

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3170/10/2024

CONTRATO No. 17-2024

NOMBRE: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA




REGISTRO No.	1
FECHA	15/11/2024
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	BITACORA DE INICIO DE PROYECTO se adjunta acta de inicio no 16-2024 para hacer constar el inicio de los trabajos a realizar en el proyecto AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS

Nº 0166



ACTA DE INICIO NO. 16-2024

PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. IDENTIFICADO CON NOG. 23630590, EN GUATECOMPRAS.

En el Municipio de Guastatoya, Departamento El Progreso, siendo las nueve horas en punto del día jueves dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro, reunidos en el área donde se va a ejecutar el Proyecto **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Los señores: José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales; Fernando Augusto Hernández Godoy, Representante Legal de la Empresa Constructora; Ing. Joel Amado Orellana, Supervisor Residente del Proyecto; Lic. Alexis Geovanny Marroquin Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** Se facciona la presente acta para dejar constancia de Inicio del Proyecto: **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** El cual será ejecutado con fondos provenientes del aporte constitucional para la inversión del ejercicio fiscal 2,024; por un Valor de Un Millón Doscientos Cincuenta y Seis Mil Quetzales con Quince Centavos (Q. 1,256,000.15), con un plazo de ocho meses calendario el cual, por adjudicación en los procesos y requisitos de GUATECOMPRAS, lo ejecutará la empresa **CONSTRUFER**, Habiendo sido publicado en el Sistema de Guatecompras la adjudicación bajo el NOG-23630590, Según Contrato Administrativo No. 17-2024 de fecha veinte de septiembre del dos mil veinticuatro. **SEGUNDO:** Los señores anteriormente mencionados declaran iniciados los trabajos, los cuales se realizarán con base a planos y especificaciones elaboradas para el presente proyecto y de acuerdo al contrato respectivo. **TERCERO:** El Señor Alcalde Municipal recomienda al representante de la empresa constructora, al supervisor residente de la empresa y supervisor de obras municipales que los trabajos sean ejecutados en base al diseño y especificaciones propias de este proyecto y presentar los avances del mismo para el pago respectivo con la documentación de soporte. **CUARTO:** No habiendo más que agregar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha media hora después de su inicio. Leída se acepta, ratifica y firma por los que en ella intervinimos Damos fe.

José Elías Herrera Guerra
Alcalde Municipal

Lic Alexis Geovanny Marroquin Orellana
Director
Dirección Municipal de Planificación

Fernando Augusto Hernández Godoy
Representante de la empresa

Ing. Joel Amado Orellana
Supervisor Residente

Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipales

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3170/10/2024

CONTRATO No. 17-2024

NOMBRE: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL
PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	2
FECHA	18/11/2024
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	DURANTE EL DIA 07 DE NOVIEMBRE, SE REALIZA VISITA DE CAMPO PARA VER EL AVANCE DEL PROYECTO, EL CUAL TIENE UN AVANCE DEL 47%
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA

SUPERVISOR MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

EMPRESA: CONSTRUFER


DESCRIPCION:

EN ESTE DIA SE PUEDEN OBSERVAR LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA, LA CUAL YA SE ENCUENTRA ENTERRADA EN VARIOS PUNTOS, SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA EXCAVANDO PARA CONTINUAR CON LA INSTALCION DE LA MISMA, ADEMAS DE QUE YA SE HA TERMINADO EL LEVANTADO DE ADOQUIN EXISTENTE, Y YA SE TIENE ENTERRADO Y COMPACTADO UNA PARTE DE LA TUBERIA.

SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO Y CON LOS MATERIALES DE CALIDAD REQUERIDA PARA EL AVANCE DEL MISMO.

SE TIENE UN AVANCE DEL 47.00% A LA FECHA.

FOTOS DE LA VISITA

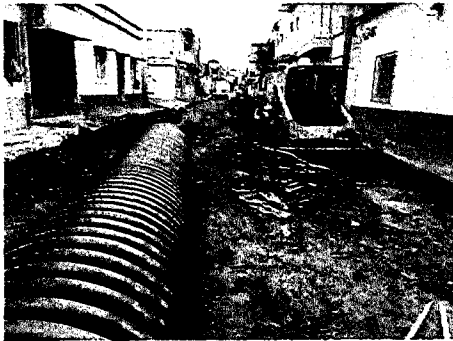

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3170/10/2024

CONTRATO No. 17-2024

NOMBRE: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL
PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	3
FECHA	09/12/2024
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	DURANTE EL DIA 09 DE DICIEMBRE, SE REALIZA VISITA DE CAMPO PARA VER EL AVANCE DEL PROYECTO, EL CUAL TIENE UN AVANCE DEL 100%
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EMPRESA: CONSTRUFER

DESCRIPCION:
EN ESTE DIA SE PUEDEN OBSERVAR LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA, LA CUAL YA SE ENCUENTRA ENTERRADA, YA SE ENCUENTRA FINALIZADO EL TRABAJO DE PAVIMENTO ASI COMO LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REJILLAS.
SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO Y CON LOS MATERIALES DE CALIDAD REQUERIDA PARA EL AVANCE DEL MISMO.
SE TIENE UN AVANCE DEL 100.00% A LA FECHA.

FOTOS DE LA VISITA



BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3170/10/2024


CONTRATO No. 17-2024

NOMBRE: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL
PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	4
FECHA	20/01/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	El proyecto se encuentra finalizado segun se puede observar
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

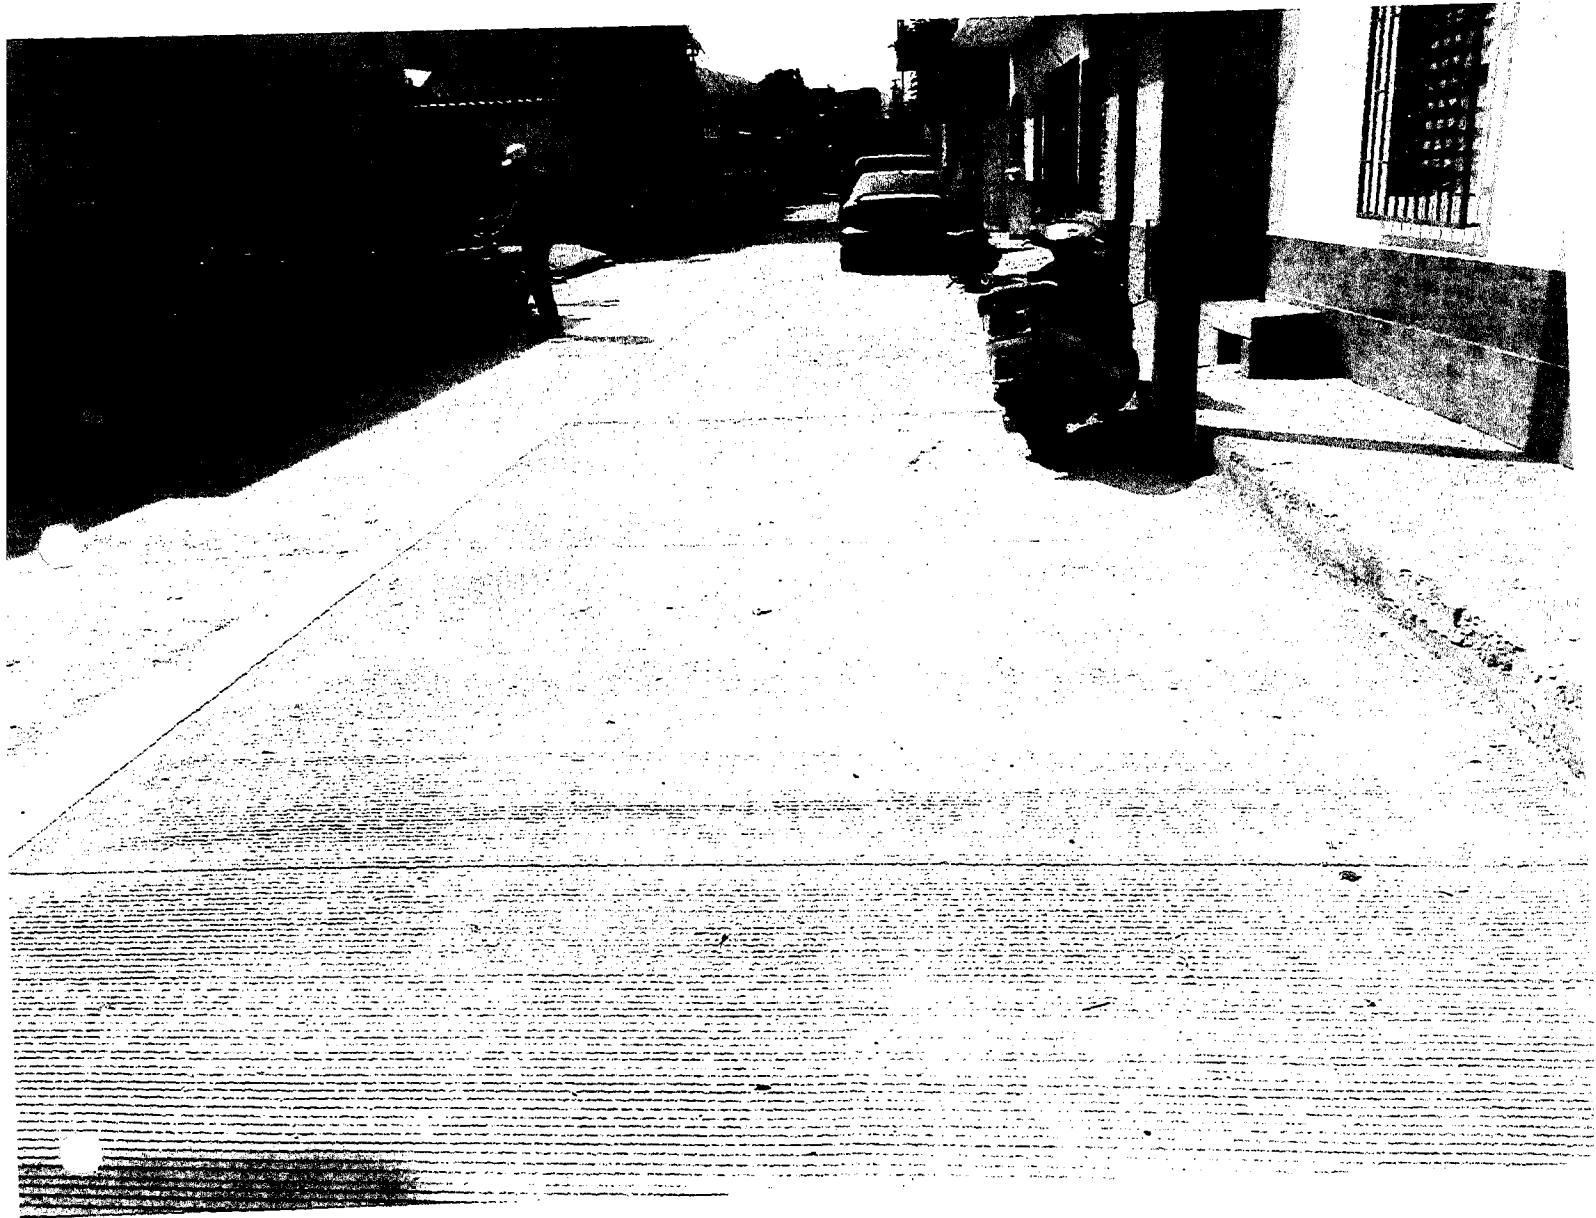









BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3170/10/2024

CONTRATO No. 17-2024

NOMBRE: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL
PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	5
FECHA	01/02/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza colocación de adoquin en banquetas, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA







BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3170/10/2024

CONTRATO No. 17-2024

NOMBRE: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL
PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	6
FECHA	12/02/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se están trabajando las banquetas, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA











BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3170/10/2024

CONTRATO No. 17-2024

NOMBRE: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL
PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	7
FECHA	10/03/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se tiene el pavimento fundido, ademas de las banquetas, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA







