





CUENTA UNICA DEL TESORO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T.
CUENTA No. 3-005-09207-3
GUATEMALA, C.A.

CHEQUE No. 79969

No. 19806019

LUGAR Y FECHA:

GUASTATOYA, 15 de MAYO del 2025

Q.

Q. 384,000.00

PAGO A LA ORDEN DE:

ORELLANA, RAMIREZ, NORMAN, ESTUARDO

SUMA DE:

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL

QUETZALES.

GT86 BRRL 0101 0000 0030 0509 2073

FIRMA

FIRMA

NO NEGOCIABLE

30000001150300509207300079969000053701

DESCRIPCION DEL PAGO			
POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 80% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO			
CUENTA No.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	NUMERO DE CHEQUE: 79969		
	CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 287		
	TRANSACCION No: 61677394		
	NIT BENEFICIARIO: 9303006		
	DE LMI. ORELLANA 1652025		
	15 de MAYO del 2025		
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME
			DIA MES AÑO
			21 05 25

Factura

NORMAN ESTUARDO, ORELLANA RAMÍREZ
Nit Emisor: 9303006
N & D CONSTRUCCIONES
COLONIA LLANOS DEL PINAL Guastatoya, EL PROGRESO,
Guastatoya
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
9B3EA41A-A64C-4C07-8BA9-169B443A279A
Serie: 9B3EA41A Número de DTE: 2790018055
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 16-may-2025 10:45:05
Fecha y hora de certificación: 16-may-2025 10:45:05
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	PAGO DEL 80% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. MONTO DE ESTIMACION Q. 480,000.00 (-) AMORTIZACION Q. 96,000.00 (=) LIQUIDO A RECIBIR Q. 384,000.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	IVA	51,428.57142 ₉
TOTALES:					0.00	0.00	480,000.00	IVA	51,428.57142 ₉

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Ejecución

Mensaje de confirmación	
13.may..2025 08:13:42	
Documentos asociados:	
1	24864986@INFORME DE SUPERVISION 80 AVANCE FISTCO PUENTE BARRIO SAN JUAN.pdf(2272 KB)
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	
	

Trescientos ochenta y cuatro mil con 00/100



SERIE
B No. 636307

DIA	FECHA	AÑO
8	5	2025

CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

DIRECCION: El Progreso

		Q.4.00	10.00	15.00	50.00	75.00	100.00	150.00			
ARBITRIOS	ORNATO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Q. _____
	VARIOS										
	LICENCIAS										
	ESTACIONAMIENTOS										
	CERTIFICACIONES										
TASAS	CEDULAS										
	MERCADOS										
	SERVICIOS VARIOS										
	SERVICIOS AGUA										
	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA										
CONTRIBUCIONES MULTAS	CONCEPTO	Pago del 80.00% segundo desembolso del									
	CONCEPTO	proyecto construccion puente vehicular barrio									Q384.000.00
	VARIOS	san Juan, Aldea Santa Rita, Guastatoya, El									
OTROS		Progreso, SNIP 340106, convenio No. 118-2024,									
		fuente 12, subprograma									

LECTURA DE CONTADOR	ACTUAL	ANTERIOR
---------------------	--------	----------

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
EL GUAYABO

BUENTA

...IDAD DE

SUB-CUENTA **ESTADO**

GUASTALATA
Civieri

TOTAL	Q.	Q384,000.00
--------------	-----------	--------------------

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR
LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE
FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL.

ORIGINAL-ENTERANTE



N&D CONSTRUCCIONES

PROPIETARIO: NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ


Guastatoya, 05 de marzo de 2025

SEÑORES
ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO

Por medio de la Presente, me dirijo a usted para informarles que el proyecto denominado: **CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, ya se encuentra a un **AVANCE FISICO DEL 80.00%** por lo que solicito se pueda emitir la supervisión necesaria para emitir informe.

Sin otro particular, de usted me suscribo

ATENTAMENTE:


NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ
PROPIETARIO
N&D CONSTRUCCIONES



LLANOS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

N&D CONSTRUCCIONES

ESTIMACION DE TRABAJO No.1



Nombre del proyecto: CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
Contrato No. 33-2024

Monto Original del Contrato: Q. 599,800.00

Renglón	RENGLONES DE TRABAJO/CANTIDADES	Cantidad Contratada				Cantidad EJECUTADA				Cantidad pendiente de EJECUTAR			
		Unidad	Cantidad	Precio	Costo total	Este	Acumulado	Q	%	Este	Q	%	
1	TRAZO Y ESTAGUEADO	M2	34.00	Q 195.00	Q 6,630.00	34.00	0.00	Q 6,630.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
2	DENOLICIÓN DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE Ø 48"	UNIDAD	4.00	Q 5,307.77	Q 21,231.08	4.00	0.00	Q 21,231.08	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
3	DENOLICIÓN DE CARPETA DE RODADURA EXISTENTE (INCLUYE RAMPA DE ACCESO, ADOQUINADO Y LOSA DE PUENTE)	M2	80.00	Q 522.40	Q 41,792.00	80.00	0.00	Q 41,792.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
4	DENOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES (INCLUYE APROCHES Y ESTRIBOS DE PUENTE)	ML	18.00	Q 3,707.60	Q 66,736.80	18.00	0.00	Q 66,736.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
5	APROCHES Y MUROS DE SALIDA	ML	41.00	Q 3,631.50	Q 148,891.50	41.00	0.00	Q 148,891.50	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
6	MUROS DE PUENTE (ESTRIBOS)	ML	11.20	Q 3,765.00	Q 42,168.00	11.20	0.00	Q 42,168.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
7	ARMADO Y FUNDICIÓN DE VIGA TIPO V-1	ML	26.80	Q 2,785.60	Q 74,654.08	26.80	0.00	Q 74,654.08	100.00%	0.00	Q -	0.00%	
8	LOSA	M2	34.00	Q 3,600.56	Q 122,419.04	21.59	0.00	Q 77,736.09	63.50%	12.41	Q 44,682.95	36.50%	
9	RAMPA DE ENTRADA Y SALIDA	M2	75.00	Q 1,003.70	Q 75,277.50	0.00	0.00	Q -	0.00%	75.00	Q 75,277.50	100.00%	
Total cantidad contratada					Q 599,800.00	Cantidad ejecutada			Q 479,839.55	80.00%			Q 119,960.45 20.00%
						Monto bruto de esta Estimación			Q 479,839.55				
						Anticipo			Q 119,960.00				
						Amortización de Anticipos 20%			Q 95,967.91				
						Monto neto de esta Estimación			Q 383,871.64				
						Menos 1er. Pago Consejo de Desarrollo							
						Menos 2do Pago Consejo de Desarrollo							
						Menos 1er. pago Municipalidad							
						Menos 2do. Pago Municipalidad							
						Menos 3er. Pago Consejo de Desarrollo							
						Menos 3er. Pago Municipalidad							
						Líquido a Recibir			Q 383,871.64				



[Signature]
NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ
N&D CONSTRUCCIONES

Vo.Bo. JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL



N&D CONSTRUCCIONES

PROPIETARIO: NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ

**CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA
RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
80.00% 05 DE MARZO DE 2025**




LLANOS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO



N&D CONSTRUCCIONES

PROPIETARIO: NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ

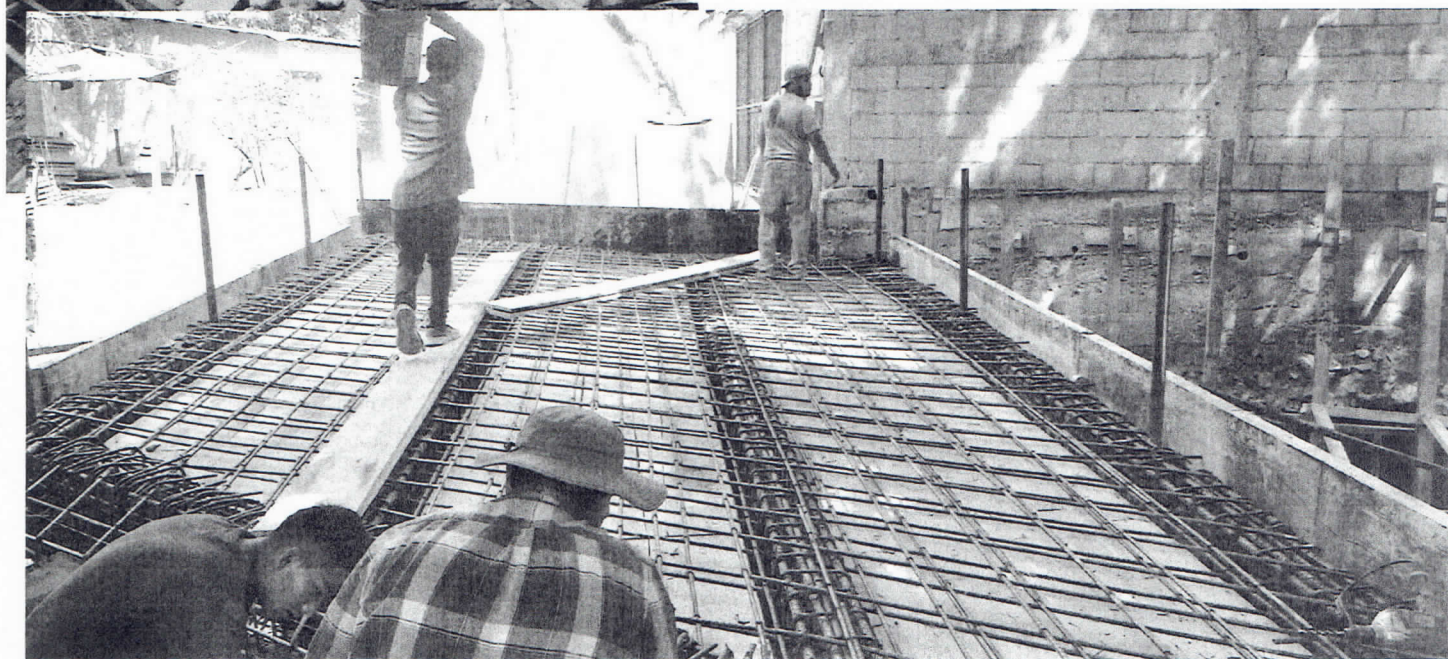

LLANOS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO



N&D CONSTRUCCIONES

PROPIETARIO: NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ



LLANOS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL
UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 461/02/2025	
No. CONTRATO	33-2024
FECHA CONTRATO	26/12/2024
MONTO CONTRACTUAL	599,800.00
NOG	24864986
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HECTOR ARNULFO ARCHILA MARROQUIN
EMPRESA EJECUTORA	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 03/02/2025

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 461/02/2025

CONTRATO No. 33-2024

NOMBRE: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO
SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL
PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	1
FECHA	11/02/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	BITACORA DE INICIO DE PROYECTO se adjunta acta de inicio no 03-2025 para hacer constar el inicio de los trabajos a realizar en el proyecto CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



Municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS

Nº 0183



ACTA DE INICIO NO. 03-2025

PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. IDENTIFICADO CON NOG. 24864986, EN GUATECOMPRAS.

En el Municipio de Guastatoya, Departamento El Progreso, siendo las ocho horas en punto del día miércoles cinco de febrero de dos mil veinticinco, reunidos en el área donde se va a ejecutar el Proyecto, **CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Los señores: José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales; Norman Estuardo Orellana Ramírez, Representante Legal de la Empresa Constructora; Arq. Héctor Arnulfo Archila Marroquín, Supervisor Residente del Proyecto; Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** Se facciona la presente acta para dejar constancia de Inicio del Proyecto: **CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** El cual será ejecutado con fondos extraordinarios provenientes del Consejo Departamental de Desarrollo para el ejercicio fiscal 2,024; por un Valor de Quinientos Noventa y Nueve Mil Quetzales Exactos (Q. 599,000.00), con un plazo de cuatro meses calendario el cual, por adjudicación en los procesos y requisitos de GUATECOMPRAS, lo ejecutará la empresa **N&D CONSTRUCCIONES**, Habiendo sido publicado en el Sistema de Guatecompras la adjudicación bajo el NOG-24864986, Según Contrato Administrativo No. 33-2024 de fecha veintiséis de diciembre del dos mil veinticuatro. **SEGUNDO:** Los señores anteriormente mencionados declaran iniciados los trabajos, los cuales se realizarán con base a planos y especificaciones elaboradas para el presente proyecto y de acuerdo al contrato respectivo. **TERCERO:** El Señor Alcalde Municipal recomienda al representante de la empresa constructora, al supervisor residente de la empresa y supervisor de obras municipales que los trabajos sean ejecutados en base al diseño y especificaciones propias de este proyecto y presentar los avances del mismo para el pago respectivo con la documentación de soporte. **CUARTO:** No habiendo más que agregar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha media hora después de su inicio. Leída se acepta, ratifica y firma por los que en ella intervinimos Damos fe. -----

José Elías Herrera Guerra
Alcalde Municipal

Lic Alexis Geovanny Marroquin Orellana
Director
Dirección Municipal de Planificación

Norman Estuardo Orellana Ramírez
Representante de la empresa

Arq. Héctor Arnulfo Archila Marroquín
Supervisor Residente

Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipales

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 10 de Marzo de 2025

**SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO**

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, con número de contrato **33-2024** de fecha 26 de Diciembre de 2024, ejecutado por la empresa **N&D CONSTRUCCIONES**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Marzo de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **80.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.





Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9766

**ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO**

D.M.P.			SUPERVISION DE OBRAS			Dirección Municipal de Planificación		
Comunidad.			Contrato Municipal.					
Aldea Santa Rita, Guastatoya, El Progreso			33-2024					
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO								
Nombre del proyecto.			Ubicación del proyecto.					
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO			Aldea Santa Rita, Guastatoya, El Progreso					
Contratista.			Ubicación del proyecto.					
N&D CONSTRUCCIONES			Aldea Santa Rita, Guastatoya, El Progreso					
Monto Contratado.			Avance Físico.					
Q 599,800.00			80.00%					
Informe de Supervisión No. 1			Fecha. 10 de Marzo de 2025					
2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO								
No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %	
1	TRAZO Y ESTAQUEADO	34.00	M2	Q 195.00	Q 6,630.00	Q 6,630.00	100%	
2	DEMOLICIÓN DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE Ø 48"	4.00	UNIDAD	Q 5,307.77	Q 21,231.08	Q 21,231.08	100%	
3	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE RODADURA EXISTENTE (INCLUYE RAMPA DE ACCESO, ADOQUINADO Y LOSA DE PUENTE)	80.00	M2	Q 522.40	Q 41,792.00	Q 41,792.00	100%	
4	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES (INCLUYE APROCHES Y ESTRIBOS DE PUENTE)	18.00	ML	Q 3,707.60	Q 66,736.80	Q 66,736.80	100%	
5	APROCHES Y MUROS DE SALIDA	41.00	ML	Q 3,631.50	Q 148,891.50	Q 148,891.50	100%	
6	MUROS DE PUENTES (ESTRIBOS)	11.20	ML	Q 3,765.00	Q 42,168.00	Q 42,168.00	100%	
7	ARMADO Y FUNDICION DE VIGA TIPO V-1	26.80	ML	Q 2,785.60	Q 74,654.08	Q 74,654.08	100%	
8	LOSA	21.59	M2	Q 3,600.56	Q 77,736.09	Q 77,736.09	64%	
9	RAMPA DE ENTRADA Y SALIDA	-	M2	Q 1,003.70	Q -	Q -	0%	
					Q 479,839.55	Q 479,839.55	80.00%	
Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del 80.00% por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente								
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.								
Este proyecto consiste en la construccion de un puente vehicular en el barrio san juan, de la aldea santa rita, este puente vendra a beneficiar a los vecinos del sector ya que se mejorara el trafico								
4. RECOMENDACIONES.								
Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun								
SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.								
Jose F. Alexander Aguilar Mejia Ing. Civil Colección 2019 ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES								

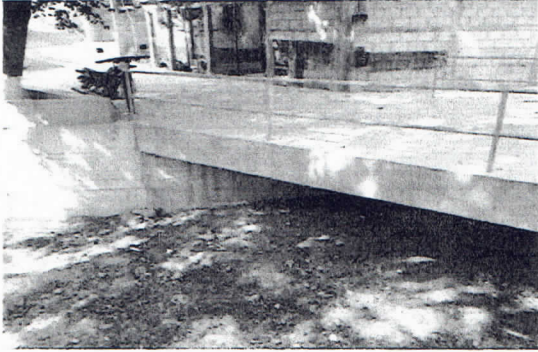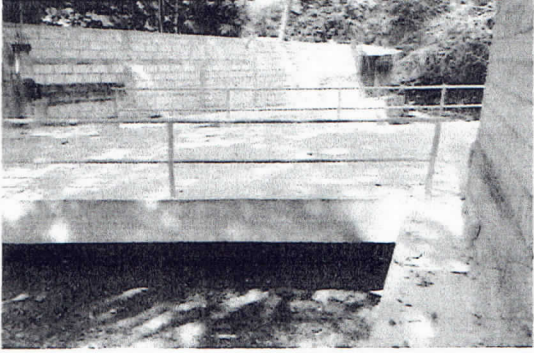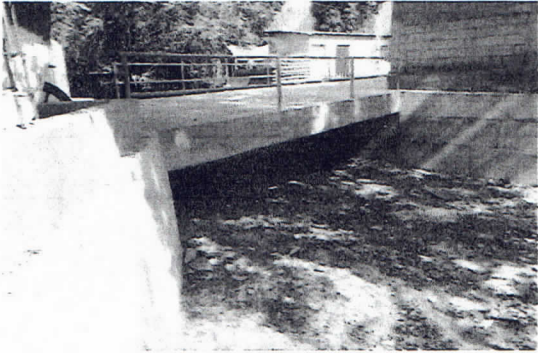D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO		
Nombre del proyecto. CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Ubicación del proyecto. Aldea Santa Rita, Guastatoya, El Progreso	
2. INFORME FOTOGRAFICO.		
		
SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.		
 ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES		

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 1

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Municipio: GUASTATOYA

Comunidad: CABECERA MUNICIPAL

Fecha de Inicio: 05/02/2025

Fecha de Finalizacion: 04/06/2025

Contrato No.: 33-2024

Modificaciones:

Construtora: N&D CONSTRUCCIONES

Representante legal: NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ

Departamento: EL PROGRESO

Fecha de Contrato: 26/12/2024

Fecha de Supervision: 10/03/2025

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Valor del Proyecto: Q.599,800.00

Valor Original: Q.599,800.00

Telefono:

RESUMEN DE RENGLONES																
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO		ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE	
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL		CANTIDAD	CANTIDAD			CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL		
1	TRAZO Y ESTACQUEADO	34.00	M2	Q 195.00	Q 6,630.00							34.00	Q 6,630.00	34.00	Q 6,630.00	1.11%
2	DEMOLICIÓN DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE Ø 48"	4.00	UNIDAD	Q 5,307.77	Q 21,231.08							4.00	Q 21,231.08	4.00	Q 21,231.08	3.54%
3	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE RODADURA EXISTENTE (INCLUYE RAMPA DE ACCESO, ADOQUINADO Y LOSA DE PUENTE)	80.00	M2	Q 522.40	Q 41,792.00							80.00	Q 41,792.00	80.00	Q 41,792.00	6.97%
4	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES (INCLUYE APROCHES Y ESTRIBOS DE PUENTE)	18.00	ML	Q 3,707.60	Q 66,736.80							18.00	Q 66,736.80	18.00	Q 66,736.80	11.13%
5	APROCHES Y MUROS DE SALIDA	41.00	ML	Q 3,631.50	Q 148,891.50							41.00	Q 148,891.50	41.00	Q 148,891.50	24.82%
6	MUROS DE PUENTES (ESTRIBOS)	11.20	ML	Q 3,765.00	Q 42,168.00							11.20	Q 42,168.00	11.20	Q 42,168.00	7.03%
7	ARMADO Y FUNDICION DE VIGA TIPO V-1	26.80	ML	Q 2,785.60	Q 74,654.08							26.80	Q 74,654.08	26.80	Q 74,654.08	12.45%
8	LOSA	34.00	M2	Q 3,600.56	Q 122,419.04							21.59	Q 77,736.09	21.59	Q 77,736.09	12.96%
9	RAMPA DE ENTRADA Y SALIDA	75.00	M2	Q 1,003.70	Q 75,277.50							-	-	-	-	0.00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					Q 599,800.00							Q 479,839.55		Q 479,839.55		80.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q 479,839.55
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q 95,967.91
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q 23,992.09
LIQUIDO A RECIBIR	Q 383,871.64

José E. Alexander Aguilar Mejía

Ingeniero Civil

Ced. No. 66679-03

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 461/02/2025


CONTRATO No. 33-2024

NOMBRE: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO
SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL
PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA





REGISTRO No.	2
FECHA	10/03/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se observa la fundición del puente, ademas de los muros de contención, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

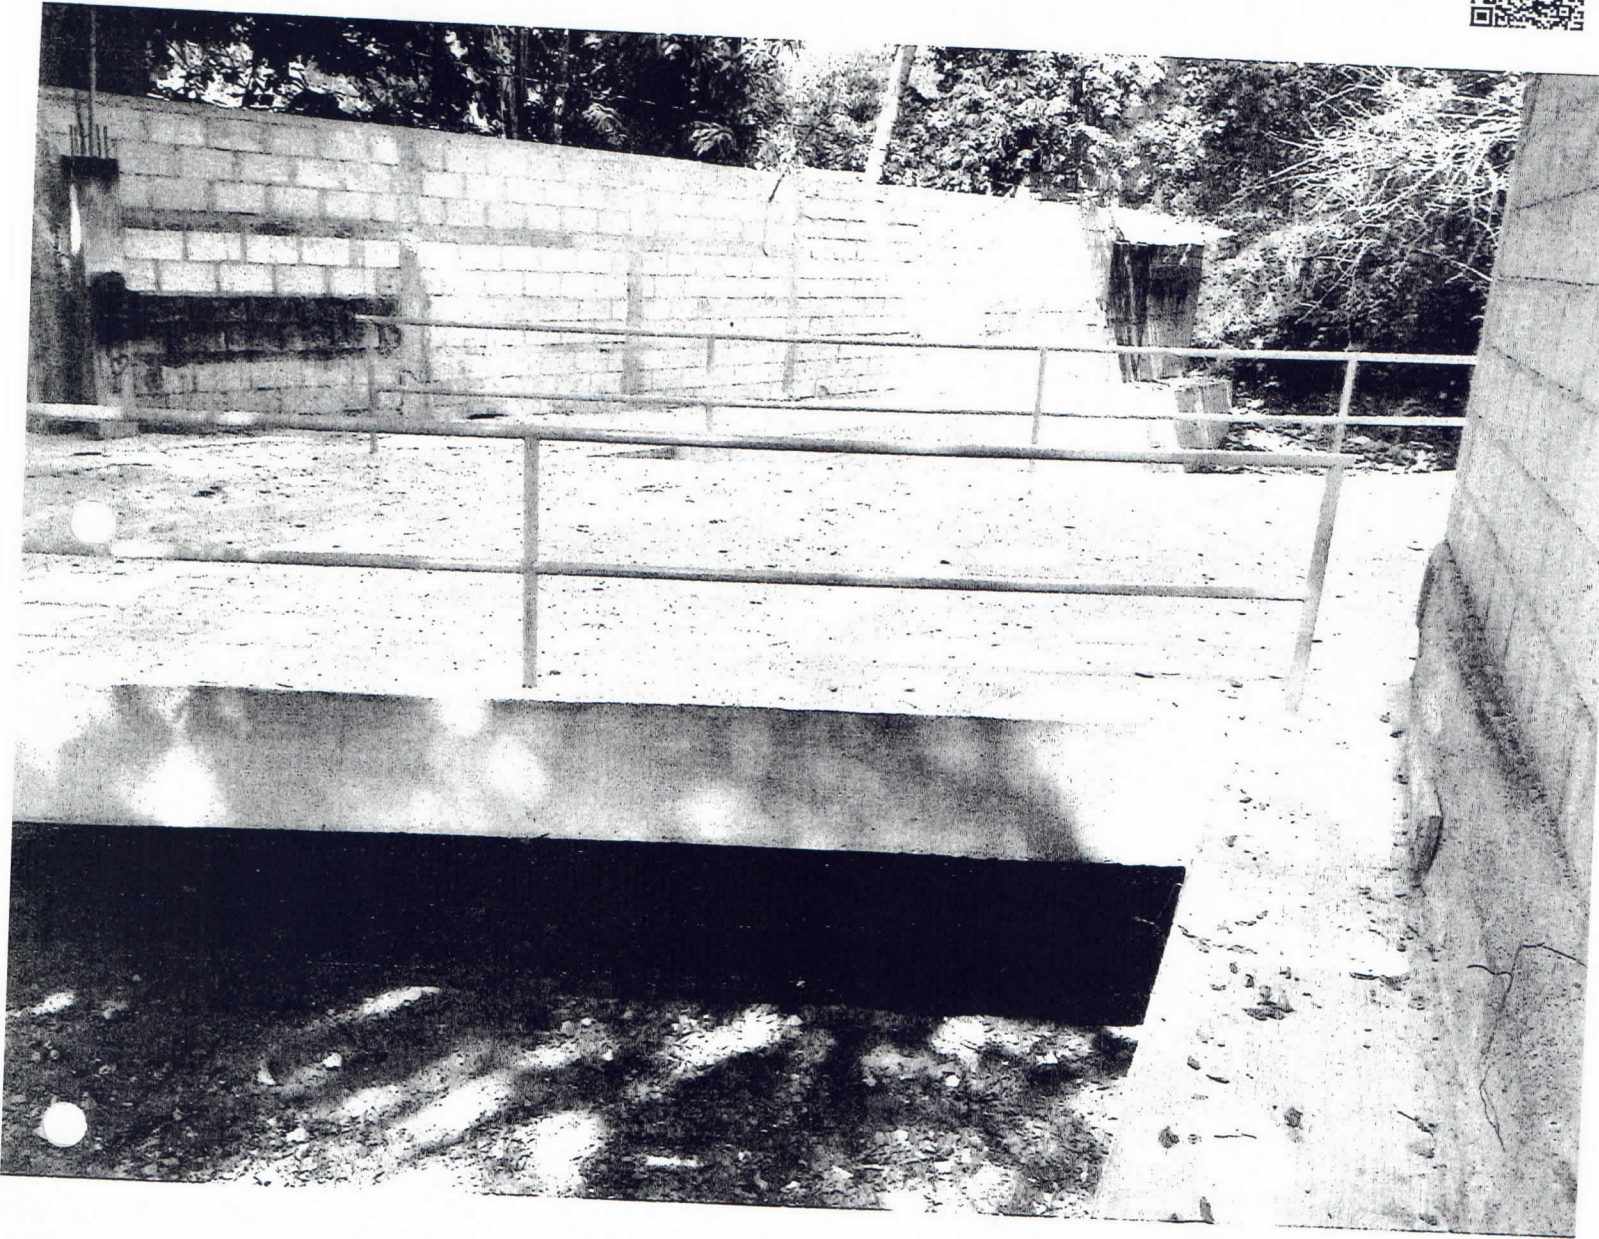



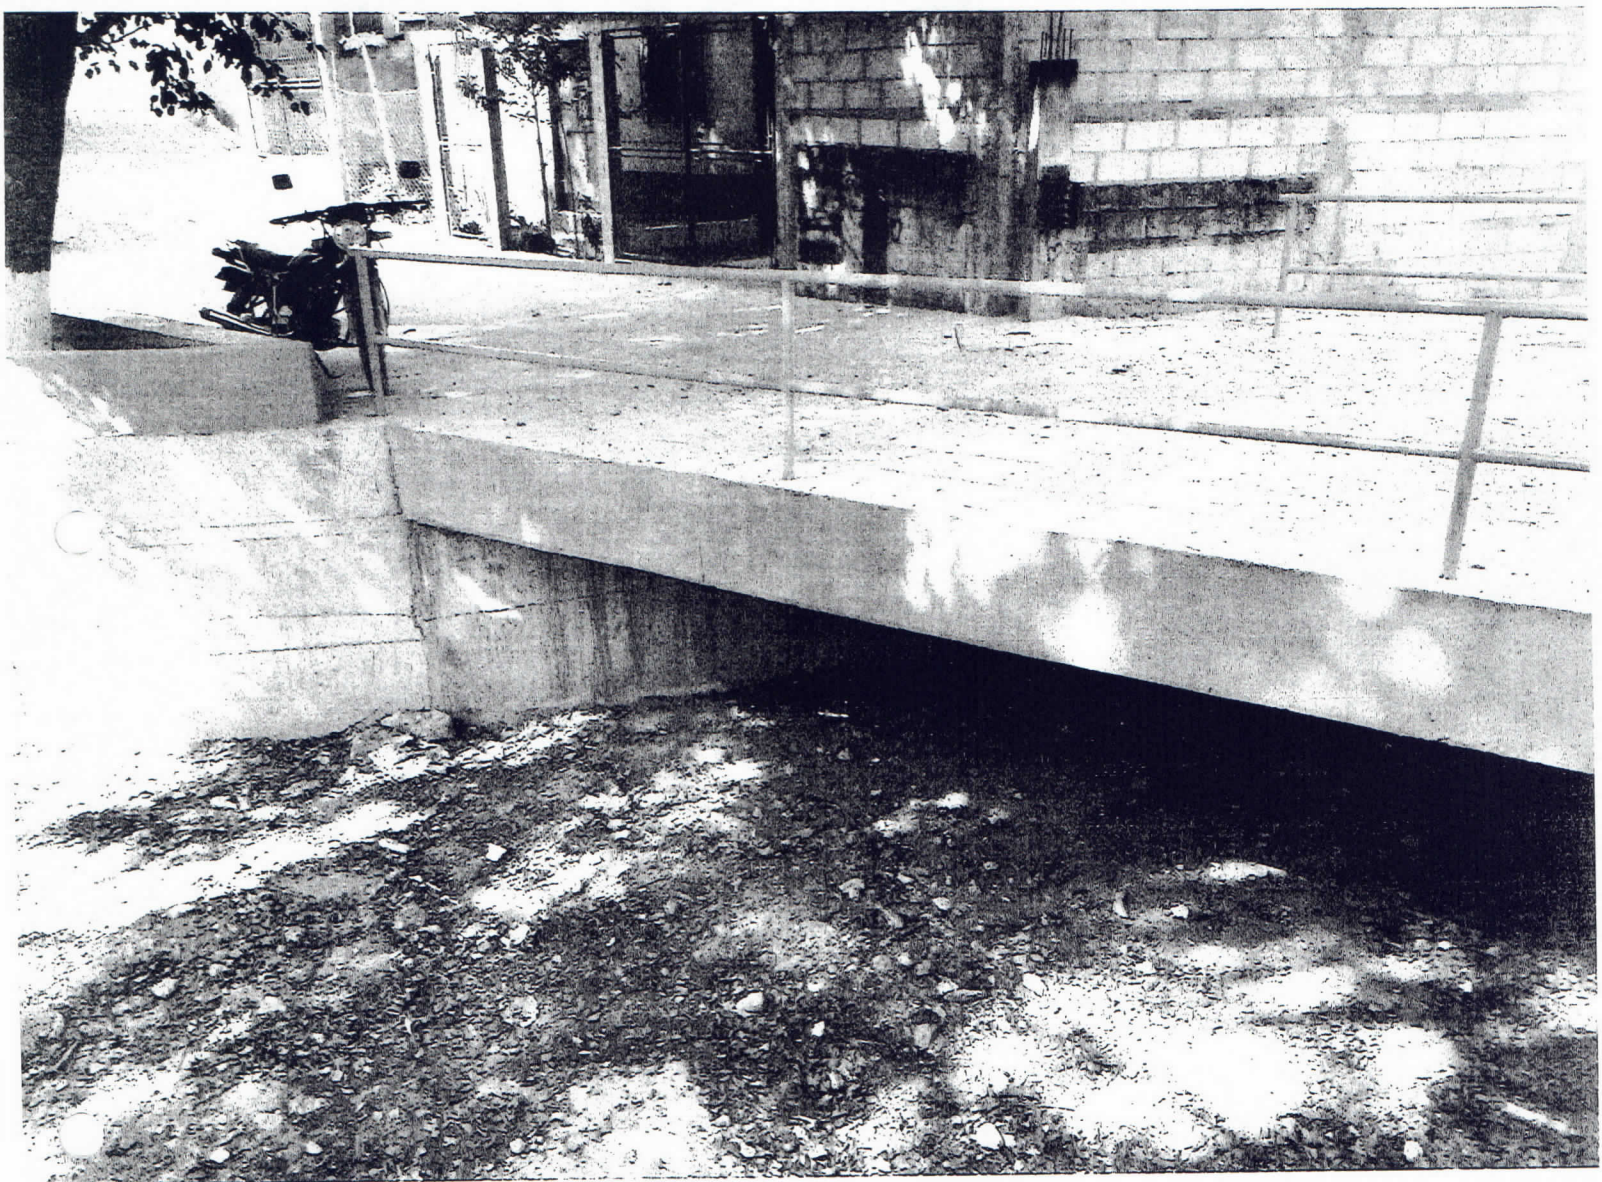

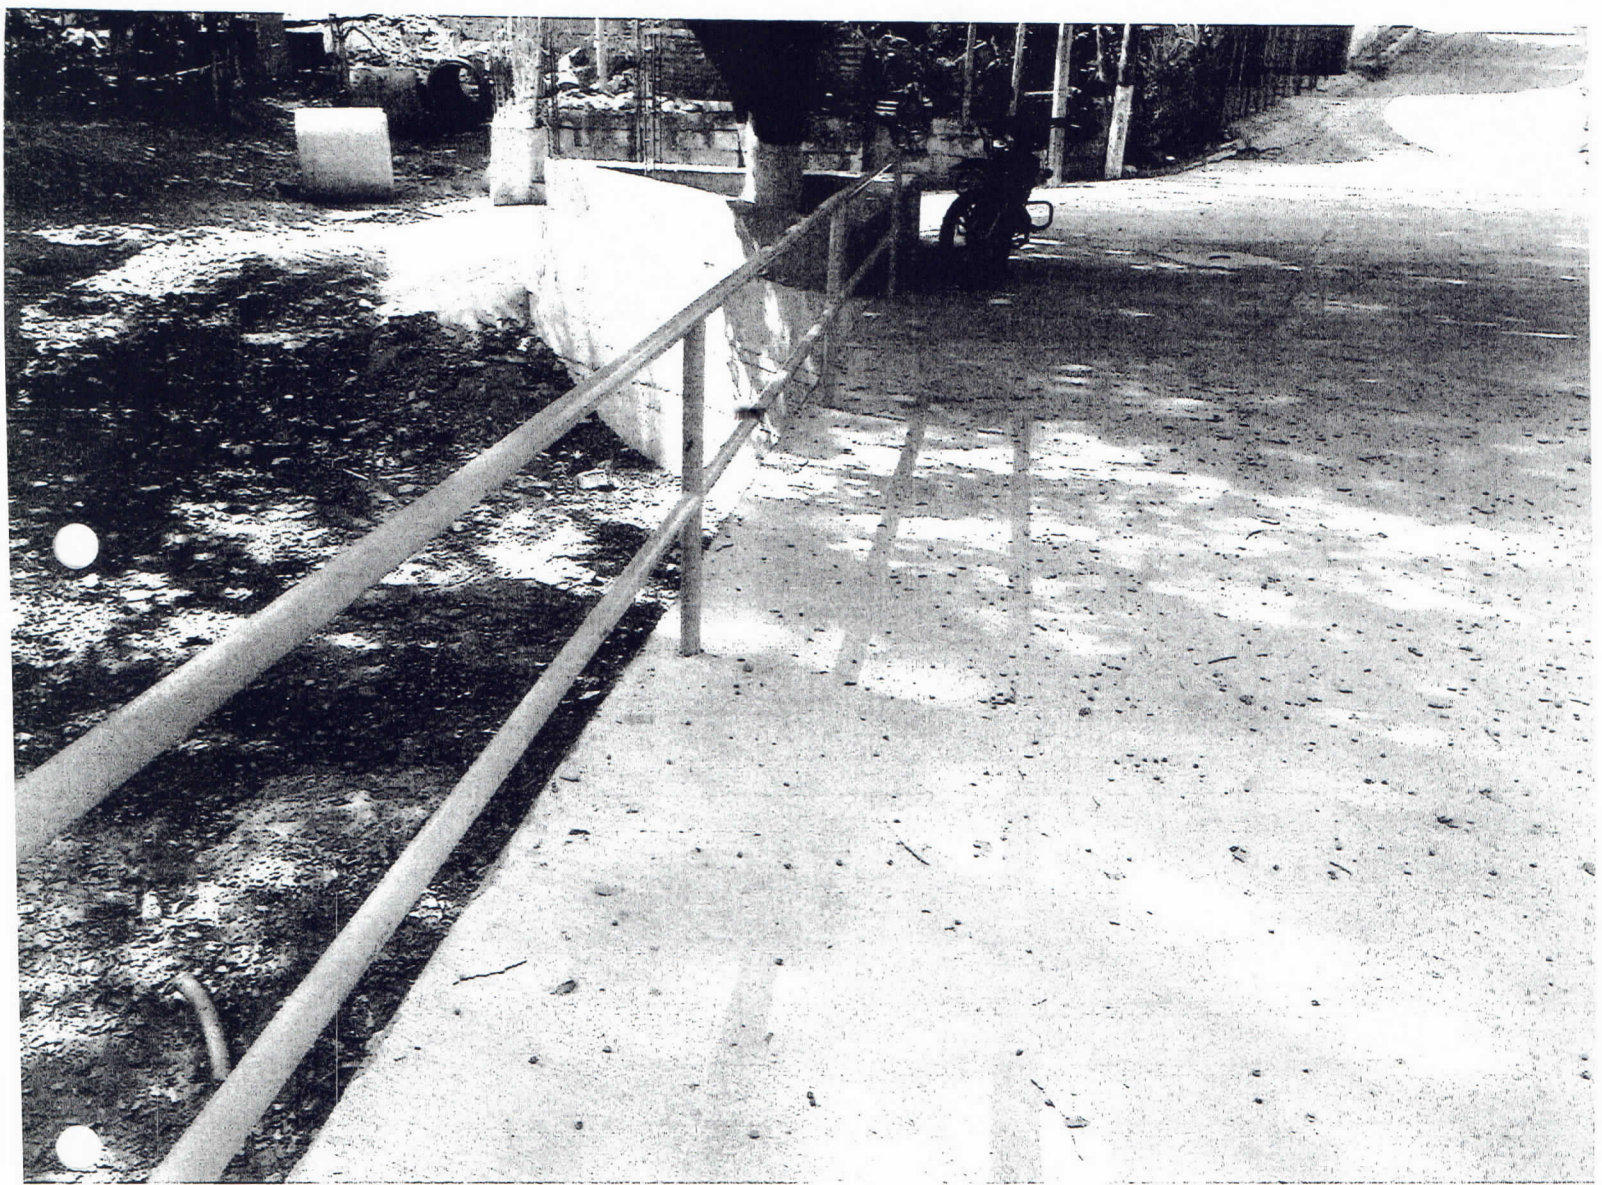

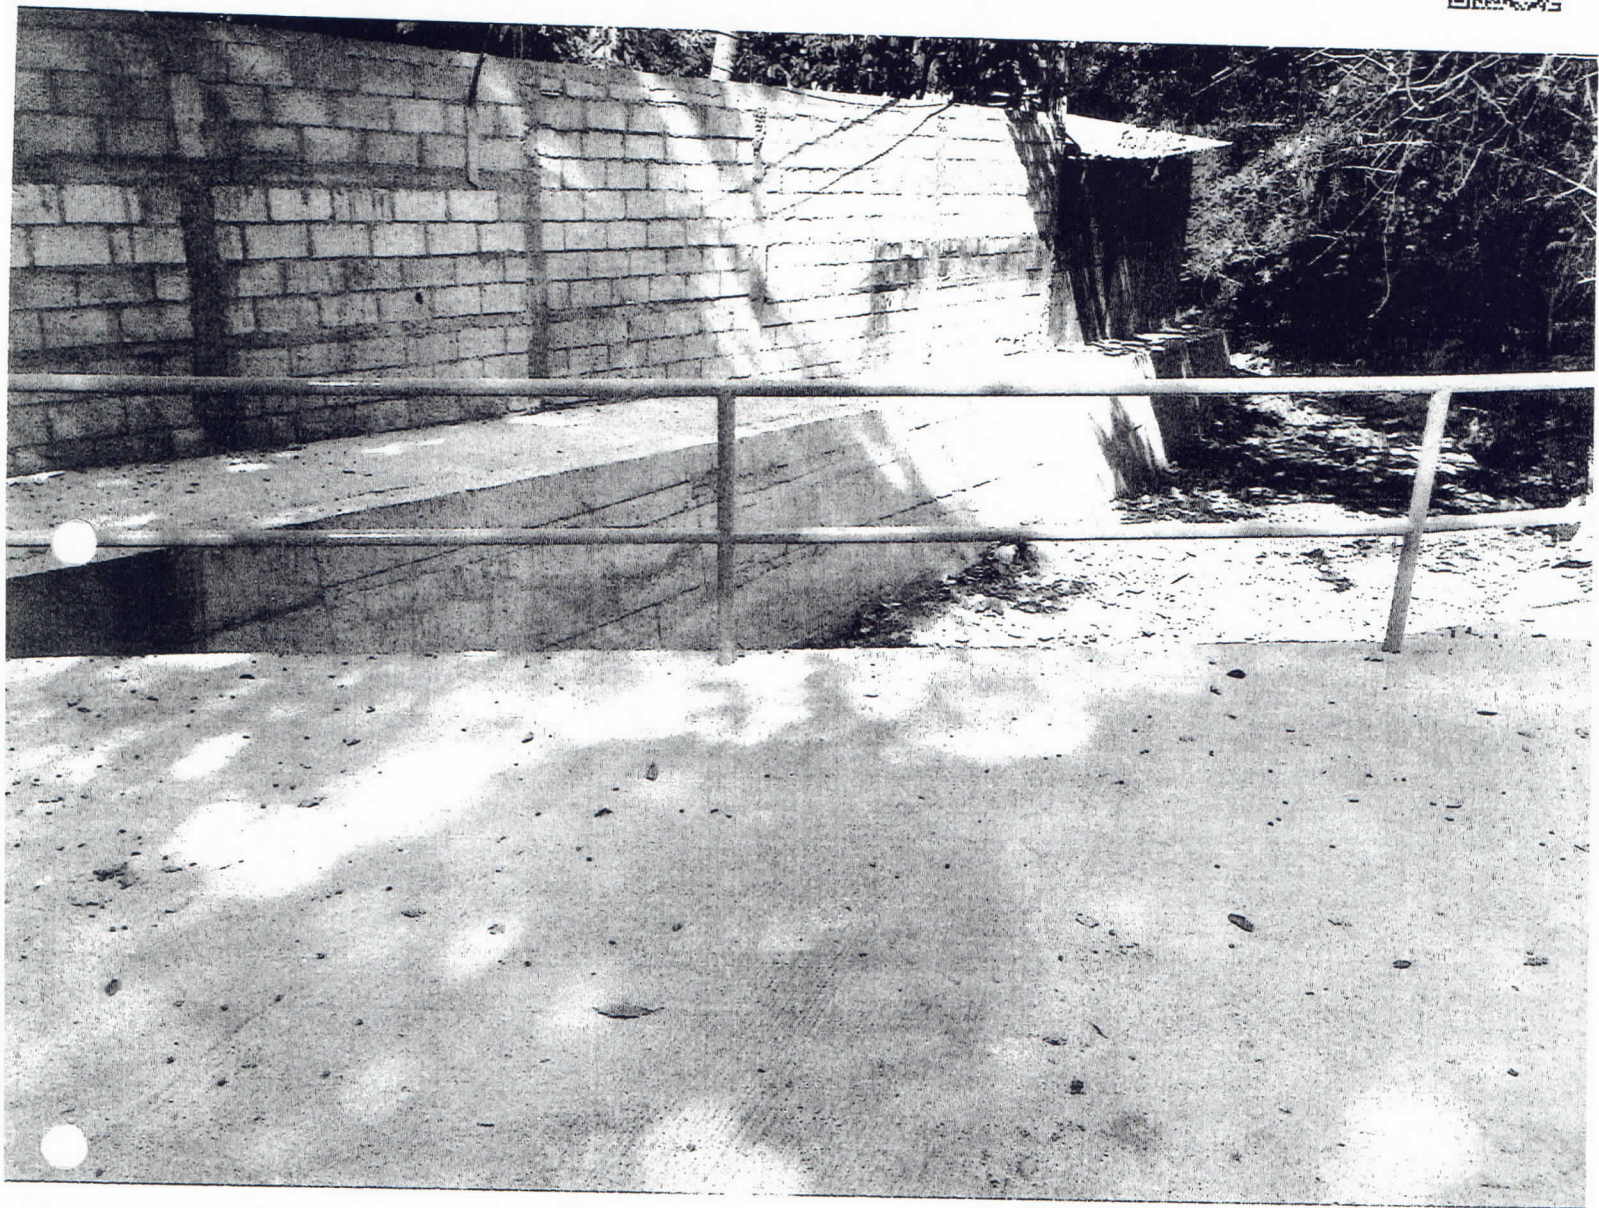



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

¡Sirviendo!

5980-0535

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

LA INFRASCrita SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

CERTIFICA

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe EL ACUERDO MUNICIPAL No. 049-2025 de fecha treinta de abril de dos mil veinticinco del libro número 3,211 de la Alcaldía Municipal, Libro de Acuerdos, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

ACUERDO MUNICIPAL 049-2025

Guastatoya, 30 de Abril de 2,025

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

La Autoridad Administrativa Superior

Se tiene a la vista la solicitud presentada por Norman Estuardo Orellana Ramírez propietario de la empresa **N&D CONSTRUCCIONES**, en la cual manifiesta que el proyecto denominado **"CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 33-2024, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro; y que el proyecto en referencia se encuentra en un avance físico del 80.00%, en consecuencia solicitan el pago de conformidad con la cláusula cuarta numeral 2) del contrato administrativo de obras. Consecuentemente se encuentra el informe del Ingeniero Jose Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, en el cual hace constar la confirmación del avance del proyecto en referencia, por un total de 80.00% de avance físico, adjunta para el efecto la estimación.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: Estimaciones para pago. *"La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas."*

POR TANTO:

Con fundamento en los antecedentes y lo considerado, este Despacho Municipal.

RESUELVE:

- I) **APROBAR**, el pago por la cantidad de 80.00%, del proyecto **"CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 33-2024, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro; suscrito por el Alcalde Municipal y Norman Estuardo Orellana Ramirez propietario de **N&D CONSTRUCCIONES**.
- II) **SE ORDENA**, al Director de la Administración Financiera Municipal, hacer el pago correspondiente al 80.00% del monto total del proyecto.
- III) **Cumplase.** -

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA



LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUIN
SECRETARIA MUNICIPAL

GUASTATOYA
¡Sirviendo!
