



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2025

EXPEDIENTE No. 291

NOG: 25651749

CONTRATO No. 02-2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO 2,
ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte MUNICIPAL	90.00%			
Q. 124,900.00		Q. 112,410.00	Q. 22,482.00	Q. 89,410.00
21-0101-0001-0-0-2				
TOTALES		Q. 112,410.00	Q. 22,482.00	Q. 89,410.00

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Acuerdo de aprobación de avance, Copia de bitácora.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL
RECIBIDO
FECHA: 15/05/25
HORA: 14/06 p.m.

[Handwritten signature]

No. 19805932



CUENTA ÚNICA DEL TESORO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T.
CUENTA No. 3-005-09207-3
GUATEMALA, C.A.

CHEQUE No. 79882

GUASTATOYA, 15 de MAYO del 2025

\$9,928.00

LUGAR Y FECHA:

GUERRA, CALDERON, MELVIN, ARIEL

PAGO A LA ORDEN DE:

CIENTO Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

SUMA DE:

QUETZALES.

GT86 BRRL 0101 0000 0030 0509 2073

FIRMA

FIRMA

NO NEGOCIABLE

2-0000000142-3005092073-00079882-0000055335

DESCRIPCION DEL PAGO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO
SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO

CUENTA No.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	NUMERO DE CHEQUE: 79882		
	CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 291		
	TRANSACCION No: 61665224		
	NIT BENEFICIARIO: 17022932		
	DELMÍ ORELLANA1552025		
	15 de mayo del 2025		
HECHO POR:	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME
			15/05/25

Publicar el listado de Facturas de un concurso

Mensaje de confirmación

15.may..2025 14:20:38

Datos del Concurso

Entidad	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
Unidad compradora	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
NOG	25651749
Descripción	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO
Modalidad	Cotización (Art. 38 LCE)
Tipo	Público
Fecha límite para ofertar	13.mar..2025
Fecha publicación	28.feb..2025

Beneficiario Institucional	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Estatus actual	Adjudicado

Proveedor

1	(17022932) GUERRA,CALDERON,,MELVIN,ARIEL
---	--

Listado de facturas incluidas:

#1	SERIE:DA6A0CB3 NO_FACTURA:1006783821 MONTO:112410
----	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Ejecución

Mensaje de confirmación

15.may..2025 14:17:20

Documentos asociados:

1	256S1749@INFORME DE SUPERVISION 90 AVANCE FISICO CALLE EL BORDO 2.pdf(2900 KB)
---	--

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



15/05/2025 14:17:20
Municipio de Guastatoya, El Progreso
Municipio de Guastatoya, El Progreso

Factura

MELVIN ARIEL, GUERRA CALDERON
Nit Emisor: 17022932
CONSTRUCTORA SILAS
RESIDENCIAL LOS DIAMANTES APARTAMENTO A, zona 8, Santa
Catarina Pinula, GUATEMALA
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Dirección comprador: CIUDAD

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
DA6A0CB3-3C02-4D4D-8751-2E4972FB20A5
Serie: DA6A0CB3 Número de DTE: 1006783821
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 14-may-2025 15:40:58
Fecha y hora de certificación: 14-may-2025 15:40:58
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Bien	1	Por pago del 90% del proyecto denominado: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO, segun Contrato numero 02-2025, Valor estimación Q 112,410.00 (-) Amortización del Anticipo Q 22,482.00; Liquido a recibir Q 89,410.00	112,410.00	0.00	0.00	112,410.00	IVA 12,043.92857
TOTALES:					0.00	0.00	112,410.00	IVA 12,043.92857

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"



CONSTRUCTORA SILAS / NIT 1702293-2
Apartamento A, Residencial Los Diamantes, Zona 8, Santa Catarina Pinula, Guatemala
constructorasilas@gmail.com
Tel: 3041 - 7560

Guastatoya, 28 de Abril de 2025

Señores:

José Elías Herrera Guerra y Consejo Municipal
Municipalidad de Guastatoya

Estimados Señores:

Por este medio hago de su conocimiento que se ha supervisado la obra y se han cumplido los renglones contractuales que establece el contrato de obra denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, con número de contrato **02-2025**.

El avance físico de la obra es del 90.00% y se adjunta cuadro de estimación e informe fotográfico del proyecto.

Atentamente

CONSTRUCTORA
"SILAS"
Nit: 1702293-0
MELVIN ARIEL GUERRA CALDERON
PROPIETARIO
CONSTRUCTORA SILAS




CONSTRUCTORA SILAS / NIT 1702293-2
Apartamento A, Residencial Los Diamantes, Zona 8, Santa Catarina Pinula, Guatemala
constructorasilas@gmail.com
Tel: 3041 - 7560





CONSTRUCTORA SILAS / NIT 1702293-2
Apartamento A, Residencial Los Diamantes, Zona 8, Santa Catarina Pinula, Guatemala
constructorasilas@gmail.com
Tel: 3041 - 7560

INFORME FOTOGRAFICO

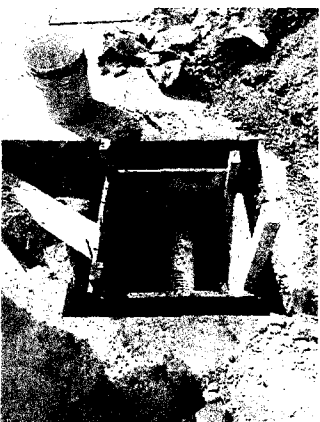



CONSTRUCTORA SILAS / NIT 1702293-2
Apartamento A, Residencial Los Diamantes, Zona 8, Santa Catarina Pinula, Guatemala
constructorasilas@gmail.com
Tel: 3041 - 7560

PRIMERA ESTIMACION
INTEGRACIÓN DEL COSTO UNITARIO

Proyecto:		RECORRIMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORRERO 3, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATUTÁ, EL PROGRESO				CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION			ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
No	COMPONENTES DEL PROYECTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO	TOTAL	CANTIDAD	COSTO		CANTIDAD ACUMULADA	COSTO ACUMULADO	
PAVIMENTO DE CONCRETO											
1.00	LIMPIEZA, TRAZO Y CHAPEO	91	M2	Q 1638.00	Q 1,638.00	91.00	Q 1,638.00		91.00	Q 1,638.00	1.31%
2.00	CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA T = 0.15 m	91	M2	Q 1465.00	Q 13,285.00	91.00	Q 13,285.00		91.00	Q 13,285.00	10.64%
3.00	BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.10M	91	M2	Q 185.00	Q 16,835.00	91.00	Q 16,835.00		91.00	Q 16,835.00	13.46%
4.00	BORDILLO	84	M	Q 280.00	Q 23,620.00	39.39	Q 11,030.00		39.39	Q 11,030.00	8.83%
5.00	FUNDICION DE PAVIMENTO DE 0.10 M	80	M2	Q 405.00	Q 32,400.00	80.00	Q 32,400.00		80.00	Q 32,400.00	25.94%
DRENAJE SANTARIO											
6.00	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA, CAJAS DE REGISTRO Y CONEXIONES DOMICILIARES	15	M3	Q 538.00	Q 8,070.00	15.00	Q 8,070.00		15.00	Q 8,070.00	8.46%
7.00	COLECTOR PRINCIPAL CON TUBERIA DE 8" PVC NORMA ASTM D3034	14	M	Q 838.00	Q 11,732.00	14.00	Q 11,732.00		14.00	Q 11,732.00	9.39%
8.00	CAJA DE REGISTRO CON TAPADERA (0.70 MTS ALTURA PROMEDIO)	2	UNIDAD	Q 5,212.00	Q 10,484.00	2.00	Q 10,484.00		2.00	Q 10,484.00	8.39%
9.00	CONEXIONES DOMICILIARES	1	UNIDAD	Q 2,426.00	Q 2,426.00	1.00	Q 2,426.00		1.00	Q 2,426.00	1.94%
10.00	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA PARA TUBERIA, CAJAS DE REGISTRO Y CONEXIONES DOMICILIARES	9	M3	Q 501.00	Q 4,509.00	9.00	Q 4,509.00		9.00	Q 4,509.00	3.61%
TOTALES DEL PROYECTO					Q 124,900.00						
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					Q 124,900.00						

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	Q 22,482.00
LIQUIDO A RECIBIR	Q 89,928.00

CONSTRUCTORA



MELVIN ARIAS GUERRA CALDERON
CONSTRUCTORA SILAS

KEVINROLANDO LOPEZ GOMEZ
ING. RESIDENTE CONSTRUCTORA SILAS

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 29 de Abril de 2025

**SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO**

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, con número de contrato **02-2025** de fecha 28 de Marzo de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA SILAS**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Abril de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **90.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.



Atentamente

Jose F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9.366

**ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO**



[illegible]

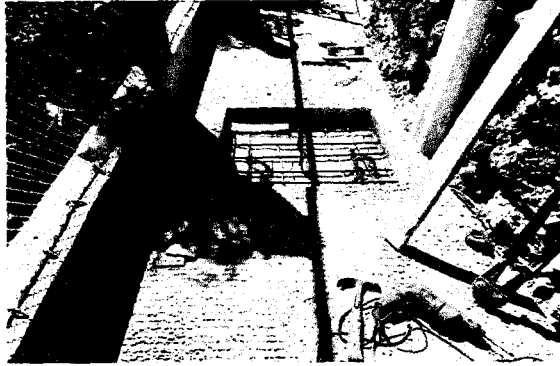D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO		
Nombre del proyecto. MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Ubicación del proyecto. Aldea El Subinal, Guastatoya, El Progreso	
2. INFORME FOTOGRAFICO.		
		
SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.		
 <i>José F. Alexander Aguilar Mejía</i> Ingeniero Civil Colegiado No. 9.366 ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES JOSE ELIAS HERRERA GUERRA ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA		

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 1									
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO									
Municipio: GUASTATOYA									
Comunidad: ALDEA EL SUBINAL									
Departamento: EL PROGRESO									
Fecha de Contrato: 28/03/2025									
Fecha de Inicio: 10/04/2025									
Fecha de Supervision: 29/04/2025									
Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA									
Fecha de Finalizacion: 09/09/2025									
Contrato No.: 02-2025									
Valor del Proyecto: Q.124,900.00									
Valor Original: Q.124,900.00									
Modificaciones:									
Constructora: CONSTRUCTORA SILAS									
Representante legal: MELVIN ARIEL GUERRA CALDERON									
Telefono:									

RESUMEN DE RENGIONES														
No.	DESCRIPCION	CANTIDADES DE TRABAJO			ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE	
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO					TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD		TOTAL
	PAVIMENTO DE CONCRETO													
1	LIMPIEZA, TRAZO Y CHAPEO	91.00	M2	Q 18.00	Q 1,638.00				91.00	Q 1,638.00	91.00	Q 1,638.00	1.31%	
2	CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA T = 0.15 m	91.00	M2	Q 146.00	Q 13,286.00				91.00	Q 13,286.00	91.00	Q 13,286.00	10.64%	
3	BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.15M	91.00	M2	Q 185.00	Q 16,835.00				91.00	Q 16,835.00	91.00	Q 16,835.00	13.48%	
4	BORDILLO	84.00	M	Q 280.00	Q 23,520.00				39.39	Q 11,030.00	39.39	Q 11,030.00	8.83%	
5	FUNDICION DE PAVIMENTO DE 0.10M	80.00	M2	Q 405.00	Q 32,400.00				80.00	Q 32,400.00	80.00	Q 32,400.00	25.94%	
	DRENAJE SANITARIO													
6	EXCAVACION DE ZANIA PARA TUBERIA, CAJAS DE REGISTRO Y CONEXIONES DOMICILIARES	15.00	M3	Q 538.00	Q 8,070.00				15.00	Q 8,070.00	15.00	Q 8,070.00	6.46%	
7	COLECTOR PRINCIPAL CON TUBERIA DE 6" PVC NORMA ASTM D3034	14.00	M	Q 838.00	Q 11,732.00				14.00	Q 11,732.00	14.00	Q 11,732.00	9.39%	
8	CAJA DE REGISTRO CON TAPADERA (0.70 MTS ALTURA PROMEDIO)	2.00	UNIDAD	Q 5,242.00	Q 10,484.00				2.00	Q 10,484.00	2.00	Q 10,484.00	8.39%	
9	CONEXIONES DOMICILIARES	1.00	UNIDAD	Q 2,426.00	Q 2,426.00				1.00	Q 2,426.00	1.00	Q 2,426.00	1.94%	
10	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANIA PARA TUBERIA, CAJAS DE REGISTRO Y CONEXIONES DOMICILIARES	9.00	M3	Q 509.00	Q 4,509.00				9.00	Q 4,509.00	9.00	Q 4,509.00	3.61%	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					Q 124,900.00					Q 112,410.00		Q 112,410.00	90.00%	

VALOR DE ESTIMACION No. 1	
AMORTIZACION DEL ANTERIO (10%)	Q 11,241.00
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q 22,482.00
LIQUIDO A RECIBIR	Q 2,498.00
	Q 85,928.00

Jose F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,356

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL
UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 1897/04/2025

No. CONTRATO	02-2025
FECHA CONTRATO	28/03/2025
MONTO CONTRACTUAL	124,900.00
NIG	25651749
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	KEVIN ROLANDO LÓPEZ GÓMEZ
EMPRESA EJECUTORA	MELVIN ARIEL GUERRA CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	MELVIN ARIEL GUERRA CALDERON
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 09/04/2025

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 1897/04/2025

CONTRATO No. 02-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO
SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL,
GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	1
FECHA	11/04/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	BITACORA DE INICIO DE PROYECTO se adjunta acta de inicio para hacer constar el inicio de los trabajos a realizar en el proyecto MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS

Nº 0188

ACTA DE INICIO NO. 08-2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO. IDENTIFICADO CON NOG. 25651749, EN GUATECOMPRAS.

En el Municipio de Guastatoya, Departamento El Progreso, siendo las ocho horas en punto del día jueves diez de abril de dos mil veinticinco, reunidos en el área donde se va a ejecutar el Proyecto, **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Los señores: José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales; Melvin Ariel Guerra Calderón, Representante Legal de la Empresa Constructora; Ing. Kevin Rolando López Gómez, Supervisor Residente del Proyecto; Lic. Alexis Geovanny Marroquin Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** Se facciona la presente acta para dejar constancia de Inicio del Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** El cual será ejecutado con fondos municipales para la inversión del ejercicio fiscal 2,025; por un Valor de Ciento Veinticuatro Mil Novecientos Quetzales Exactos (Q. 124,900.00), con un plazo de cinco meses calendario el cual, por adjudicación en los procesos y requisitos de GUATECOMPRAS, lo ejecutará la empresa **CONSTRUCTORA SILAS**, Habiendo sido publicado en el Sistema de Guatecompras la adjudicación bajo el NOG- 25651749, Según Contrato Administrativo No. 02-2025 de fecha veintiocho de marzo del dos mil veinticinco. **SEGUNDO:** Los señores anteriormente mencionados declaran iniciados los trabajos, los cuales se realizarán con base a planos y especificaciones elaboradas para el presente proyecto y de acuerdo al contrato respectivo. **TERCERO:** El Señor Alcalde Municipal recomienda al representante de la empresa constructora, al supervisor residente de la empresa y supervisor de obras municipales que los trabajos sean ejecutados en base al diseño y especificaciones propias de este proyecto y presentar los avances del mismo para el pago respectivo con la documentación de soporte. **CUARTO:** No habiendo más que agregar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha media hora después de su inicio. Leída se acepta, ratifica y firma por los que en ella intervinimos Damos fe. -----

ALCALDE
José Elías Herrera Guerra
Alcalde Municipal GUASTATOYA

Lic Alexis Geovanny Marroquin Orellana
Director
Dirección Municipal de Planificación

Melvin Ariel Guerra Calderón
Representante de la empresa

Ing. Kevin Rolando López Gómez
Supervisor Residente

Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipales

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 1897/04/2025

CONTRATO No. 02-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO
SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL,
GUASTATOYA, EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	2
FECHA	28/04/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la fundición de pavimento y la fundicion de tapaderas de drenaje, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA





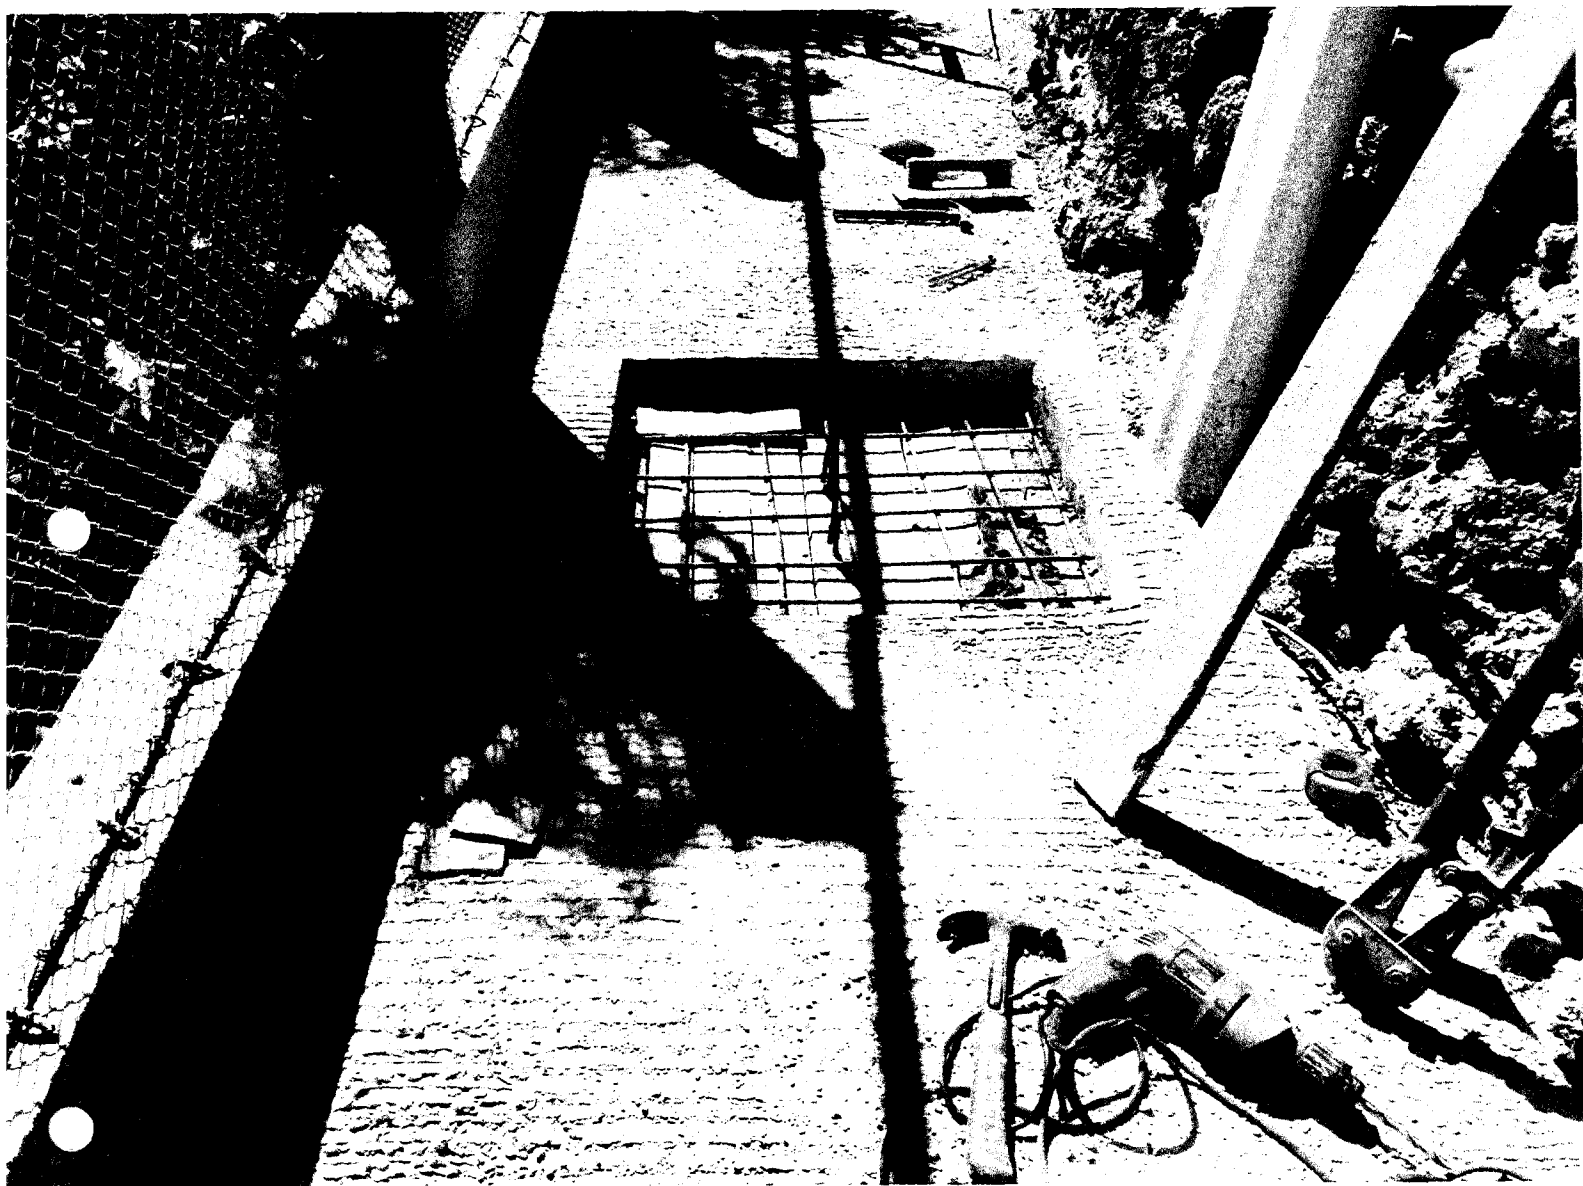





LA INFRASCrita SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

CERTIFICA

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe EL ACUERDO MUNICIPAL No. 046-2025 de fecha treinta de abril de dos mil veinticinco del libro número 3,211 de la Alcaldía Municipal, Libro de Acuerdos, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

ACUERDO MUNICIPAL 046-2025

Guastatoya, 30 de Abril de 2,025

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

La Autoridad Administrativa Superior

Se tiene a la vista la solicitud presentada por Melvin Ariel Guerra Calderon propietario de la empresa **CONSTRUCTORA SILAS**, en la cual manifiesta que el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 02-2025, de fecha veintiocho de marzo de dos mil veinticinco; y que el proyecto en referencia se encuentra en un avance físico del 90.00%, en consecuencia solicitan el pago de conformidad con la cláusula cuarta numeral 2) del contrato administrativo de obras.

Consecuentemente se encuentra el informe del Ingeniero Jose Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, en el cual hace constar la confirmación del avance del proyecto en referencia, por un total de 90.00% de avance físico, adjunta para el efecto la estimación.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: Estimaciones para pago. *"La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas."*

POR TANTO:

Con fundamento en los antecedentes y lo considerado, este Despacho Municipal.

RESUELVE:

- I) **APROBAR**, el pago por la cantidad de 90.00%, del proyecto **"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 02-2025, de fecha veintiocho de marzo de dos mil veinticinco; suscrito por el Alcalde Municipal y Melvin Ariel Guerra Calderon propietario de **CONSTRUCTORA SILAS**.
- II) **SE ORDENA**, al Director de la Administración Financiera Municipal, hacer el pago correspondiente al 90.00% del monto total del proyecto.
- III) Cúmplase. -

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.


LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUIN DE
SECRETARIA MUNICIPAL GUASTATOYA
¡Sirviendo!
