



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
(Sirviendo)

- 5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
- BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2025

EXPEDIENTE No. 306

NOG: 26877023

CONTRATO No. 17-2025


PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE
EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO,
GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte CODEDE	55.00%			
Q. 3,598,745.00		Q. 1,979,309.75	Q. 395,861.95	Q. 1,583,447.80
32 00 001 000 006 331 21-0101-0001				
TOTALES		Q. 1,979,309.75	Q. 395,861.95	Q. 1,583,447.80

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Punto del Concejo Municipal de aprobación de avance, Copia de bitácora.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA EL PROGRESO

Publicar el listado de Facturas de un concurso

Mensaje de confirmación

23.sep..2025 15:06:49

Datos del Concurso

Entidad	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
Unidad compradora	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
NOG	26877023
Descripción	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO
Modalidad	Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Tipo	Público
Fecha límite para ofertar	04.ago..2025
Fecha publicación	24.jun..2025
Beneficiario Institucional	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Estatus actual	Adjudicado

Proveedor

1	(9303111) HERNÁNDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO
---	---

Listado de facturas incluidas:

#1	SERIE:19B51DD6 NO_FACTURA:1476478778 MONTO:1979309.75
----	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



Mensaje de confirmación

23.sep..2025 16:01:53

Documentos asociados:

1

26877023@INFORME DE SUPERVISION 55 AVANCE FISICO CALLE EDIFICIO MUNICIPAL.pdf(2756 KB)

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



Factura

FERNANDO AUGUSTO , HERNÁNDEZ GODOY
Nit Emisor: 9303111
CONSTRUFER
KILÓMETRO 73 RUTA AL ATLÁNTICO KILOMETRO 73 ALDEA CASAS
VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
19B51DD8-5801-473A-B597-2FF6D1C43204
Serie: 19B51DD8 Número de DTE: 1476478778
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 12-sep-2025 11:12:23
Fecha y hora de certificación: 12-sep-2025 11:12:23
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Pago del 55.00% de avance físico del proyecto denominado: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO. Según contrato administrativo de obra No. 17-2025, Monto estimación: Q.1,979,309.75, (-) Amortización: Q.395,861.95, Líquido a recibir: Q.1,583,447.80	1,979,309.75	0.00	0.00	1,979,309.75	IVA 212,068.901786
TOTALES:					0.00	0.00	1,979,309.75	IVA 212,068.901786

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"



Aldea Casas Viejas, Guastatoya El Progreso

08 de septiembre del año 2025

Señor:
Alcalde
José Elías Herrera Guerra
Municipalidad de Guastatoya
Departamento de El Progreso
Presente.

Por este medio me dirijo a usted, deseándole muchos éxitos y bendiciones en tan distinguido cargo.

El motivo de la presente es para solicitar se nombre a la comisión respectiva de la oficina de planificación para evaluación física del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO", según contrato Administrativo Número (17-2025), de fecha trece de agosto del año 2025, ubicado a un Costado de Edificio Municipal Hacia Calle Doble Vía, Barrio El Golfo, Guastatoya, El Progreso.


Dicha obra tiene un **avance físico del 55.00%**, es por ello que se solicita realizar los trámites correspondientes para el desembolso del porcentaje antes mencionado.

Al oficio se adjuntan los siguientes documentos:

- ✓ Cuadro de estimación
- ✓ Registro fotográfico

Agradeciendo la atención prestada, y en espera de una respuesta positiva, me es grato el suscribirme.

Atentamente,

F. 
Fernando Augusto Hernández Godoy
Propietario
CONSTRUFER

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
PROPIETARIO

CONSTRUER
ESTIMACIÓN DE TRABAJO No. 1
PROYECTO: "MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO"
MONTO DEL CONTRATO: Q. 3,688,746.00

No. REGISTRO	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRATADA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	81% PERIODO	CANTIDADES EJECUTADAS (ACTUALES Y ACUMULADAS)				% RESULTADO DEL PERIODO	% TOTAL EJECUTADO
							PERIODO ANTERIOR	ESTE PERIODO	PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO		
TRABAJOS PRELIMINARES												
101.00	Limpieza y Chapeo	3730.00	m2	Q. 8.00	Q. 29,840.00	3,730.00	0.00	3,730.00	Q. 29,840.00	Q. -	Q. 29,840.00	100.00%
102.00	Replanteo topografico	288.00	m2	Q. 48.00	Q. 13,728.00	288.00	0.00	288.00	Q. 13,728.00	Q. -	Q. 13,728.00	100.00%
103.00	Demolicion y retiro de Material	3730.00	m2	Q. 125.60	Q. 468,115.00	3,730.00	0.00	3,730.00	Q. 468,115.00	Q. -	Q. 468,115.00	100.00%
104.00	Corte de Calzada + Cortes laterales Altura de corte 0.25 m con retiro de material	917.00	m3	Q. 209.00	Q. 191,653.00	917.00	0.00	917.00	Q. 191,653.00	Q. -	Q. 191,653.00	100.00%
BASE Y COMPACTACION												
201.00	Conformacion de Subbase	3730.00	m2	Q. 30.00	Q. 111,900.00	3,730.00	0.00	3,730.00	Q. 111,900.00	Q. -	Q. 111,900.00	100.00%
202.00	Tendido + compactacion de base granular (e=0.18 m. compactada)	635.00	m3	Q. 337.00	Q. 210,820.00	635.00	0.00	635.00	Q. 210,820.00	Q. -	Q. 210,820.00	100.00%
PAVIMENTO												
301.00	Pavimento concreto 4000 psi, e=0.16 mts (proporcion 1:2:2, drenado de concreto)	3709.00	m2	Q. 698.00	Q. 2,173,474.00	1,628.71	0.00	1,628.71	Q. 953,253.75	Q. -	Q. 953,253.75	43.86%
302.00	Revestido de Ingreso de 4000 psi e=0.15 mts	48.00	m2	Q. 1,408.00	Q. 67,584.00	0.00	0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
303.00	Corte y sellado de juntas en pavimento y bordillos	1,334.00	m	Q. 43.00	Q. 57,367.00	0.00	0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
BORDILLOS												
401.00	Bordillo de 0.10x0.40 m concreto tipo 3000 psi	952.00	m	Q. 240.00	Q. 154,560.00	0.00	0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
SEALIZACION												
501.00	Pintura Termoplástica + Vialidad	552.00	m	Q. 124.00	Q. 68,448.00	0.00	0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
502.00	Pase Nacional	65.00	m2	Q. 687.00	Q. 43,955.00	0.00	0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
LIMPIEZA												
601.00	Limpieza final del proyecto (3730.00 m2)	1.00	unidad	Q. 7,605.00	Q. 7,605.00	0.00	0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
Total cantidad contratada				Q. 3,688,746.00							Q. 3,688,746.00	100.00%

MONTO BRUTO DE ESTA ESTIMACION	Q. 3,688,746.00
MONTO DE ESTIMACIONES	Q. 3,688,746.00
MONTO DE ESTIMACIONES	Q. 3,688,746.00
MONTO DE ESTIMACIONES	Q. 3,688,746.00

COLEGADO No. 18.137
INGENIERO CIVIL
CONSTRUER

CONSTRUER
4100 CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO



Registro Fotográfico
"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE
EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO,
GUASTATOYA, EL PROGRESO"

Contrato Administrativo Número (17-2025)




CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO



Registro Fotográfico

**"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE
EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO,
GUASTATOYA, EL PROGRESO"**

Contrato Administrativo Número (17-2025)

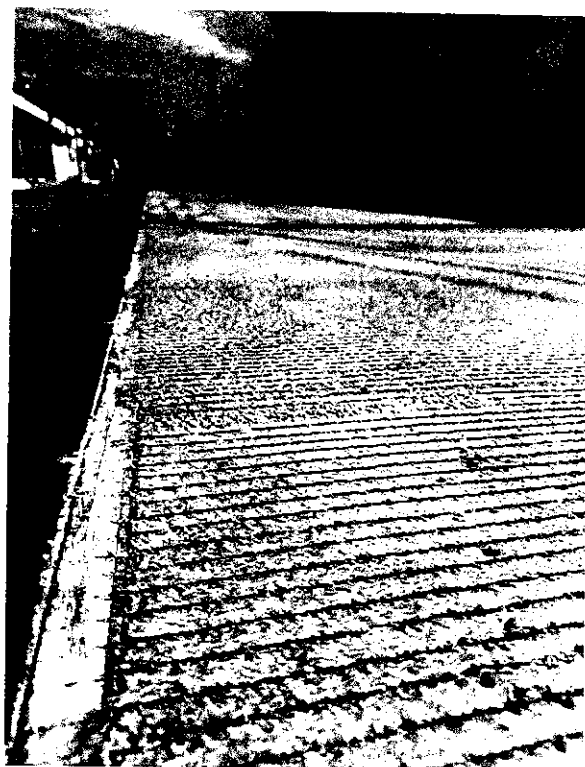


CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODIN
PROPIETARIO



Registro Fotográfico
"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE
EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO,
GUASTATOYA, EL PROGRESO"

Contrato Administrativo Número (17-2025)

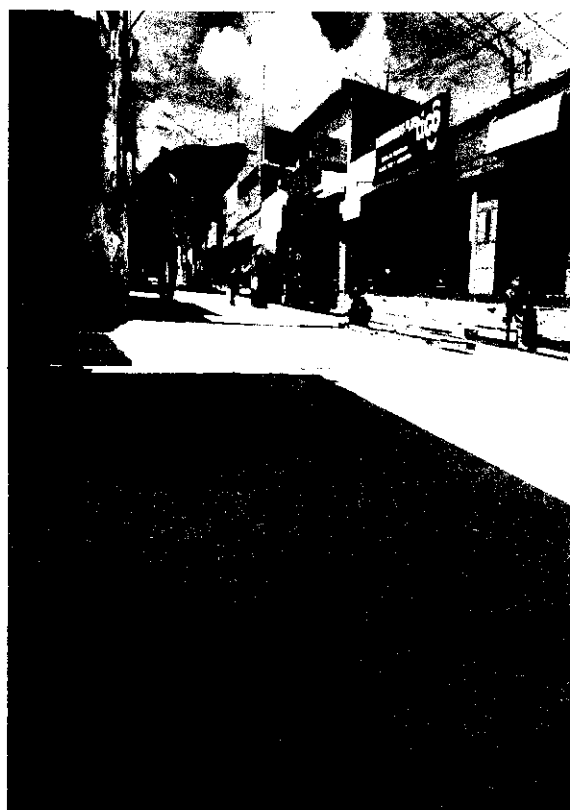


[Signature]
CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO




Registro Fotográfico

**"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE
EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO,
GUASTATOYA, EL PROGRESO"**

Contrato Administrativo Número (17-2025)



F. 
Fernando Augusto Hernández Godoy
Propietario
CONSTRUER

CONSTRUER
CALLE CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
PROPIETARIO

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 08 de Septiembre de 2025

**SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO**


De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, con número de contrato **17-2025** de fecha 13 de Agosto de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUFER**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Septiembre de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **55.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente



José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

**ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO**



[illegible]

D.M.P.

**SUPERVISION DE
OBRAS**

**Dirección Municipal de
Planificación**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO


Nombre del proyecto.

MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO
DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL
GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Ubicación del proyecto.

Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.

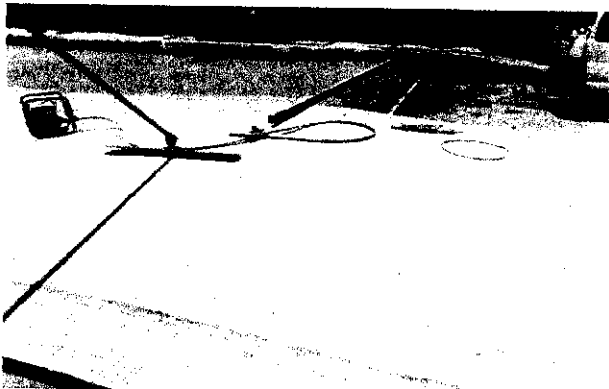

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

Jose F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,356

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 1

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO
Municipio: GUASTATOYA
Comunidad: CABECERA MUNICIPAL
Fecha de Inicio: 20/08/2025
Fecha de Finalización: 19/02/2026
Contrato No.: 17-2025
Modificaciones:
Construccion: CONSTRUIR
Representante legal: FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY

RESUMEN DE RENGLONES														
No.	DESCRIPCION	CANTIDADES DE TRABAJO			ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO		ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO		TOTAL	CANTIDAD				CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	
1	PRELIMINARES													
1-01	UBICAZION Y CHAPETEO	3,730.00	M2	Q. 8.00	Q. 29,840.00					3,730.00	Q. 29,840.00	3,730.00	Q. 29,840.00	0.81%
1-02	REFRANITO FOTOGRAFICO	286.00	M	Q. 49.00	Q. 13,778.00					286.00	Q. 13,778.00	286.00	Q. 13,778.00	0.34%
1-03	RELOCACION Y RETIRO DE MATERIAL	3,730.00	M2	Q. 175.50	Q. 653,115.00					3,730.00	Q. 653,115.00	3,730.00	Q. 653,115.00	13.01%
1-04	CORTIL DE CARRERA + CORTELES LATERALES ALTURA DE CORTELO 0.2m CON MATERIAL DE MATERIAL	917.00	M3	Q. 209.00	Q. 191,653.00					917.00	Q. 191,653.00	917.00	Q. 191,653.00	5.14%
2	BASE + COMPACTACION													
2-01	CONFORMACION DE SUBRASANTE	3,730.00	M2	Q. 30.00	Q. 111,900.00					3,730.00	Q. 111,900.00	3,730.00	Q. 111,900.00	3.11%
2-02	ENDIDO + COMPACTACION DE BASE GRANULAR (p=3.5 Rm compactante)	635.00	M3	Q. 317.00	Q. 201,875.00					635.00	Q. 201,875.00	635.00	Q. 201,875.00	5.16%
3	PAVIMENTO													
3-01	PAVIMENTO DE CONCRETO 4000 PSI, e=18 cms (PRUNCIÓN 1.23, VARIANO DE CORTELO)	3,097.00	M2	Q. 586.00	Q. 1,814,772.00					3,097.00	Q. 1,814,772.00	3,097.00	Q. 1,814,772.00	26.49%
3-02	REAJUSTES DE INGRESO DE 4000 PSI p=0.15m	48.00	M2	Q. 1,408.00	Q. 67,584.00					48.00	Q. 67,584.00	48.00	Q. 67,584.00	0.93%
3-03	CORTIL Y SELLO DE JUNTAS EN PAVIMENTO Y BORDILLOS	1,334.00	M	Q. 43.00	Q. 57,362.00					1,334.00	Q. 57,362.00	1,334.00	Q. 57,362.00	0.93%
4	BORDILLOS													
4-01	BORDILLO DE CONCRETO 4000 PSI, e=10 cms CON CEMENTO TIPO 3000 PSI	552.00	M	Q. 240.00	Q. 132,480.00					552.00	Q. 132,480.00	552.00	Q. 132,480.00	0.93%
5	SEÑALIZACION													
5-01	SEÑALIZACION TRAFICADISTICA + SEÑALIZACION	552.00	M	Q. 174.00	Q. 96,048.00					552.00	Q. 96,048.00	552.00	Q. 96,048.00	0.93%
6	PASEO PEATONAL	65.00	M2	Q. 667.00	Q. 43,355.00					65.00	Q. 43,355.00	65.00	Q. 43,355.00	0.93%
7	SUPERFICIA													
7-01	UBICAZION FINAL DEL PROYECTO (3730.00x3)	1.00	UNIDAD	Q. 7,906.00	Q. 7,906.00					1.00	Q. 7,906.00	1.00	Q. 7,906.00	0.93%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					Q. 3,598,745.00					Q. 3,598,745.00		Q. 3,598,745.00		55.00%

VALOR DE TRABAJO EJEC. NO. 1	Q. 1,979,309.75
ACUMULADO DEL TRABAJO EJEC. NO. 1	Q. 395,861.95
VALOR DE TRABAJO EJEC. NO. 1	Q. 323,887.05
VALOR DE TRABAJO EJEC. NO. 1	Q. 3,583,447.80

JOSE M. GARCIA ALEJANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL
UNIDAD DE BITÁCORAS - DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA -

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/08/2025

No. CONTRATO	17-2025
FECHA CONTRATO	13/08/2025
MONTO CONTRACTUAL	3,598,745.00
NOG	26877023
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOEL AMADO ORELLANA
EMPRESA EJECUTORA	FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 19/08/2025

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/08/2025

CONTRATO
No.

17-2025

NOMBRE:

MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA
A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA
CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO,
GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD:

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.

1

FECHA

08/09/2025

TIPO

AVANCE

DESCRIPCIÓN

Se realiza la colocación de concreto en la calle preparada, se cuenta con personal y
materiales suficientes para el avance del proyecto

CREADO POR


FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA









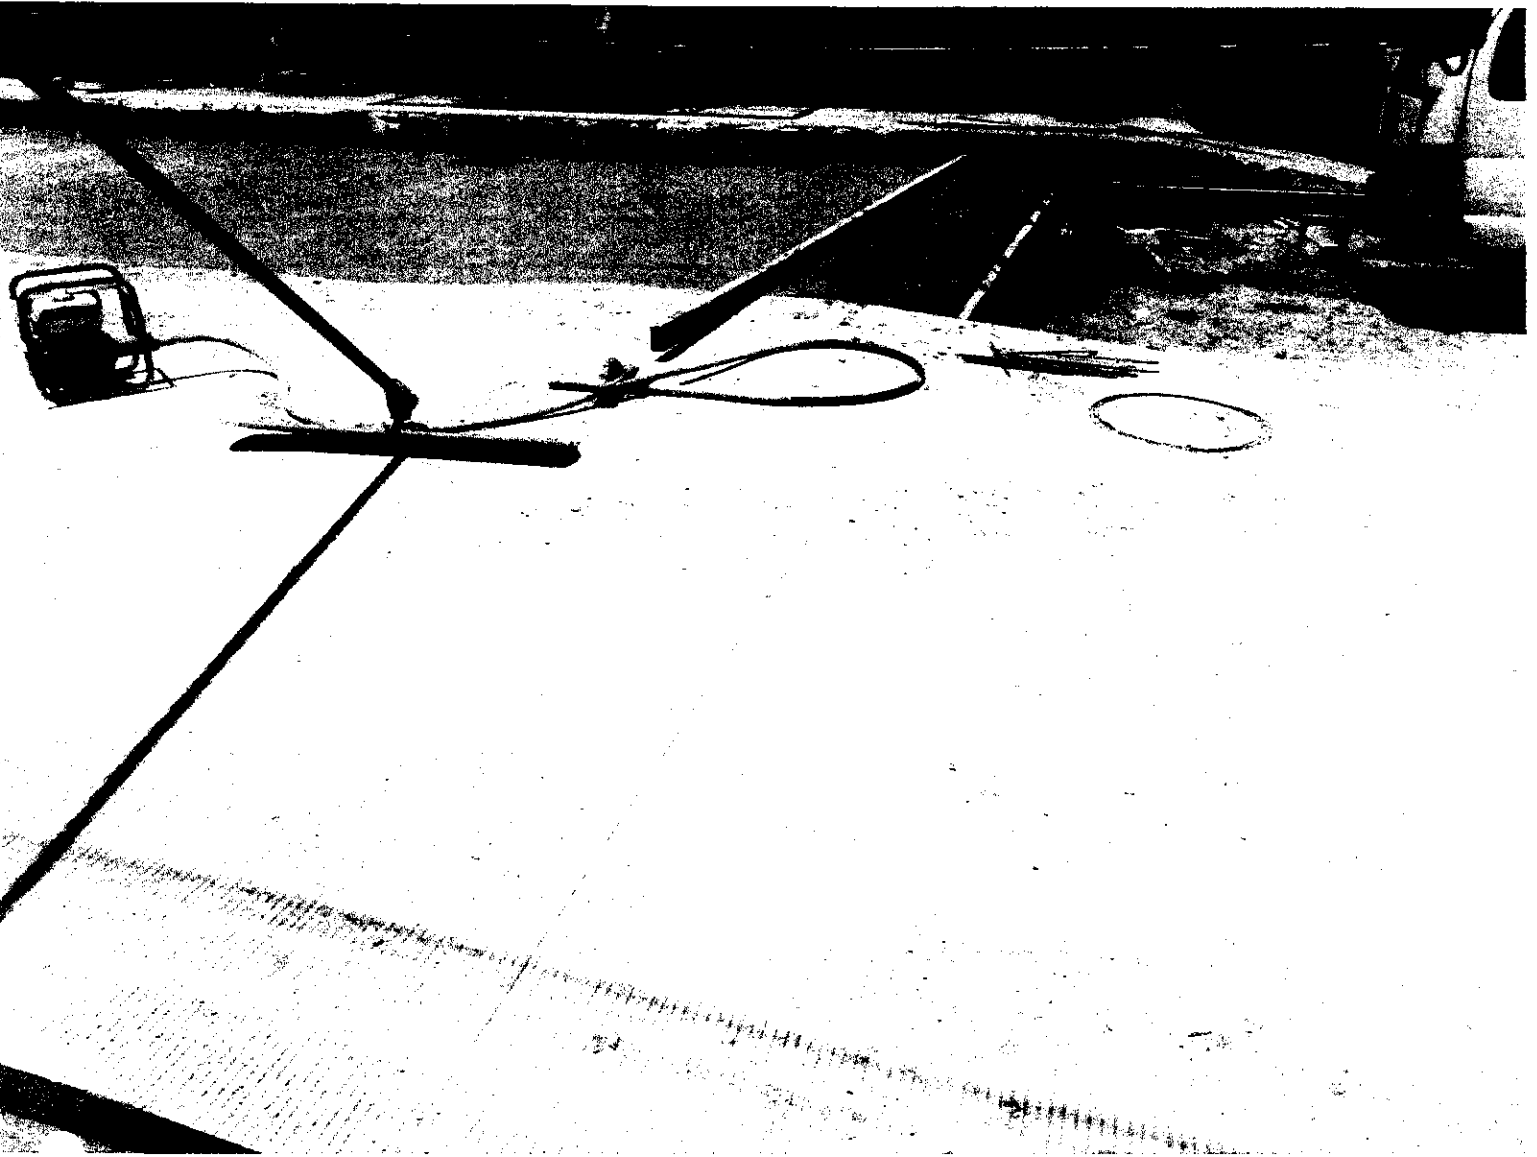

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:


Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **TERCERO** del acta 67-2025 de fecha ocho de septiembre de dos mil veinticinco del libro número 3,539 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

TERCERO: La Secretaria Municipal informa al Concejo Municipal que, Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de Planificación, presenta oficio Ref.agmo/DMP/384-2025, de fecha 08 de septiembre de 2025, en el cual informa: el cual en su parte conducente expone: "El motivo de la presente es para informarle que el proyecto **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Contrato administrativo número 17-2025 de fecha 13 de agosto de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUFER**, presentó informe del 55% de avance físico. Por lo tanto solicito que se apruebe el pago del 55% de avance físico del proyecto antes mencionado a la empresa **CONSTRUFER**, siendo su propietario el señor Fernando Augusto Hernandez Godoy. Consiguientemente y en cumplimiento al numeral 2) de la Cláusula Cuarta del contrato en referencia, presenta el informe de supervisión signado por el Ingeniero JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA, Supervisor de Obras Municipales, por medio del cual informa de la estimación, del avance físico del referido proyecto, indicando que se encuentra en un avance físico del 55.00%, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación.

CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, establece: "Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas." **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 35 literal a), del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas establece: Atribuciones Generales del Concejo Municipal "son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales...". **POR TANTO:** El Concejo Municipal, con fundamento en los considerandos y las facultades que le confiere el Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas, y por **UNANIMIDAD DE VOTOS. RESUELVE:** I) Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente respectivo. II) **APROBAR**, el pago equivalente al avance físico del 55%, a favor de la empresa mercantil **CONSTRUFER**, propiedad del señor Fernando Augusto Hernandez Godoy, de conformidad con el monto de estimación de avance físico, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación, presentados por el Supervisor de Obras Municipales del proyecto **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, el que se ejecuta con el Contrato Administrativo de Obras 17-2025. III) Se le ordena al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, hacer las operaciones contables correspondientes y proceder al pago de conformidad con lo aprobado en el numeral romano II) del presente punto resolutivo. IV) Notifíquese.

(Fs) Illegibles José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Hernán Archila Morales, Erasmo Bettetón Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Almée Estrada Ortiz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A NUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN
SECRETARIA MUNICIPAL

