



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
(Sirviendo)

- 5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
- BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2025

EXPEDIENTE No. 295

NOC: 26137453

CONTRATO No. 06-2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR GIMNASIO
MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO


APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte MUNICIPAL	60.00%			
Q. 799,812.24				
32 00 001 000 002 331 21-0101-0001		Q. 479,887.34	Q. 95,977.47	Q. 383,909.87
TOTALES		Q. 479,887.34	Q. 95,977.47	Q. 383,909.87

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Acuerdo Municipal de aprobación de avance, Copia de bitácora.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
26/07/2025






PAGO
A LA ORDEN DE:

SUMA DE:

No. GT86 BRRL 0101 0000 0030 0509 2073



GUANAHATOA, 9 de JULIO del 2025

**CUENTA UNICA DEL TESORO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T.**

CUENTA No. 3-005-09207-3

GUATEMALA, C.A.

CHEQUE No. 91425

Q.

* 393,905,374

QUETZALES

NO NEGOTIABLE

"31"0000001 15:200509 2073"00 18 16:28 "00000 572554

DESCRIPCION DE OBRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO RECONSTRUCCION
DE LA CARRERA MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATONZA. EN PROGRESO.

81426

Cuenta No.		CONCEPTO		DEBE	HABER
		NUMERO DE CHEQUE: 51426 CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 295 TRANSACCION No: 62346931 NIT BENEFICIARIO: 47663812 DE LMI. ORELLANA 1072025 3 de JULIO del 2023 Neftali Balcarcel Orellana REPRESENTANTE LEGAL FERRCONS BALCARCEL			
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	DIA	MES AÑO
			Neftali Balcarcel.	16	07-23



**MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA**
¡Sirviendo!

EXPEDITION

PR

	A
	Approved
	Q. 799,81
	32 00 001
	T

Se cuenta
Superviso
bitácora.
Lic. Alexi
Director N

Factura

NEFTALI, BALCARCEL ORELLANA
Nit Emisor: 47663812
FERRCONS BALCARCEL
BARRIO EL PORVENIR Guastatoya, EL PROGRESO, Guastatoya
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1CA27620-7F75-45D9-95F4-A48BACECDE00
Serie: 1CA27620 Número de DTE: 2138392025
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 09-jul-2025 15:06:44
Fecha y hora de certificación: 09-jul-2025 15:06:44
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Bien	1	PAGO DEL 60% DE AVANCE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SEGUN CONTRATO No. 06-2025 ESTIMACION Q.479,887.34 (-) AMORTIZACION DEL ANTICIPO Q.95,977.47 LIQUIDO A RECIBIR Q.383,909.87	479,887.34	0.00	0.00	479,887.34	IVA	51,416.500714
TOTALES:					0.00	0.00	479,887.34	IVA	51,416.500714

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Ejecución

Mensaje de confirmación	
09.jul..2025 14:35:46	
Documentos asociados:	
1	26137453@INFORME DE SUPERVISION 60 AVANCE FISICO CALLE GIMNASIO.pdf(2841 KB)
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	
	

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 24 de Junio de 2025

**SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO**


De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, con número de contrato **06-2025** de fecha 13 de Mayo de 2025, ejecutado por la empresa **FERRCONS BALCARCEL**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Junio de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **60.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente





José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9.366

**ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO**



[illegible]

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO		
Nombre del proyecto. MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Ubicación del proyecto. Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso	
2. INFORME FOTOGRAFICO.		
		
SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.		
 ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES  ALCALDE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA JOSE ELIAS HERRERA GUERRA ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA		

Reporte de Avance Físico No. 1

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Municipio: GUASTATOYA

Comunidad: CABECERA MUNICIPAL

Fecha de Inicio: 22/05/2025

Fecha de Finalización: 21/10/2025

Contrato No.: 06-2025

Modificaciones:

Constructora: FERRCONS BALCARCEL

Representante legal: NEFTALI BALCARCEL ORELLANA

Departamento: EL PROGRESO

Fecha de Contrato: 13/05/2025

Fecha de Supervisión: 24/06/2025

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Valor del Proyecto: Q. 799,812.24

Valor Original: Q. 799,812.24

Telefono:

RESUMEN DE RENGONES															
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE	
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL					CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL		
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	128.00	M	Q 20.35	Q 2,604.80						128.00	Q 2,604.80	128.00	Q 2,604.80	0.33%
2	LEVANTADO DE CARPETA EXISTENTE Y CORTE DE CAJUELA	876.00	M2	Q 59.59	Q 52,200.84						876.00	Q 52,200.84	876.00	Q 52,200.84	6.53%
3	REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE	876.00	M2	Q 88.00	Q 77,088.00						876.00	Q 77,088.00	876.00	Q 77,088.00	9.64%
4	CAPA BASE (E=0.10 M.)	876.00	M2	Q 154.52	Q 135,359.52						876.00	Q 135,359.52	876.00	Q 135,359.52	16.92%
5	PAVIMENTO DE CONCRETO e=0.15 M	876.00	M2	Q 483.45	Q 423,502.20						439.83	Q 212,634.18	439.83	Q 212,634.18	26.59%
6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	420.00	M	Q 54.38	Q 22,839.60						-	-	Q -	-	0.00%
7	BORDILLO PREFABRICADO	231.02	M	Q 304.00	Q 70,230.08						-	-	Q -	-	0.00%
8	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	128.00	M	Q 124.90	Q 15,987.20						-	-	Q -	-	0.00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					Q 799,812.24						Q 479,887.34		Q 479,887.34	Q 479,887.34	60.00%

Jose F. Alexander Aguilar Mejia

Ingeniero Civil

Colegiado No. 9,366

ALCALDE

ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

Jose Elias Herrera Guerra

(Sirviendo)

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q	479,887.34
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q	95,977.47
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q	63,984.98
LIQUIDO A RECIBIR	Q	383,909.87

Guastatoya, 19 de junio del 2025

SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,
GUASTATOYA, EL PROGRESO.

Es un honor para mi, poderles expresar un profundo y respetuoso saludo, y a la vez comunicarles que el proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR GIMNACIO MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO."** El cual está respaldado con el contrato de obra No. **06-2025** de fecha **13 de mayo del 2025**. Cuenta con un avance físico del , (60%) por lo que presento a usted el cuadro de estimación sobre dicho avance físico, **SOLICITANDO** a la vez el pago de la misma.

Sin otro particular, me suscribo.

ATENTAMENTE:

NEFTALI BALCARCEL ORELLANA
FERRCONS BALCARCEL.

Neftali Balcarcel Orellana
REPRESENTANTE LEGAL
FERRCONS BALCARCEL



ESTIMACION DE TRABAJO: UNO
NOMBRE DE LA EMPRESA: FERRCONS BALCARCEL
NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento Calle con Pavimento Sector Gimnasio Municipal, Barrio El Golfo, Guastatoya, El Progreso.

DATOS DEL CONTRATO:	No.	006-2025	FECHA:	13/05/2025	MONTO:	Q 799,812.24
---------------------	-----	----------	--------	------------	--------	--------------

Partición	RENDIMIENTOS DE TRABAJO/CANTIDADES	Cantidad Contratada				Cantidad EJECUTADA				Cantidad pendiente de EJECUTAR			
		Unidad	Cantidad	Precio	Costo total	Este	Acumulado	Q	%	Este	Q	%	
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M	128.00	Q 20.35	Q 2,604.80	128.00		Q 2,604.80	100%	0	Q	0%	
2	LEVANTADO DE CARPETA EXISTENTE Y CORTE DE CAJUELA	M2	876.00	Q 59.59	Q 52,200.84	876.00		Q 52,200.84	100%	0	Q	0%	
3	REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE	M2	876.00	Q 88.00	Q 77,088.00	876.00		Q 77,088.00	100%	0	Q	0%	
4	CAPA BASE (E=0.10 M.)	M2	876.00	Q 154.52	Q 135,359.52	876,000000		Q 135,359.52	100%	0	Q	0%	
5	PAVIMENTO DE CONCRETO e= 0.15 M	M2	876.00	Q 483.45	Q 423,502.20	439,82662		Q 212,634.18	50%	436,17338	Q 210,868.02	50%	
6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	ML	420.00	Q 54.38	Q 22,839.60			Q -	0%	420	Q 22,839.60	100%	
7	BORDILLO PREFABRICADO	ML	231.02	Q 304.00	Q 70,230.08			Q -	0%	231.02	Q 70,230.08	100%	
8	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	M	128.00	Q 124.90	Q 15,987.20			Q -	0%	128	Q 15,987.20	100%	
Total cantidad contratada					Q 799,812.24	Cantidad ejecutada		Q 479,887.34	60.00%		Q 319,924.90	40.00%	

Monto bruto de esta Estimación	Q	479,887.34
Anticipos	Q	159,962.45
Amortización de Anticipos 20%	Q	95,977.47
Monto neto de esta Estimación	Q	383,909.87
Menos 1er. Pago		
Menos 2do Pago		
Menos 3er. Pago		
Menos 4to. Pago		

Guastatoya 19 de junio del 2,025

NEFTALI BALCARCEL ORELLANA
FERRCONS BALCARCEL

Neftali Balcarcel Orellana
REPRESENTANTE LEGAL
FERRCONS BALCARCEL

LUIS LEONEL URIZAR MUNOZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 4,001^o

Líquido a Recibir	Q	383,909.87
-------------------	---	------------

FERRCONS BALCARCEL

Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso.

Neftali Balcarcel Orellana



Propietario

Tel. 7945-0030 Cel. 5630-3868

Correo Electrónico: balcarcel.2000@hotmail.com

INFORME FOTOGRAFICO

MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR GIMNACIO MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA EL PROGRESO

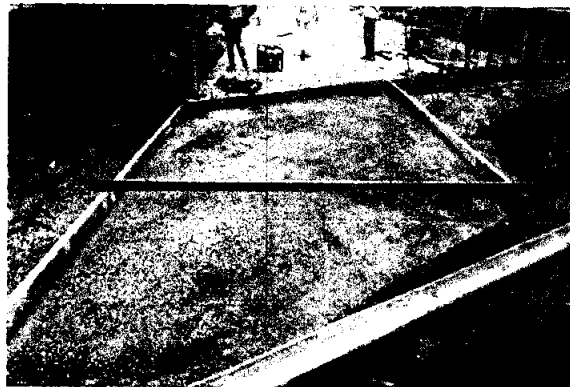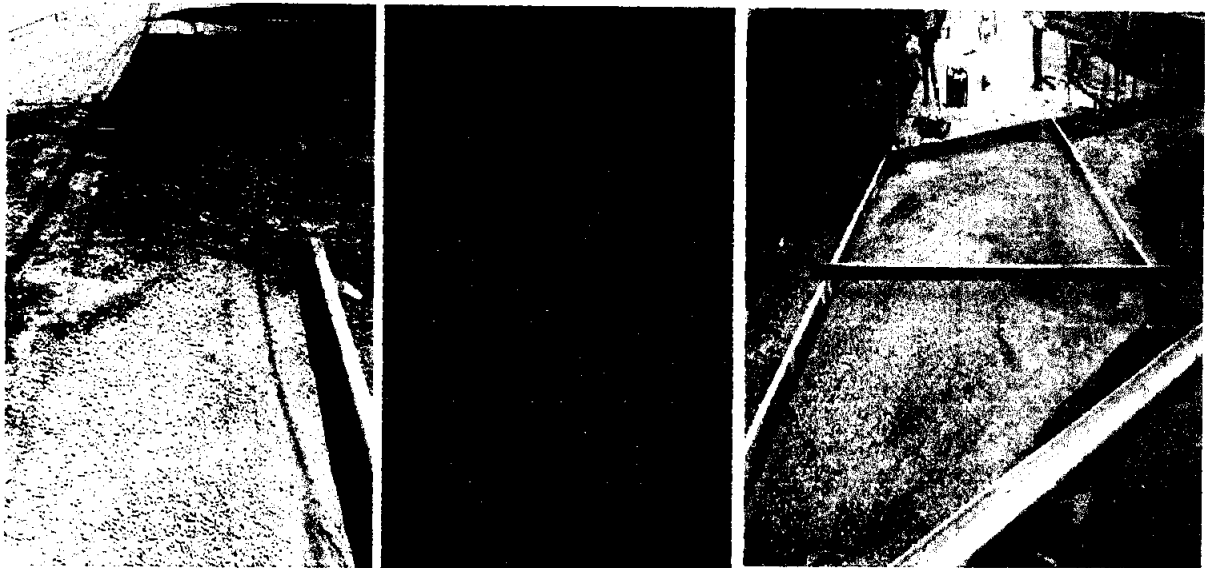

Neftali Balcarcel Orellana
REPRESENTANTE LEGAL
FERRCONS BALCARCEL

LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 4,001

Construcción en General y Alquiler de Maquinaria.





CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL
UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 2651/05/2025	
No. CONTRATO	06-2025
FECHA CONTRATO	13/05/2025
MONTO CONTRACTUAL	799,812.24
MOG	26137453
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ
EMPRESA EJECUTORA	NEFTALI BALCARCEL ORELLANA
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	NEFTALI BALCARCEL ORELLANA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 21/05/2025

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 2651/05/2025

CONTRATO No. 06-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO
SECTOR GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL
GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	1
FECHA	27/05/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	BITACORA DE INICIO DE PROYECTO se adjunta acta de inicio para hacer constar el inicio de los trabajos a realizar en el proyecto MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS

Nº 0192



ACTA DE INICIO NO. 12-2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO. IDENTIFICADO CON NOG. 26137453, EN GUATECOMPRAS.

En el Municipio de Guastatoya, Departamento El Progreso, siendo las ocho horas en punto del día jueves veintidós de mayo de dos mil veinticinco, reunidos en el área donde se va a ejecutar el Proyecto, **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. Los señores: José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales; Neftali Balcárcel Orellana, Representante Legal de la Empresa Constructora; Ing. Luis Leonel Urizar Muñoz, Supervisor Residente del Proyecto; Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** Se facciona la presente acta para dejar constancia de Inicio del Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. El cual será ejecutado con fondos municipales para la inversión del ejercicio fiscal 2,025; por un Valor de Setecientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Doce Quetzales con Veinticuatro Centavos (Q. 799,812.24), con un plazo de cinco meses calendario el cual, por adjudicación en los procesos y requisitos de GUATECOMPRAS, lo ejecutará la empresa **FERRCONS BALCARCEL**, Habiendo sido publicado en el Sistema de Guatecompras la adjudicación bajo el NOG- 26137453, Según Contrato Administrativo No. 06-2025 de fecha trece de mayo del dos mil veinticinco. **SEGUNDO:** Los señores anteriormente mencionados declaran iniciados los trabajos, los cuales se realizarán con base a planos y especificaciones elaboradas para el presente proyecto y de acuerdo al contrato respectivo. **TERCERO:** El Señor Alcalde Municipal recomienda al representante de la empresa constructora, al supervisor residente de la empresa y supervisor de obras municipales que los trabajos sean ejecutados en base al diseño y especificaciones propias de este proyecto y presentar los avances del mismo para el pago respectivo con la documentación de soporte. **CUARTO:** No habiendo más que agregar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha media hora después de su inicio. Leída se acepta, ratifica y firma por los que en ella intervenimos Damos fe.

José Elías Herrera Guerra
Alcalde Municipal

Lic Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director
Dirección Municipal de Planificación

Neftali Balcárcel Orellana
Representante de la empresa

Ing. Luis Leonel Urizar Muñoz
Supervisor Residente

Neftali Balcárcel Orellana
REPRESENTANTE LEGAL
FERRCONS BALCARCEL

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 8,100

LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 4,001

Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipales

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 2651/05/2025

CONTRATO No. 06-2025
NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO
SECTOR GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL
GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA




REGISTRO No.	2
FECHA	30/05/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la fundición de pavimento y el corte de juntas, ademas de la colocación de bordillo prefabricado, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA







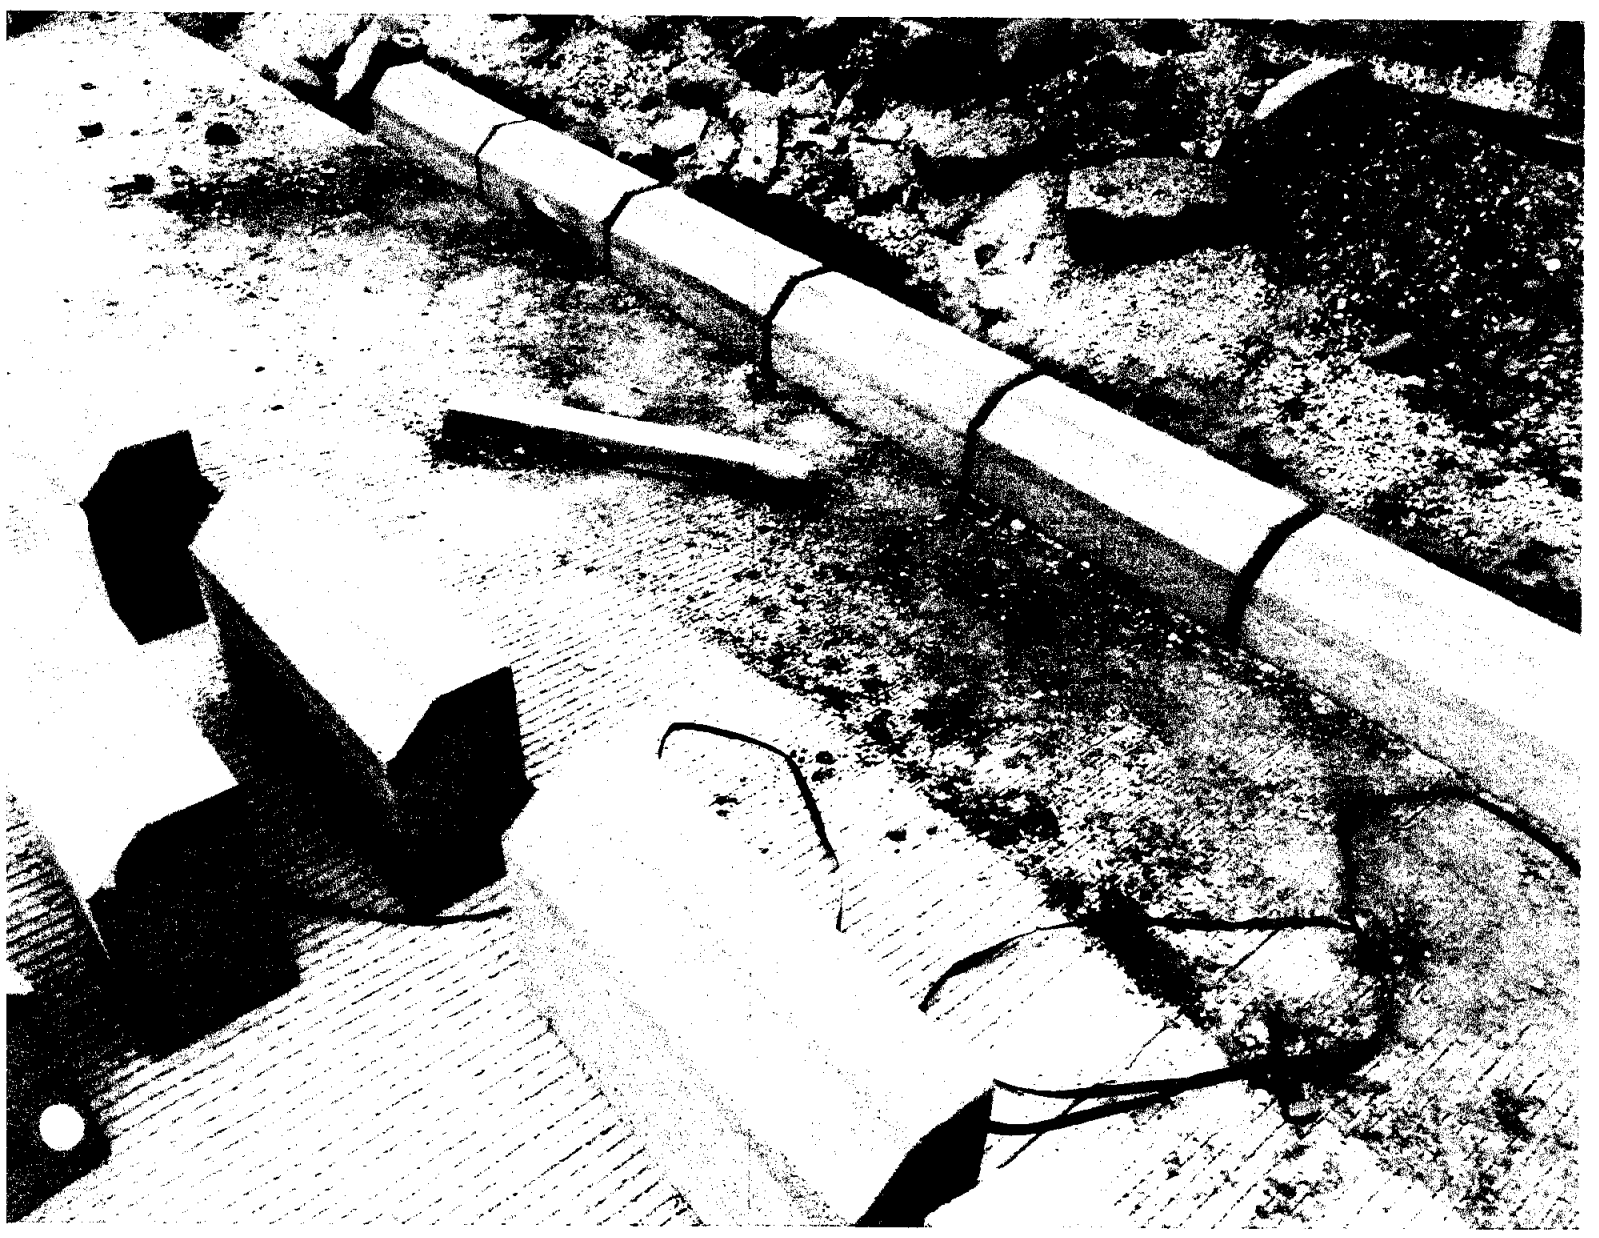



BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 2651/05/2025

CONTRATO No. 06-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO
SECTOR GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL
GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	3
FECHA	07/06/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza colocacion de bordillo prefabricado, y corte de juntas, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA













BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 2651/05/2025

CONTRATO No. 06-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO
SECTOR GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL
GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No. 4
FECHA 24/06/2025
TIPO AVANCE
DESCRIPCIÓN El proyecto se encuentra en fase de terminación
CREADO POR FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA





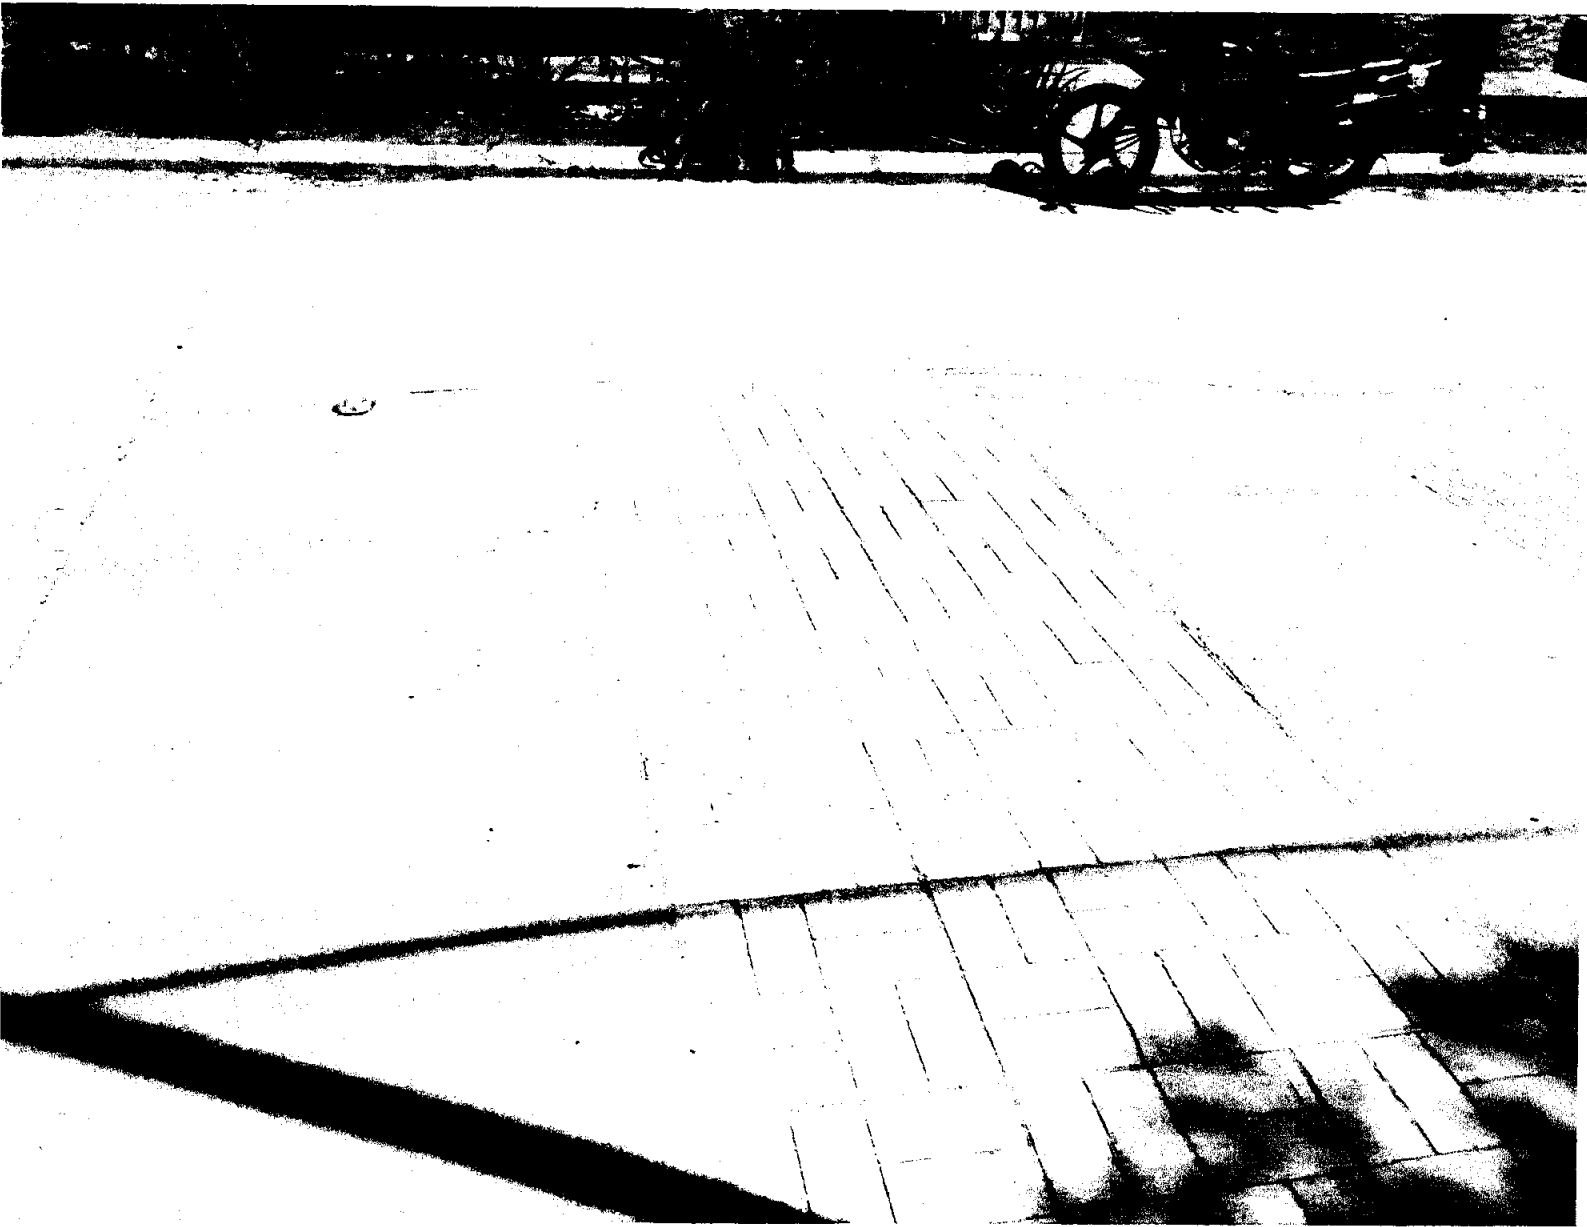







¡Sirviendo!

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

CERTIFICA

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe EL ACUERDO MUNICIPAL No. 068-2025 de fecha siete de julio de dos mil veinticinco del libro número 3,211 de la Alcaldía Municipal, Libro de Acuerdos, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

ACUERDO MUNICIPAL 068-2025

Guastatoya, 07 de Julio de 2,025

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

La Autoridad Administrativa Superior

Se tiene a la vista la solicitud presentada por Neftali Balcarcel Orellana propietario de la empresa **FERRCONS BALCARCEL**, en la cual manifiesta que el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 06-2025, de fecha trece de mayo de dos mil veinticinco; y que el proyecto en referencia se encuentra en un avance físico del 60.00%, en consecuencia solicitan el pago de conformidad con la cláusula cuarta numeral 2) del contrato administrativo de obras.

Consecuentemente se encuentra el informe del Ingeniero Jose Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, en el cual hace constar la confirmación del avance del proyecto en referencia, por un total de 60.00% de avance físico, adjunta para el efecto la estimación.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: Estimaciones para pago. *"La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas."*

POR TANTO:


Con fundamento en los antecedentes y lo considerado, este Despacho Municipal.

RESUELVE:

- I) **APROBAR**, el pago por la cantidad de 60.00%, del proyecto **"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 06-2025, de fecha trece de mayo de dos mil veinticinco; suscrito por el Alcalde Municipal y Neftali Balcarcel Orellana propietario de **FERRCONS BALCARCEL**.
- II) **SE ORDENA**, al Director de la Administración Financiera Municipal, hacer el pago correspondiente al 60.00% del monto total del proyecto.
- III) Cúmplase. -

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A SIETE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA


LICDA. EVELYN YANETH CAJACA MARROQUIN
SECRETARIA MUNICIPAL GUASTATOYA



MUNICIPALIDAD DE

GUASTATOYA

¡Sirviendo!
