


MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡sirviendo!

☎ 5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

➤ LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2026, FONDOS PROVENIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO Y CONCEJOS DE DESARROLLO.

ENTIDAD	Municipalidad de Guastatoya, El Progreso.
DIRECCIÓN	Barrio El Clavario, Guastatoya, El Progreso.
HORARIO DE ATENCIÓN	Lunes a viernes de 8:00 am a 16:30 pm.
TELÉFONO	79451594.
DIRECTOR	Alexis Geovanny Marroquín Orellana.
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN	Beverly Mishell Cruz Orellana.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	06 de Marzo del año 2026.
CORRESPONDE AL MES DE	FEBRERO del año 2026.





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

➤ LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2025, CON FONDOS PROVENIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.

NO.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTADA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
01.	336295	CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO Y VACIONAL MUNICIPAL PARQUE ACUATICO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. (Mismo avance mes de agosto)	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO Y VACIONAL MUNICIPAL PARQUE ACUATICO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 6,532,874.00	01-0101-0001	12 MESES CALENDARIO	2000	CONSTRUYER	FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY	34-2024	60%	Q. 4,537,534.31





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

☎ 5980-0535 📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

NO.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTADA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
02.	336296	CONTRUCCION CENTRO RECREATIVO PARQUE ACUATICO, RESTAURANTE MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El proyecto consiste en LA CONTRUCCION CENTRO RECREATIVO PARQUE ACUATICO, RESTAURANTE MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1.299.500,00	42-0161-0002	06 MESES CALENDARIO	1200	MULTISERVICIOS PL	EDDIE ERL Y DANNIERY PORTILLO LIMA	05-2025	60%	Q. 779.970,00





MUNICIPALIDAD DE

NO.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTADA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
03.	355053	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El proyecto consiste en MEJORAMIENTO O CALLE CON PAVIMENTO SECTOR DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	SECTOR DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 5,399,800.00	42-0161-0003	06 MESES CALENDARIO	800	NYD CONSTRUCCIONES	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ	20-2025	80%	Q. 5,399,800.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

¡Siguiendo!

- 5980-0535
- MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
- BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

NO.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTADA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
04.	344803	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA DOBLE VIA. BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El proyecto consiste en MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA DOBLE VIA. BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 3,598,745.00	21-0101-0001	06 MESES CALENDARIO	1200	CONSTRUFEE	FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY	17-2025	100%	Q. 3,598,745.00






MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
activando!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

NO.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTADA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
05.	360696	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO. 2701 M2 DE LIMPIEZA TRAZO Y CHAPEO. 2701 M2 DE CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA. 2575 M2 DE BASE DE MATERIAL. GRANULAR. 820 DE BORDILLO. 2575 DE PAVIMENTACIÓN. 1 UNIDAD DE SEÑALIZACIÓN.	LOTIFICACION VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 2.000.000,00	42-0161-0003	06 MESES CALENDARIO	1200	CONSTRUFIRME	KATHERINE JOHANA CACAO ALAVVARADO	21-2025	20%	Q. 399,960.00







MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

☎ 5980-0535 📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
📍 BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

NO.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTADA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
06.	344843	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	El proyecto consiste en: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 2,499,475.00	21-0101-0001	06 MESES CALENDARIO	1,500	CONSTRUCTORA KLIPERSA	DEVIL SAMANTHA HERNANDEZ ARCHILA	01-2026	20%	Q. 499,895.00


Lic. Alexis Geovanny Marroquin Orellana
Director Municipal de Planificación
Municipalidad de Guastatoya



➤ LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2026, FONDOS PROVENIENTES CONSEJOS DE DESARROLLO.

ENTIDAD	Concejos de Desarrollo y Municipalidad de Guastatoya, El Progreso.
DIRECCIÓN	Barrio El Clavario, Guastatoya, El Progreso.
HORARIO DE ATENCIÓN	Lunes a viernes de 8:00 am a 16:30 pm.
TELÉFONO	79451594.
DIRECTOR	Alexis Geovanny Marroquín Orellana.
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN	Beverly Mishell Cruz Orellana.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	06 de Marzo del año 2026.
CORRESPONDE AL MES DE	FEBRERO del año 2026.





➤ LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTADAS O EN EJECUCION DEL AÑO 2025, FONDOS PROVENIENTES POR CONSEJOS DE DESARROLLO.

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EIECUCION	BENEFICIA RIOS	EMPRESA O ENTIDAD EIECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACION ES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1.	352326	MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO GUASTATOYA, EL PROGRESO (Liquidado)	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE URBANA MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO. Demolición de estructura de (adoquinado y banquetas) retiro y acarreo; preeliminares, reacondicionamiento de subrasante, colocación más compactación de préstamo granular de espesor de 0.10 mts al 95% del sector modificado, fundición de pavimento de 0.15 mts de espesor resistencia a la compensión de 210 kg 10/cm2, unidades de r	BARRIO EL GOLFO, GUATATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,999,896.00	31-0101-0004	06 MESES CALENDARIO	750	CONSTRUCTORA MYA	CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA	19-2025	100%	Q. 500,000.00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE ELECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD ELECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2.	334365	MEJORAMIENTO CALE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA GUASTATOYA, EL PROGRESO (liquidado)	El proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ANDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO 1531 m2 de trabajos preliminares 1531 m2 de corte de nivelación del terreno a nivel de rasante existente, 1531 m2 de colocación +compactación de base granular de espesor de 0.10 mts, 1399 m2 de colocación de adoquín tráfico pesado 280 kg/cm2, 633 ml de llaves de confinamiento longitudinales. 450 de bordillo fundido de ingreso, 1 unidad de pintura para tráfico pesado línea central	SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,000,000.00	22-0101-001	04 MESES CALENDARIO	950	CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M.Y WALLRUD	TOMAS REYES PICON	09-2025	100%	Q. 650,520.00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
3.	353143	MEJORAMIENTO CALLE URBANA A UN COSTADO DEL PARQUE MINERVA, ABRRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO (Liquidado)	El Proyecto Consiste en el MEJORAMIENTO CALLE URBANA A UN COSTADO DEL PARQUE MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL, PROGRESO de adoquinado existente, corte y nivelación de cajuelas, base de material granular, bordillo, fundición de pavimento, señalización	BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 399,844.00	31 3101 0004	05 MESES CALENDARIO	800	CONSTRUCTORA MA	CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA	10-2025	100%	Q. 399,844.00



No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EIECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EIECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
4.	352317	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL TIERRA BLANCA HACIA CA -9 ALDEA EL SUBINAL GUASTATOYA, EL PROGRESO (Mismo Avance)	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCA HACIA CA-9 ALDEA SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO, 833 m de trazo y replanteo fotográfico, 5057m2 de reacondicionamiento de sub-Rasante, 5057 m2 de capa base E=0.10M, 4224 M2 de pavimento de concreto e=0.15 m, 2241 ml de corte y sello de juntas, 1666ml de cuneta tipo I, 2083 ml de señalización horizontal, 3 unidades construcción de transversales de agua pluvial de 30PLG, 57 M3, muro de contención	ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 3.999,741.00	31-0101-004	06 MESES CALENDARIO	540	FERRCONS BALCARCEL	NEFTALI BALCARCEL ORELLANA	15-2025	67%	Q.2,350,000.00






MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Siguiendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EIECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EIECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
5.	336936	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El proyecto consiste en REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARI A COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q.4,452,600.00	21-0101-0001	10 MESES CALENDARIO	600	NVD CONSTRUCCIONES	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ	16-2025	50%	Q. 890,520.00

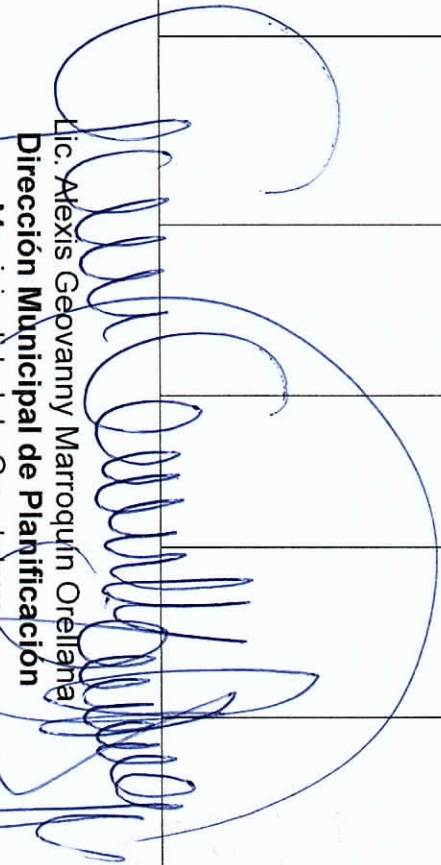
Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Dirección Municipal de Planificación
Municipalidad de Guastatoya

